

プロジェクトマネジメン ト・プロフェッショナル (PMP)®試験準備作業 バージョン4.0

ISBN: 9781628259193

出版者:

Project Management Institute, Inc.(プロジェクトマネジメント協会)

18 Campus Blvd., Ste.150

Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA

電話: +1 610 356 4600

PMI.org

オンラインサポート: www.pmi.org/about/contact

©2026 Project Management Institute, Inc.All rights reserved.

弊社の著作権コンテンツは、その他大半の国で認知されている、米国知的財産法で保護されています。コンテンツを再掲載または複製する場合には、書面による当協会の許可を取得する必要がある。詳細については、<https://www.pmi.org/permissions>を参照すること。

本資料は、個人利用に限り、ライセンスに基づき提供されるものである。これ以外の目的での使用、配布、複製、改変、ならびに再販売は一切認められない。

AI学習への利用禁止: 本出版物を使用して、テキスト生成を目的とする生成AI(人工知能)技術の「学習」を行うことは明示的に禁止されている。この禁止事項は、本出版物の著作権に基づくプロジェクトマネジメント協会の排他的権利を制限するものではない。PMIは、生成AIの学習および機械学習言語モデルの開発を目的とした本著作物の利用について、ライセンスを許諾するすべての権利を留保する。

Project Management Institute、PMI、PMIロゴ、およびPMBOKは、米国またはその他の国におけるProject Management Institute, Inc.の商標または登録商標である。PMIの商標に関する包括的な一覧については、trademarks@pmi.orgまでお問い合わせください。

米国国内で印刷。本書のいかなる部分についても、電子的、手動、複写、記録またはデータストレージ、データ検索システムなどその形式や手段を問わず、出版者からの書面による事前の許可なく複製または転送することはできません。

本出版物は、用紙使用量の最小化および環境負荷の低減を目的とした持続可能性に配慮した設計および制作手法を採用している。

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ©Translations

目次

この受講者作業ブックの使用	v
レッスン 1 基礎	7
レッスン 2 基礎を築く	21
レッスン 3 プロジェクト・スコープ、価値、成功基準の定義	59
レッスン 4 プロジェクトマネジメント計画書の策定ー統合、資源、財務	93
レッスン 5 調達、品質、スケジューリング	138
レッスン 6 知識の伝達と転嫁	189
レッスン 7 チームの指揮および支援	208
レッスン 8 リスク、変更、および課題の管理」を修了しました	243
レッスン 9 進捗の監視と整合性の維持	280
レッスン 10 プロジェクトの円滑な終結	304
レッスン 11 組織的かつ継続的な改善の促進	316
レッスン 12 次のステップ	327

この受講者作業ブックの使用

インストラクターはトレーニングで大量の資料を使用します。この受講者用作業は、メモを取るためのスペースを提供し、インストラクターが提示する詳細なコンテンツに焦点を当てて学習できるよう設計されています。

ご注意ください: プロジェクトと同様に、インストラクターのアプローチはプロジェクトごとに異なるため、この受講者作業はコース設計に従いますが、インストラクターの順序や強調は異なる場合があります。

トピックやコンテキストへの理解を深めるために、PMI.orgやその他の関連ソースからの資源を含めました。

準備頑張っね。

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・
プロフェッショナル(PMP)®試験準備コース


基礎

レッスン1



Learning

レッスン1







レッスン1

ようこそ

PMI®認定 PMP®試験準備コースにご参加いただきありがとうございます。

認定プロジェクトマネジメント・アソシエイト(CAPM)®資格を当機関で取得された方は、再度ご利用いただきありがとうございます。

別のプロジェクトマネジメントのバックグラウンド、資格、または職務経験をお持ちの方は、PMIの学習コミュニティへのご参加を歓迎いたします。

私たちは、50年以上にわたるピア・トゥ・ピア学習と会員制度の歴史を誇りに思うとともに、プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル(PMP)®資格認定試験の準備に取り組む皆様のご健闘をお祈りします。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

インストラクター



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

学習トピック



このトレーニングの学習トピックは、PMP®資格認定試験のコンテンツ概要から直接抜粋されています。試験内容の概要は、PMP®試験の基礎となるものです。


関連する試験内容の概要は、各トピックの最初に参考として記載されています。


試験内容の概要は、PMP®資格認定を保有し、多様な業界で働く、世界中から選ばれたPMI会員によって作成されました。これには、経験や幅広いビジネス概念など、仕事をする上で受験者が知っておくべきことが含まれています。




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン1







レッスン1

このコースについて

ライフサイクルのアイコン: 特定のライフサイクルの典型的な概念または固有の概念を強調し、区別するために、それぞれに対応するアイコンを使用します。



予測型



適応型



ハイブリッド

その他のアイコン



重要



インタラクティブ



専門家の判断を活用する



ツールと技法



質問



ディスカッション



注記



定義

プロジェクトマネジメント用語: コース用語集はPDFファイルとして含まれています。コース中、インストラクターが用語集の定義をスライドで示すことがあります。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

10

プロジェクト・ケース・スタディ: 受講生用リソース



SHAWPE
—INDUSTRIES—

当社の**プロジェクト・マネジャー**、Ang Fenをご紹介します。
本人、プロジェクト・チーム、ステークホルダーとやり取りしてください。

これは、ハイブリッド・プロジェクトの没入型架空シナリオで、
プロジェクトマネジメントの概念の復習と強化、模擬試験問題が含まれています。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

11

PMP®

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・プロフェッショナル
(PMP)®試験準備コース

基礎

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.



レッスン1

プロジェクト マネジメント の基礎概念



プロジェクトとは何か？



プロジェクト:

価値を創出するために、独自のコンテキストにおいて実施される一時的な取り組みです。



プロジェクトの成功とは:

プロジェクトの受益者、その他のステークホルダー、プロジェクト参加者が合意した見解において、プロジェクトが作業工数と経費に見合う価値を提供したと認識されたことを示します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

ライフサイクルと開発アプローチ

	説明	主要な役割	価値提供の提案
	計画ベースのアプローチ: - 明確な順序または段階的な方法で完了するアクティビティ - 新しいフェーズは、先行フェーズが完了したときにのみ開始	- プロジェクト・スポンサーがプロジェクトを承認 - プロジェクト・マネージャーが率いるチーム	- 完了時に顧客に移管される成果物 - 短期的および長期的の両方で実現される価値
	変更ベースのアプローチ: - アジャイル型、漸進型、または反復型の開発 - タイムボックス化されたケイデンス(イテレーション/スプリント)または継続的フロー	- プロダクト・オーナーが価値提案をコントロール - プロジェクト・チームが作業を遂行 - プロセスの役割には、チーム・リード、スクラム・マスター、アジャイル・コーチ、ファシリテーターが含まれる	- ライフサイクル中の顧客への反復的または増分デリバリー - 定期的な顧客フィードバック・サイクルにより、最終プロダクトに向けた価値の継続的な開発が可能
	上記の任意の組み合わせ		



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン1

プロジェクトマネジメント・オフィス



組織エンティティであり、通常は部門またはチームとして設立され、主にポートフォリオ、プログラム、および/またはプロジェクトの管理に関連する活動を一元化する任務を負っています。これらの活動の性質は、各組織の固有のニーズに応じて異なるものです。



リソース
マネジメント



アプローチ
開発



トレーニングと
監督



監視
コンプライアンス



文書
マネジメント



コミュニケーション
の調整



「大規模で確立された多くのプロジェクト指向の組織には、プロジェクトマネジメント・オフィスがありますが、このオフィスはプロジェクトマネジメントの実践においては必須要件ではありません。」



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

プロジェクトマネジメント・オフィスのタイプ



支援型

- 優先すべき実務慣行、方法論、標準、テンプレートを開発
- プロジェクト・マネジャーのコーチング、メンタリング、トレーニング、指導



コントロール

- プロジェクト監査を通じて、プロジェクトマネジメントの標準、方針、手続き、テンプレートの遵守状況を監視



指示型

- 共有リソースを管理
- 複数のプロジェクトにわたるコミュニケーションを調整



アジャイル・センター・オブ・エクセレンス


- チームのコーチング
- 組織全体にアジャイルのマインドセット、スキル、能力を構築
- スポンサーとプロダクト・オーナーをメンタリング



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

組織的プロジェクトマネジメント

組織的プロジェクトマネジメント—ポートフォリオ、プログラム、プロジェクト、定常業務マネジメントを調整し、組織が戦略を実現できるようにする戦略実行のフレームワークです。

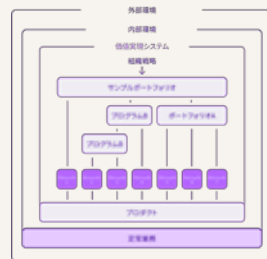

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン1

ポートフォリオ、プログラム、プロジェクト

ポートフォリオ マネジメント	戦略目標を達成するためにグループでマネジメントされるサブポートフォリオ、プログラム、プロジェクト、および定常業務の集合	ビジネス戦略と整合
プログラム マネジメント	個別にマネジメントすることでは得られないベネフィットを得るために、協調的な方法でマネジメントされる、関連するプロジェクト、サブプログラム、およびプログラム・アクティビティのグループ	コンポーネントと相互依存をコントロールし、ベネフィットを実現
プロジェクト マネジメント	より広範なプログラム、ポートフォリオ、またはその両方の一部	組織のゴールと目標の達成を実現



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

19

組織構造

- 機能型
- マトリックス型
- プロジェクト指向型
- 複合型

組織構造とガバナンスにより、次の内容が決定付けられます。

- 組織のグループと個人がどのように相互に関係するか
- プロジェクト・マネジャーがどの程度の権限を持つか
- どのようなリソースが利用可能になるか
- プロジェクトがどのように実施されるか



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

20

組織構造における相対的権限

	機能型	マトリックス型	プロジェクト指向型
チーム・メンバーの忠誠心	機能部門	忠誠心のコンフリクト	プロジェクト
チーム・メンバーの報告	機能部門マネジャー	機能部門マネジャーとプロジェクト・マネジャーの両方	プロジェクト・マネジャー
プロジェクト・マネジャーの役割	特定されることはほとんどない	コーディネーターからフル・プロジェクト・マネジャーまで幅広く対応	常勤として責任を負う
チーム・メンバーの役割	プロジェクトに非常勤で従事	プロジェクトに非常勤で従事	プロジェクトに常勤で従事（望ましい）
プロジェクト・マネジャーによるチーム・メンバーのコントロール	存在しない（機能部門マネジャーがコントロール）	中—機能部門マネジャー/スポンサーと共有	高い




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

21

レッスン1

プロジェクト マネジメントの 原理・原則




すべてのプロジェクトマネジメント実務者のための指針

1. ホリスティックな視点を取り入れる
2. 価値に焦点を当てる
3. プロセスと成果物に品質を定着させる
4. 説明責任を果たせるリーダーとなる
5. すべてのプロジェクト領域に持続可能性を統合する
6. 自律的な文化を構築する

原理・原則からパフォーマンス領域へ

ホリスティックな視点を取り入れることと、7つのパフォーマンス領域すべてが向上します。

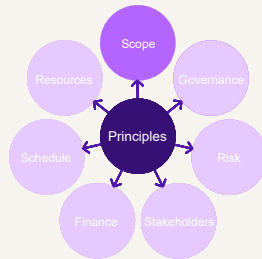

レッスン1

アジャイルの マインドセット



PMI Learning

アジャイル

由来:

- アジャイル宣言の4つの価値
- 12の原則



「使用されているアジャイル・アプローチは50以上あります。」



PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

26

ソフトウェア開発のためのアジャイル宣言

「私たちは、ソフトウェア開発の実践あるいは実践を手助けをする活動を通じて、よりよい開発方法を見つけたそうとしている。

この活動を通して、私たちは以下の価値に至った。」

個人と対話	>	プロセスとツール
動くソフトウェア	>	包括的なドキュメント
顧客との協業	>	契約交渉
変更への対応	>	計画に従う

すなわち、左記のことがらに価値があることを認めながらも、私たちは右記のことがらにより価値をおく。

— 2001年

PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

27

レッスン1

アジャイル宣言の原則1から6

1. 私たちの最優先事項は、価値あるソフトウェアを早期に継続的引渡しすることで顧客を満足させることです。
2. 開発の後期であっても、要求の変更を歓迎します。アジャイルプロセスは、顧客の競争優位性のために変化を活用します。
3. 2、3週間から2、3ヶ月の間で、より短い時間尺度を優先して、動作するソフトウェアを頻繁にデリバリーします。
4. ビジネスパーソンと開発者は、プロジェクトを通じて日々協力し合わなければいけません。
5. やる気のある個人を中心にプロジェクトを構築します。彼らに必要な環境とサポートを与え、仕事をやり遂げることを信頼します。
6. 開発チームに、そして開発チーム内に情報を伝える最も効率的で効果的な方法は、対面での会話です。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

28

アジャイル宣言の原則7～12

7. 動くソフトウェアは、進捗の主要な尺度です。
8. アジャイル・プロセスは持続可能な開発を促進します。スポンサー、開発者、ユーザーは、いつまでも一定のペースを維持できるはずで
9. 卓越した技術と優れたデザインへの継続的な配慮がアジャイルを高めます。
10. シンプルシティ(単純化)とは、仕事を最大限に減らす技術です。
11. 最高のアーキテクチャー、要求事項、デザインは、自己組織化チームから生まれます。
12. チームは定期的に、より効果的になる方法を振り返り、それに応じて行動を調整します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

29

アジャイル:適応型アプローチの裏側

アジャイルを実践すること、アジャイルであること

アジャイルとは:

- ・イテレーションは短くなる可能性があります。
- ・ステークホルダーのフィードバックに基づいてプロダクトが進化する可能性が高くなります。

ソフトウェア開発に今でも使用されている一方で、アジャイルの原則は、アジャイルのマインドセットを通じて、他の種類の開発プロジェクトにも適用されています。

- ・柔軟で変更に適応しやすい考え方や行動様式を導入します。
- ・これらの実務慣行の目的を理解します。
- ・状況に応じて適切な実務慣行を選択し、実施します。
- ・アジャイルの価値観、マインドセット、行動を内在化します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

30

レッスン1

テーラリング



プロジェクトを状況に合わせてテーラリングする

プロジェクトはそれぞれ固有のもので、独自のプロジェクト・コンテキストに方法を適応させて、望ましい成果につながる最も適切な作業方法を見極めます。

① 「プロジェクト全体を通して反復的かつ継続的にテーラリングします。」



テーラリング

テーラリングとは、プロジェクトマネジメントのアプローチ、ガバナンス、プロセスが特定の環境および目のタスクにより適合するように、それらを慎重に適応させることです。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

ハイブリッド・アプローチ、プロセス、実務慣行のテーラリング

プロダクト知識、デリバリー・ケイデンス、利用可能なオプションに関する認識を適用して、最も適切な開発アプローチを選択します。

選択したライフサイクルと開発アプローチに合わせてプロセスをテーラリングします。これには、どの部分または要素を追加、修正、削除、結合、または調整するかを判断することが含まれます。

実務慣行とアプローチを環境と文化に合わせてテーラリングします。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン1

[illegible]



Learning

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・
プロフェッショナル(PMP)®試験準備コース

基礎を築く


レッスン2



Learning

レッスン2







レッスン2

主要ステークホルダー間で 共通のビジョンを確立する

ECO 1.1.1



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

ビジョンを全員に理解してもらうために: ガイドライン



- 対人スキルおよびリーダーシップの「パワースキル」を活用し、オープンなコミュニケーション・チャネルを維持する
- アジャイル・アプローチを柔軟かつ創造的に活用する
- プロダクト・ボックス演習
- エクストリーム・プログラミング (XP) のメタファー

プロダクト・ボックス演習



望ましいソリューションや成果を説明するための手法。マーケターが製品の箱に機能や価値（ベネフィット）を表現するのと同じように、ステークホルダーがソリューションの特徴や利点を言語化する。

XPメタファー



プログラムがどのように機能するかについての共通ビジョンを表現する、エクストリーム・プログラミング (XP) で一般的に用いられる手法。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

プロジェクト合意事項について合意が得られたら...



プロジェクト憲章の作成方法は一つではありませんが、いずれのプロジェクトにもプロジェクト憲章の策定が不可欠です！



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン2

プロジェクト憲章*

役割と重要性:

- プロジェクトを正式に承認する
- プロジェクト・マネジャーがプロジェクト作業に資源を割り当てることを可能にする
- プロジェクトの根拠およびビジネス・ニーズを明確にする
- 戦略目標との整合性を確認する
- 明確なプロジェクト・ビジョンに全員の意議を集中させる

「通常は、プロジェクト・スポンサーまたはプロジェクト・マネジャーが、経営幹部やステークホルダーの承認を得て作成します。作業範囲記述書(SOW)がプロジェクト憲章の役割を果たすこともあります」。



プロジェクト憲章

プロジェクト・イニシエーターまたはスポンサーによって発行され、プロジェクトの存在を正式に承認するとともに、プロジェクト・マネジャーに対して、プロジェクト活動に組織の資源を適用する権限を付与する文書



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

7

プロジェクト憲章: 目次

含まれる主な内容:

- 氏名: プロジェクト・スポンサー、プロジェクト・マネジャー、主要ステークホルダー
- プロジェクトの説明(初期要件および測定可能な目標を含む)
- ビジネス・ニーズ(財務目標やマイルストーンを含む)
- 集約スケジュールとマイルストーン
- 前提条件、境界条件、制約条件(全体リスク、承認要求事項、承認された予算を含む)
- ビジネス・ケースからの情報(成功基準と終了基準を含む)



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

8

プロジェクト憲章: 例

PROJECT CHARTER	
Project Name	Project Charter
Sponsor (Project Owner)	Project Manager
Project Manager	Project Manager
Project Start Date	Project End Date
Project Budget	Project Risk
Project Description	Project Objectives
Project Scope	Project Risks
Project Stakeholders	Project Deliverables
Project Milestones	Project Resources
Project Risks	Project Benefits
Project Assumptions	Project Constraints
Project Dependencies	Project Communications
Project Approval	Project Sign-off



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

9

レッスン2

共有ビジョンの推進

ECO 1.1.2



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです

共通理解を構築する: ガイドライン

- ・プロジェクト合意事項(ビジョン記述書およびプロジェクト憲章)を、ステークホルダーおよびチームと共有する。
- ・合意形成とコミットメントを得るために、合意または交渉を行う。
- ・プロジェクト合意事項:ステークホルダー向け
- ・役割と責任、優先順位および担当割り当て:チーム向け
- ・プロジェクト全体を通じて、合意事項を遵守する。



オープンで信頼性の高いコミュニケーション手法を用い、リーダーシップのパワースキルを発揮します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

プロジェクト・ビジョン記述書

- ・プロジェクト・スポンサーまたは経営幹部によって作成される
- ・達成すべき目標の明確なビジョンを示し、組織の戦略目標と整合している
- ・整合性を維持するため、プロジェクト全体を通じて参照する



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン2

プロジェクトを全体的に理解する: 交渉の目的

まず確認すること...

- プロジェクト合意事項に関する交渉の範囲(境界)
- 議論や問題解決の対象となる事項(該当する場合)
- プロジェクトが目指す望ましい目標

そのうえで...

- クリティカル・シンキングとビジネス感覚を活用する
- 組織の状況(組織内の全体像)や事業目標の中で、プロジェクトがどのような位置づけにあるかを把握する



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

13

プロジェクトの全体像を把握する方法

ステークホルダーに対して、ビジョンや提供された意見・情報について詳しい説明や明確化を求めます。特に、スポンサーにはプロジェクト・ビジョン記述書の明確化を依頼します。既存の合意事項には、プロジェクトに関する初期の意図が含まれていたり、プロジェクトの内容が記載されている場合があります。

- 外部関係者との契約書
- 覚書き
- サービスレベル・アグリーメント
- 合意書または意向表明書
- 口頭での合意
- 主要ステークホルダー間のコミュニケーション(特に電子メール)
- 作業範囲記述書(SOW)



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

14

ビジネス・ケースとビジネス・ニーズを参照する

ビジネス・ケース:

- 事業として実現可能かどうかを評価する調査
- プロジェクト作業によって得られるベネフィットを明確にする
- 以降のプロジェクト活動を正式に承認するための根拠を提供する

ビジネス・ニーズ文書:

- ハイレベルな成果物を特定する
- 正式なビジネス・ケース作成の前提条件となる
- 要求事項を記述する(何を作成し、または実施する必要があるか)



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

15

レッスン2

プロジェクト・ビジョンを 最新の状態に保つ

ECO 1.1.3



© 2025 Project Management Institute (PMI). 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

プロジェクト・ビジョンとは何か？

プロジェクト・ビジョンとは：

- 強力なモチベーション・ツール
- プロジェクトが目指す将来像に対して、情熱や意義を生み出す手段



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

優れたプロジェクト・ビジョンの特徴

優れたプロジェクト・ビジョンとは：

- プロジェクトの概要を簡潔にまとめている
- 達成しうる最良の成果を示している
- 共通で一貫性のあるイメージを生み出す
- 成果に対する情熱を喚起する



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン2

プロジェクト・ビジョンを軸とした協働

- プロジェクトの目的は何か？
- プロジェクトが成功したと言える基準は何か？
- プロジェクトの成果が提供されたとき、将来はどのように良くなるのか？
- プロジェクト・チームは、プロジェクト・ビジョンから逸脱していることをどのように把握できるか？



PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

19

プロジェクト・ビジョンに基づいて成果を実現する

成果物そのものではなく、目指す成果に目を向けることで、プロジェクト・チームは、単に成果物を作るだけでなく、プロジェクトのビジョンや目的の実現に近づくことができます。

成果物は成果の実現を支える要素ではありますが、それだけでビジョンや目的が完全に達成されるとは限りません。



PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

20

状況を分解し、プロジェクト・ビジョンに関する誤解の根本原因を特定する

ECO 1.1.4


PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI). 無断転載を禁ず。
本資料はPMIのコースの一部として提供されるものです。

21

レッスン2

誤解の根本原因を特定する

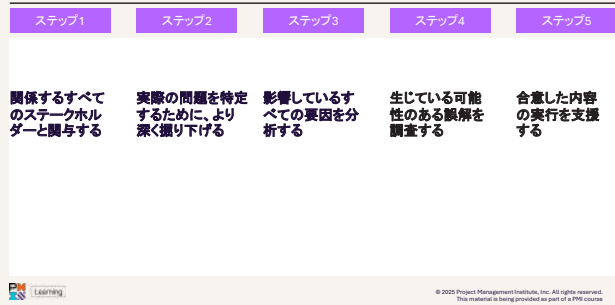


5つのなぜ:例

実際の問題を特定するために、より深く掘り下げる


- | | |
|---------------------------|--|
| なぜPMP試験に合格できなかったのか？ | 多くの問題を間違えていた。 |
| なぜ多くの質問を間違えたのか？ | 何を聞いていたのか、本当に知る必要がある。 |
| 相手が何を聞いているのか、なぜわからなかったのか？ | 長年プロジェクトに携わってきたので、勉強する必要はないと思っていた。 |
| どの試験分野を勉強しなかったのか？ | 予測型アプローチについてはよく知っていたが、適応型アプローチについては十分に理解していなかった。 |
| なぜ適応型アプローチについて勉強しなかったのか？ | 試験の幅を過小評価していた。 |
- © 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. This material is being provided as part of a PMI course.


特性要因図の例



レッスン2





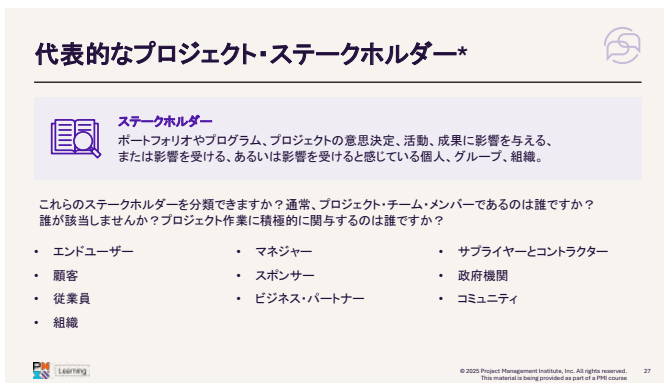

レッスン2

ステークホルダーの特定

誰がステークホルダーか？

- ・ ビジネスケースやベネフィット・マネジメント計画書で関係者の名前を確認する
- ・ その後、課題/阻害要因ログ、変更ログ、要求事項文書を確認し、その他の必要な関係者や記載されている人物を特定する

プロジェクトとの関係性は何か？

- ・ 関心
- ・ 関与度
- ・ 相互依存関係
- ・ 影響
- ・ プロジェクト成功への潜在的な影響度

📌 「プロジェクトの後半で想定外の事態が起こらないよう、早い段階でステークホルダーを特定し、関与させましょう」！



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

28

ステークホルダーおよびコミュニケーション・マネジメント:概要

- ・ ステークホルダー登録簿
- ・ ステークホルダー・エンゲージメント計画書
- ・ コミュニケーション・マネジメント計画書
- ・ ステークホルダー・エンゲージメント評価マトリックス
- ・ 評価用グリッド/マトリックス/モデル



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

29

ステークホルダーの分析

ECO 1.4.2



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

30

レッスン2

ステークホルダーの評価



ステークホルダー分析

プロジェクト全体を通じて、誰の利害を考慮すべきかを判断するために、定量的および定性的な情報を体系的に収集し分析する手法。

データ収集

- アンケートと調査
- ブレインストーミング

データ分析

- ステークホルダー分析
- 文書分析

データ表現

- 二次元(2D)グリッド
 - 権限/関心度
 - 権限/影響力
 - 影響度/影響力
- 三次元(3D)グリッド—ステークホルダー「キューブ」
- セイリエンス・モデル
- 影響の方向性



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

31

ステークホルダー登録簿の作成



ステークホルダー登録簿

プロジェクトのステークホルダーの評価や分類など、ステークホルダーに関する情報を含むプロジェクト文書

- 重要なステークホルダー情報を収集し、記録します。
- 組織のプロセス資産(OPA)を考慮します。
- プロジェクトを通じて更新し、ステークホルダーとの関係性の変化を記録します。



ステークホルダー・エンゲージメント計画書を実行するために必要な情報を含みます。



- 過去の類似プロジェクトのステークホルダー登録簿を参考にしてください。
- これは公開文書であることを念頭に置き、記載する情報が適切であることを確認してください。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

32

ステークホルダー登録簿



項目	組織名	役職名	ステークホルダー	プロジェクトへの価値	ステークホルダーの関心	関係性	ステークホルダーの関心
1	Project Lane	CEO	高層	スポンサー	主要な	スポンサーとして関与し、定期的なミーティング	高層
2	Customer Municipality		中層	顧客(パートナー(顧客関係)、買手関係、共同開発関係)	高層/中層/低層/パートナーシップの構築	契約関係	高層
3	Kara Bank	プロジェクト/CEO/Owner/Accountant	中層	パートナー、銀行家、専門家(法律顧問)	中層/高層/パートナーシップの構築	金融に資金提供/共同プロジェクト/銀行の融資	中層
4	Julia Agency	取締役/営業部長	中層	Julia Insuranceの保険契約/パートナーシップの構築	プロジェクト/中層/高層/保険契約/共同開発、顧客との関係	Customer(顧客)関係/顧客への営業/高層/中層	高層
5	Maria Group	事業開発部長	中層	プロジェクト/パートナー	高層/中層/高層/共同開発、顧客との関係	顧客/高層、パートナーシップの構築	中層
6	Heidi Product	事業開発部長	中層	パートナー/パートナー	高層/中層/高層/共同開発	高層/中層/高層/共同開発	中層
7	Heidi Product	取締役/営業部長	中層	事業開発部長	高層/中層/高層/共同開発	高層/中層/高層/共同開発	中層
8	Heidi Product	取締役/営業部長	中層	事業開発部長	高層/中層/高層/共同開発	高層/中層/高層/共同開発	中層
9	Julia	中層	高層	高層/中層	高層/中層/高層/共同開発	高層/中層/高層/共同開発	中層
10	Julia	中層	高層	高層/中層	高層/中層/高層/共同開発	高層/中層/高層/共同開発	中層
11	Customer Municipality	中層	高層	高層/中層	高層/中層/高層/共同開発	高層/中層/高層/共同開発	中層
12	Customer Municipality	中層	高層	高層/中層	高層/中層/高層/共同開発	高層/中層/高層/共同開発	中層



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

33

レッスン2

ステークホルダーを理解する

肩書きだけで判断しない

権力	権限のレベル
関心	プロジェクトの成果についての懸念のレベル
影響 (姿勢または影響)	- プロジェクトの成果に影響を与えたり、計画や実行に変更をもたらしたりする能力 - プロジェクトへの潜在的な貢献または混乱の大きさ 「無関心」、「抵抗的」、「中立」、「支援的」、「主導的」など、状況を表す用語を使用

「これは公開文書であるため、特に抵抗的なステークホルダーについては、実名を記載しない方が賢明な場合があります。氏名の代わりに番号を使用してください」。




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

34

ステークホルダーの認識

顧客中心のプロジェクトマネジメントでは、ステークホルダーの認識を包括的に把握する必要がある


ステークホルダーの認識は、ネガティブであれポジティブであれ、プロジェクトに悪影響を及ぼす可能性がある



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

35

ステークホルダーのフィードバックと認識の把握



- 対人関係のスキル
- 積極的傾聴
- 感情的知性
- 効果的なコミュニケーション方法



主要ステークホルダー

- プロジェクトに対する要求事項、ビジョン、コミュニケーションの好みを理解するためのインタビュー



すべてのステークホルダー

- 適切で定期的なプロジェクト・コミュニケーション



大規模で公開性の高いグループ

- アンケート/調査
- ファシリテートされた対話・セッション(オンラインまたは対面)
- デジタルメディア(メールキャンペーン、ウェブサイト、グループチャット)
- ポスターや広告



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

36

レッスン2

ステークホルダーのニーズ に応じたコミュニケーション の分析とテーラリング

ECO 1.4.3



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

27

コミュニケーション要求事項分析




- ステークホルダーのコミュニケーション・ニーズを明確に言語化できる
- コミュニケーションの内容、頻度、方法、使用するテクノロジーについて、効果的な選択が可能になる
- 分析結果は、コミュニケーション・マネジメント計画書に記録される



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

28

コミュニケーション: 手法とテクノロジー



他にどのようなコミュニケーション
手法や技法をプロジェクトで使用し
ていますか？
組織として使用を認めていないコ
ミュニケーション手法はありますか？
それはなぜですか？

会議/口頭

- 対面
- オンライン (ビデオ会議)
- 電話

デジタル/電子メディア

- ウェブサイトとソーシャルメディア
- インスタント/テキスト・メッセージ (電話またはプラ
ットフォーム経由)
- 電子メール

物理的

- ボディラングージとジェスチャー
- ホワイトボード



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

29

レッスン2

コミュニケーション・アプローチ

インタラクティブ

- 会話（電話、オンライン、対面）
- メッセージング
- ワークショップ/コラボレーション
- ホワイトボードの活用



適応型チームでは、高い協働性を実現するため、可能な限りメンバーを同一拠点に配置します。

プッシュ型 プル型

プッシュ型—ステークホルダーに送信

- 電子メール・メッセージ
- メモ
- 状況報告

プル型—ステークホルダーが必要に応じて参照

- イン트라ネット・サイト
- ナレッジレポジトリ
- ドキュメントライブラリ



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

コミュニケーションにおける課題と考慮事項


- 情報ニーズの緊急性
- テクノロジーの利用可否および信頼性
- 使いやすさ
- プロジェクト環境（言語、形式など）
- 情報の機密性と秘匿性
- コミュニケーションに関する組織のプロセス資産（例：ソーシャルメディア運用ルール）
- データ保護法/規制
- アクセシビリティ要件



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

コミュニケーション・モデル

異文化コミュニケーションのためのコミュニケーション・モデル



情報伝達の例を思い浮かべてください。使用する手法によって、どのようなノイズ（阻害要因）が影響する可能性がありますか？



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン2

ステークホルダーとのコミュニケーションの計画

プロジェクトのステークホルダー・エンゲージメント計画書とコミュニケーション・マネジメント計画書は、相互に関連した作成物です。



ステークホルダー・エンゲージメント計画書

プログラムマネジメント計画書またはプロジェクトマネジメント計画書の構成要素のひとつです。プログラムまたはプロジェクトの意思決定と実行において、ステークホルダーの生産的な関与を促進するために必要な戦略と行動を特定します。

チームは、コミュニケーション・マネジメント計画書に記載されたコミュニケーションを通じて戦略を遂行します。



コミュニケーション・マネジメント計画書

ポートフォリオマネジメント計画書、プログラムマネジメント計画書、またはプロジェクトマネジメント計画書の構成要素のひとつです。情報をどのように、いつ、誰が管理し、発信するかを記述します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

ステークホルダー・エンゲージメント計画書の実行

ECO 1.4.4



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

ステークホルダー・エンゲージメント戦略



- ステークホルダーの関与を促進する。
- 効果的なマネジメント戦略の実行を支援する。
- 良好な関係を築き、継続的に維持する。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン2

ステークホルダー・エンゲージメントのマネジメント

- ステークホルダーとコミュニケーションを取り、協同することで、以下を実現します。
- ステークホルダーのニーズと期待に応える。
 - 発生した課題に適切に対処する。
 - 適切なレベルでのステークホルダーの関与を促進する。

主なベネフィット

- ステークホルダーからの支持を高める。
- プロジェクトに対する抵抗を最小限に抑える。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

46

ステークホルダー・エンゲージメントのマネジメント



ステークホルダー・エンゲージメントを管理するには：

- 重要な段階でステークホルダーに関与させ、継続的なコミットメントを確保する。
- 明確なコミュニケーションと交渉を通じて、期待値を管理する。
- リスクに対処し、ステークホルダーの懸念を予測する。
- 特定された課題を明確にし、解決する。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

47

ステークホルダーのニーズ、期待、プロジェクト目標間の整合性を最適化する

ECO 1.4.5



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

48

レッスン2

ステークホルダーのニーズの整合



- ・ 議論の透明性を保ちます。
- ・ ステークホルダーに必要な情報を共有し、期待値を管理するとともに、全体像を示します。
- ・ ステークホルダーのニーズや制約条件への理解を深めるために、積極的に関与します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

49

ステークホルダー関与度評価マトリックス例



「ステークホルダーのエンゲージメント・レベルのラベルは、プロジェクトの状況、チーム、または組織に合わせて調整してください」。

「マトリックスに実名を使用せず、ステークホルダーは番号で参照してください」。

ステークホルダー	関心	協力的	中立的	支援的	主導的
ステークホルダー1	C			D	
ステークホルダー2			C	D	
ステークホルダー3				C・D	

C—現在の関与度レベル | D—望ましい関与度レベル



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

50

マネジメントとリーダーシップ

目標によるマネジメント

- ・ 明確な目標を使用して生産性を導き、意欲を促す。
- ・ チーム・メンバーと協力して目標を設定する。
- ・ 挑戦的でありながら達成可能な目標を設定する。
 - ・ プロジェクトやフェーズの開始時
 - ・ イテレーション計画セッションなど、プロジェクト・ライフサイクル全体を通じて

サーバント・リーダーシップ

3つのステップ:

1. ビジョンを定義する。
2. 人々をそのビジョンに整合させる。
3. ビジョンの実現に向けて人々を動機づける。




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

51

レッスン2

チームの取り組みと価値提供との整合を継続的に図る



- チームの結束を優先し、価値の提供に注力します。
チーム・メンバーや外部の関係者の参加や離脱、変更や混乱が生じたときは、チームが再調整できるようにサポートします。
- 新しいメンバーを、新しい知識やモチベーションの源として歓迎する。
 - プロジェクトのゴールと合意事項についての共通理解を促進する。
 - チーム・メンバーがどのように価値を付加できるかを、協働して見出す。
 - 混乱や対立を建設的に乗り越える。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

52

信頼の構築と ステークホルダーへの 働きかけによる プロジェクト目標の達成

ECO 1.4.6



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

53

信頼を築くための価値観



誠実さ



正直さ



公正さ



尊重

特にプレッシャーのかかる状況において、意思決定の指針とする。

誠実さと公正さを行動で示す。

共通の利益を最優先に考える。

ステークホルダーとの信頼関係を構築する。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.


54

レッスン2

ステークホルダーへの影響力の発揮

信頼は影響力の源

効果的なリーダーは、信頼を活用してステークホルダーに働きかけ、成功への支持を得ます。



PM Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

PMP®

ステークホルダー の期待の調整

ECOタスク1.5

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.

PM Learning

ステークホルダーの分類

ECO 1.5.1

PM Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。


レッスン2

ステークホルダー・マッピング

2つの次元を使ってステークホルダーをマッピングします。

- 権限/関心度グリッド
- 権限/影響力グリッド
- 影響度/影響力グリッド

または、3つの次元(立方体)を用いて、分析をさらに精緻化することもできます。



方法:

- 各ステークホルダーをグリッド上に配置する(実名は使用しない)。
- 象限のラベルは同じまま、軸のラベルを変更して使う。

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

影響の方向性



プロジェクト・ステークホルダーが形成するソーシャルネットワークを理解し、特にプロジェクトに対してどの方向に影響を及ぼすかを把握する必要があります。

上向き	親組織—シニアマネジメント(事業面・財務面の利害関係)
下向き	プロジェクト階層内—チームまたはスペシャリスト
外向き	プロジェクトの利害関係者—クライアント、エンドユーザー、外部関係者
横向き	資源をめぐる協調関係または競合関係—プロジェクト・マネジャーの同僚、他部門・他部署

PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

セイレエンス・モデル



PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン2

ステークホルダーの期待の特定

ECO 1.5.2



© 2025 Project Management Institute (PMI). 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。 61

ワークショップとインタビュー

ファシリテートされたワークショップは、特定の目的に向けてステークホルダーを集め、協働を促す手法です。この場合は期待値を整合させることが目標です。

インタビューは、1対1の形式でステークホルダーから情報を引き出すために用いられます。事前に質問を用意する構造化インタビューとして行うことも、自由な対話を許容する非構造化インタビューとして行うこともできます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course. 62

検証と整合



ステークホルダーと定期的に関与し、期待を検証するとともに、プロジェクト目標と整合させます。

誤解を解消し、プロジェクトの範囲内で実現できないかもしれない期待に対処します。

フィードバック・ループを導入します。
合意事項と決定事項を文書化します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course. 63

レッスン2

プロジェクト成功基準についての交渉と合意

ステークホルダーへのインタビューを実施します。
技術的成功基準に関する**専門家の判断**を収集します。
以下を確認します。

- 組織(プログラム、定常業務)における**重要業績評価指標 (KPI)**
- 教訓と過去のデータ
- 品質方針
- ユーザー受入れテストの要求事項



- 目標に対する報告と検証の基準
- 各テストにおける成果物および目標の受入基準の特定



- イテレーション成果物に加え、プロジェクトの Done の定義 (DoD) が指定される場合もある



重要業績評価指標 (KPI)

組織のリーダーシップによって定義され、組織の目的や目標に定められた達成目標または最終状態に向けた進捗を評価するために用いられる指標であり、戦略上の整合の実現を支援するもの。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

64

期待のすり合わせのための議論のファシリテーション

ECO 1.5.3



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIの登録商標として扱われる場合があります。

65

会議の前に



準備と計画

プロジェクトの状況、目標、ステークホルダーの期待に関する関連データと情報を収集します。



明確な目標を設定する

会議の目標を明確に定義し、参加者全員と事前に共有します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

66

レッスン2

会議中



ステークホルダー を関与させる

すべてのステークホルダーに積極的な参加を促します。



効果的にファシリテートする

効果的なファシリテーション手法を用いて、会議の流れを適切に管理します。



明確化とコミュニケーション

プロジェクトの目標について、全員が共通の理解を持てるように努めます。



合意形成を図る

プロジェクトの状況、目標、ステークホルダーの期待に関する関連データと情報を収集します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

67

会議後



文書化とフォローアップ

会議での主な成果、合意事項、アクション・アイテムを文書化します。



安心して意見を出せる雰囲気をつくる

ステークホルダーが自分の考えや懸念を気兼ねなく共有できるような、前向きでオープンな環境を育みます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

68

メンタリングの機会を整理し、 行動につなげる

ECO 1.5.4



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI). 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

69

レッスン2

メンタリング・プログラムの設定



目的と目標を定義する
メンタリング・プログラムの目標を明確にします。



ニーズを評価する
組織内のスキルや知識のギャップを特定します。



参加者を募集・選定する
メンターおよびメンティーの候補者を特定し、募集します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

70

メンタリング・プログラムを成功に導く準備



**メンターとメン
ティーのマッチング**
目標、関心、経験レベルに
基づいて、メンターとメン
ティーをマッチングします。



**参加者への
トレーニングの提供**
メンターとメンティーに対して、
メンタリング関係を最大限に
活用する方法についてト
レーニングを実施します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

71

メンタリング・プログラムの運営



**プログラムを
実施する**
明確なタイムライン、
構造、計画されたアク
ティビティを備えたプロ
グラムを開始します。



**双方向の学びを
促進する**
メンターとメンティーの
両方が互いの経験か
ら学べる環境を促進し
ます。



**継続的なサポー
トを提供する**
参加者と定期的に状
況を確認し、支援を行
うとともに、発生した課
題に対処します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

72

レッスン2

プログラムの評価と監視



参加者からのフィードバックを通じて、プログラムの有効性を継続的に評価します。

メンタリング・プログラムの価値を示すために、成果や成功事例を記録します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. 73
This material is being provided as part of a PMI course

ガバナンスの 定義と確立

ECOタスク3.1



組織のプロセス資産を活用した、
組織の構造、ルール、手続き、
報告、倫理、方針の定義

ECO 3.1.1



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本書はPMIコースの一環として提供されるものです

レッスン2

プロジェクトマネジメント・オフィス



組織エンティティであり、通常は部門またはチームとして設立され、主にポートフォリオ、プログラム、および/またはプロジェクトの管理に関連する活動を一元化する任務を負っています。これらの活動の性質は、各組織の固有のニーズに応じて異なるものです。



リソース
マネジメント



アプローチ
開発



トレーニングと
監督



監視
コンプライアンス



文書化
マネジメント



コミュニケーション
の調整



「大規模で確立された多くのプロジェクト指向の組織には、プロジェクトマネジメント・オフィスがありますが、このオフィスはプロジェクトマネジメントの実践においては必須要件ではありません」。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

プロジェクトマネジメント・オフィスのタイプ



支援型

- 優先すべき業務慣行、方法論、標準、テンプレートを開発
- プロジェクト・マネジャーのコーチング、メンタリング、トレーニング、指導



コントロール

- プロジェクト監査を通じて、プロジェクトマネジメントの標準、方針、手続き、テンプレートの遵守状況を監視



指示型

- 共有リソースを管理
- 複数のプロジェクトにわたるコミュニケーションを調整



アジャイル・センター・オブ・エクセレンス

- チームのコーチング
- 組織全体にアジャイルのマインドセット、スキル、能力を構築
- スポンサーとプロダクト・オーナーをメンタリング



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.


組織の影響

組織体の環境要因 (EEF)

- 組織の内部および外部に存在する要因

組織のプロセス資産 (OPA)

- プロジェクトに関する方針、手続き、テンプレート
- 過去のプロジェクト情報

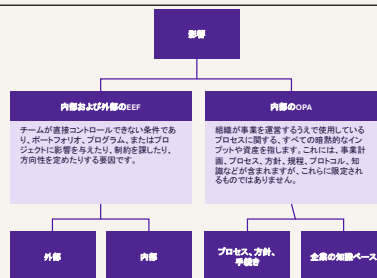

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン2

ポートフォリオ、プログラム、プロジェクト

ポートフォリオ マネジメント	戦略目標を達成するためにグループでマネジメントされるサブポートフォリオ、プログラム、プロジェクト、および定常業務の集合	ビジネス戦略と整合
プログラム マネジメント	個別にマネジメントすることでは得られないベネフィットを得るために、協調的な方法でマネジメントされる、関連するプロジェクト、サブプログラム、およびプログラム・アクティビティのグループ	コンポーネントと相互依存をコントロールし、ベネフィットを実現
プロジェクト マネジメント	独自のプロダクト、サービス、所産を生み出すために行われる有期限的な活動	組織のゴールと目標の達成を実現



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

79

成功要因の定義

ECO 3.1.2



プロジェクトの成功



プロジェクト:

価値を創出するために、独自のコンテキストにおいて実施される一時的な取り組みです。



プロジェクトの成功とは:

プロジェクトの受益者、その他のステークホルダー、プロジェクト参加者が合意した見解において、プロジェクトが作業工数と経費に見合う価値を提供したと認識されたことを示します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

81

レッスン2

次元1:プロジェクト成果の達成

- ・ 事業価値の実現における有効性を測定する
- ・ 価値はプロジェクトの実行中、完了後、または長期にわたって実現される
- ・ 戦略的な成果を反映する：
 - ・ 売上高、投資収益率(ROI)、新規顧客の獲得
 - ・ 市場での地位、イノベーション
 - ・ コンプライアンスと持続可能性



プロジェクト成果
の達成



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

プロジェクト成果メトリックスの例

- ・ 財務：総収入増加、投資収益率（ROI）
- ・ 非財務：
 - ・ 市場への先行投入
 - ・ 顧客獲得
 - ・ プロセスまたは技術の改善
 - ・ 環境および社会的目標の達成



プロジェクト成果 の達成



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

次元2:プロジェクトマネジメント・プロセスの成功

- ・ 制約条件への順守状況を測定する:
 - ・ 予算
 - ・ スコープ
 - ・ タイムライン
 - ・ 品質
- ・ 実行面を評価する



プロジェクト成果 の達成



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン2

実際の例



シドニー・オペラハウス

- 計画: 700万豪ドル、4年
- 実績: 1億200万豪ドル、14年
- 結果: ユネスコ世界遺産、世界的な象徴
- 成果は実現したが、マネジメントは失敗



モントリオール高架道路

- 橋梁設計と高架道路の位置ずれが発生
- コスト: 1,100万カナダドル(完成から1年後に解体)
- プロセスの失敗が価値提供に悪影響を及ぼした



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

ガバナンスの エスカレーション経路と しきい値の定義

ECO 3.1.3



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

プロジェクト・ガバナンス

プロジェクトの目標を達成または上回るために、プロジェクトマネジメント活動を導く枠組み、機能、プロセス群。

主なベネフィット:

- 説明責任の所在を一本化できる
- プロジェクト・ライフサイクル全体を包含する

① 「ガバナンスの形態は、組織やプロジェクトによって異なります」。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン2

プロジェクト・ガバナンス:どのような形で、どの程度必要か？



ガバナンスが過剰だとステークホルダーの不満を招く一方、緩すぎるとステークホルダーの関与や説明責任が不十分になるおそれがあります。

ガバナンス:

- 通常はすでに整備されている—プロジェクトマネジメント・オフィスによって確立されているか、組織の方針と整合しています
- プロジェクトの戦略的重要性、制約条件、監督要件に依存します



- 「社内外のビジネス環境の変化や、予算、スコープ、スケジュール、資源、品質の逸脱を管理する上で重要です」
- 「予算マネジメントに対する監督は、ガバナンスの重要分野です」



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

88

プロジェクト・ガバナンス:構成要素

以下に関するプロセス:

- 変更
- コミュニケーション
- 文書管理 (例: プロジェクトマネジメント計画書)
- 意思決定
- プロジェクト・プロセス要求事項に対する内部ステークホルダーの整合性
- プロジェクト・マネジャーの権限レベルを超える変更のレビューと承認
- リスクと課題の特定、エスカレーション、解決
- ステージ・ゲート・レビューまたはフェーズ・ゲート・レビュー
- プロジェクト・ガバナンスと組織戦略の整合のためのガイドライン
- プロジェクト・ライフサイクルと開発アプローチ
- 役割を明確にしたプロジェクト組織図
- プロジェクトの成功基準と成果物の受入基準
- プロジェクト・チーム、組織内のグループ、外部ステークホルダー間の関係



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

89

適応型プロジェクトにおけるガバナンス



適応型プロジェクトにおけるガバナンスには、次のような特徴があります。

- 成果物や期待事項を文書化する
- 以下を通じて、プロジェクト状況を明確に把握できる:
 - 定義されたイテレーション/スプリントの期待事項および成果物
 - 特定の日付でのリリース
 - 日次の調整ミーティングを通じた、プロジェクト成果のリアルタイム監視

反復型アプローチでは、予測型アプローチよりも迅速かつ低コストで、価値に基づく成果物を特定できます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

90

レッスン2

ガバナンス委員会(プロジェクト委員会または運営委員会)



プロジェクト・ガバナンス委員会の経験がある方はいますか？
ご自身のプロジェクトでは、どのように機能していますか？

- プロジェクトに対する監督を提供する
- プロジェクト・スポンサーやシニア・マネジャー、プロジェクトマネジメント・オフィスの資源で構成される場合がある
- 担当する場合がある業務：
 - 主要要素成果物のレビュー
 - プロジェクト上の意思決定に対する指針の提示



スクラムやSAFe®を採用するプロジェクトでは、プロジェクトと組織レベルのガバナンスをつなぐために、中間的なガバナンス・ボードが用いられます。




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

ガバナンスはエスカレーション手続きを定義する

プロジェクトで定められたしきい値や許容範囲を超える問題が発生した場合：

- 対応権限を持つ責任あるステークホルダーにエスカレーションする。
- 一方、問題がしきい値や許容範囲内にある場合は、チームと協働して解決策を見出す。



しきい値

測定可能なプロジェクト変数の事前決定値で、それに達した場合にアクションを起こす必要がある限界値を表します。



許容度

品質、リスク、予算、またはその他のプロジェクト要求事項において受容できる変動を定量的に表したもの。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

ガバナンスとライフサイクル:システムとしての視点



ガバナンス・システムは、価値実現システムであるプロジェクト・ライフサイクルと並行して機能します。



理由は、業務フローを円滑にし、課題を管理し、意思決定を支援することにあります。

ライフサイクルの成果としての価値実現



ライフサイクルに組み込まれた価値実現



「プロジェクトマネジメントの原則は、システム間の相互作用を認識し、評価し、対応することです」



プロジェクト・ライフサイクル

プロジェクトの開始から完了までに通過する一連のフェーズです。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン2

ガバナンス・チェックポイント: フェーズ・ゲートとイテレーション

予測型	適応型
作業をフェーズに分割	作業をイテレーションに分割
フェーズ・ゲート(ガバナンス・ゲート、中止点、トールゲートとも呼ばれる)で結果をレビューする	イテレーションの終了時に結果をレビューする
判断内容: - 次のフェーズに進む - 修正を加えて続行する、または - プロジェクトやプログラムを終了する	フィードバックを収集し、次のイテレーションで価値を高めるための改善策を実行する
	顧客の受入基準(例: Doneの定義)が満たされるか、プロジェクトが終了するまで続ける




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

94

プロジェクト・フェーズ: 関係性



プロジェクト・フェーズは、1つ以上の成果物の完成に至る、論理的に関連するプロジェクト・アクティビティの集合です。あるフェーズのアウトプットは、一般に次のフェーズへのインプットとなります。フェーズ間の関係は、**順次的**である場合もあれば、**重複**する場合もあります。



順次関係

フェーズ間の連続関係。フェーズは連続して発生し、重複しません。



重複関係

フェーズ間の重複関係。複数のフェーズが互いに同時進行します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

95

予測型プロジェクト・フェーズへのガバナンスの適用



ANG FEN



フェーズ
開始時:

- プロジェクトの前提条件を検証し、妥当性を確認する。
- リスクを分析する。
- フェーズの成果物について詳細な説明を提供する。



フェーズ
終了時:

- 主要要素成果物が作成される。
- 完全性および受入可否を確認するためのレビューを実施する。



「重大なリスクが発生した場合、成果物が不要になった場合、または要求事項が変更された場合、そのフェーズやプロジェクトは終了されます」。




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

96

レッスン2

報告およびガバナンス・プロセスの支援

報告とガバナンスのプロセスを支援することは、プロジェクト情報が正確で、タイムリーであり、組織の意思決定および監督構造と整合している状態を維持するサポートを行うことです。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

97

プロジェクト・ガバナンス・フレームワークとの整合性



組織のガバナンス構造を理解します。



必要なガバナンス機関が適切な情報を受け取ることを支援します。



段階ゲートまたはフェーズ・ゲート・レビューのプロセスに従います。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

98

意思決定とエスカレーションの促進



ステークホルダーの意思決定を支援するため、タイムリーで正確なデータを提供します



合意されたプロトコルに従って、課題、リスク、または変更をエスカレーションします



決定事項を文書化し、アクション・アイテムを追跡します



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

99

レッスン2

コンプライアンスと可監査性のサポート

プロジェクトをできるだけ簡単にレビューできるようにします。

- 内部の方針、標準、および監査要求事項に従います。
- 重要な決定事項と文書のトレーサビリティを確保するのに役立ちます。
- 監査やプロジェクト後のレビューの準備として、記録を完全かつ整理された状態で保管します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

100

透明性のある積極的なコミュニケーション

プロジェクトをできるだけ簡単にレビューできるようにします。

- 信頼できる一貫性のある最新情報を共有します。
- 積極的にリスク、差異、リカバリー計画を伝えます。
- ダッシュボード、スコアカード、視覚化などのツールを使用して、パフォーマンスの傾向を強調します。

プロジェクトのパフォーマンスは、常に可視化する必要があります。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

101

ステークホルダーのガバナンス活動への関与を促進する

プロジェクト文書を最新の状態を保ちアクセス可能にするなど、以下を含みます。

-  ガバナンス会議と段階ゲート・レビューをスケジュールし、円滑に進めます。
-  ステークホルダーの積極的な参加とフィードバックを奨励します。
-  必要に応じてガバナンス・チェックポイントを使用し、スコープ、資源、または時系列を再調整します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

102

レッスン2

[illegible]



Learning

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・
プロフェッショナル(PMP)®試験準備コース

プロジェクト・スコープ、 価値、成功基準の定義


レッスン3



Learning

レッスン3







レッスン3

プロジェクト・ スコープの定義

ECO 2.2.1



スコープ定義

スコープとは、提供されるプロダクト、サービス、または所産の総体です。しかし、プロジェクト・スコープとプロダクト・スコープには違いがあります。



プロダクト・スコープ

プロダクトやサービスを特徴付ける機能やフィーチャー



プロジェクト・スコープ

プロダクト、サービス、および/または所産の提供を特徴付けるフィーチャー、機能、および作業

プロジェクト・スコープは、立ち上げ合意書または契約作業範囲記述書(SOW)で特定されます。プロダクト・スコープが含まれることもあります、別個に定義されます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

プロジェクト全体を通して事業価値を調べる

事業価値とは、事業活動から得られる定量化可能な正味のベネフィットのことであり、形態には以下のものがあります。

- 有形
- 無形
- またはその両方



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン3

Readyの定義とDoneの定義

アジャイル型のチームは、いつ準備が完了して作業にとりかかれるか、そしてその作業がいつ完了するのかわかる必要があります。

Readyの定義 (DoR)—チームが作業を開始するために何が必要かを明確にすることです。

- 環境の複雑さと過去のイテレーションから得た教訓に依存します。
- DoR チェックリストを使用して、作業や進捗の準備状況についてステークホルダーとコミュニケーションを取り、協力します。

Doneの定義 (DoD)は、目的や望ましい状態を説明するものです。DoRに基づく必要があります。

「DoD は、予測型プロジェクトにおける受入基準と同様のものです」。



Readyの定義 (DoR)

ユーザー中心の要求のチェックリストであり、チームが作業を開始するために必要なすべての情報が記載されています。



Doneの定義 (DoD)

成果物が顧客の使用に耐えるものとみなされるために必要な、すべての基準を満たしたチームのチェックリストです。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

7

プロジェクト・スコープ計画: 要求事項の収集方法

	インタビュー	アンケート調査	観察	フォーカス・グループ	ワークショップのファシリテーション
特性	• 成果物のフィーチャーと機能を特定/定義 • 構造化、非構造化、または非同期	• 書面形式 • 大規模なグループから情報を収集 • 定量的データを生成	• 特定の職務役割、タスク、または機能について学ぶために用いられる物理的技法	• カジュアル/インタラクティブな情報共有 • モデレーターによるガイド付き • ステークホルダーと当該分野専門家を含む • 定性的データを生成	• プロジェクトマネージャーが要求事項を決定し、プロジェクトの成果についてステークホルダーの合意を得るために開催するセッション
利点	• 機密情報を扱う • ステークホルダーの要求事項、目的、または期待事項の特定を支援	• 短時間で収集 • 地理的に分散した多様な回答者に対して有効 • 統計分析のための定量化可能なデータを生成	• チームは変更が有益となる可能性のある箇所を理解できる	• 多様な意見を求めて参加者を事前に選定 • 少数派グループによる集中的アプローチで特定の情報を収集	• チームが要求事項を把握できる • ステークホルダーが他の懸念や要求事項を理解できる
留意事項 (潜在的な欠点)	• 単一の視点しか捉えられない	• 時間がかかる • 回答データの品質は質問の質に依存		• ステークホルダーの事前連絡が必要 • 当該分野専門家とファシリテーションが不可欠	• ファシリテーションが不可欠



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

8

要求事項の作成にベンチマークを使用



比較分析



データの収集と測定



目標設定の基準点



標準化と検証



アイデアの創出と改善

自組織のプロセス、プロダクト、実務慣行を他のプロジェクトや組織と比較します。

既存システムの重要業績評価指標、メトリックス、または特性を把握します。

開発プロセス中にプロダクトが満たすか上回らなければならない、具体的な目標やメトリックスを設定します。

要求事項が業界標準や組織標準に適合しているかどうかを検証します。

プロダクト要求事項改善へのインスピレーションを得ます。




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

9

レッスン3

ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャーの作成

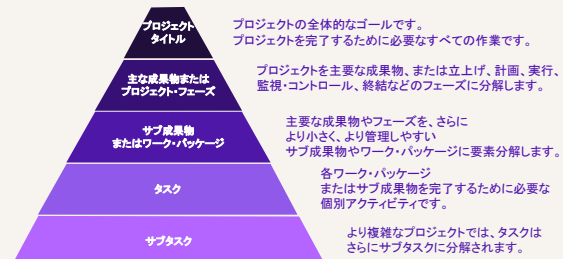

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

WBS辞書

ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャーの各構成要素に関する詳細な成果物、アクティビティ、およびスケジュール情報を含んでいます。

作業を要素分解し、以下を含めます。

- WBSコード識別子
- 作業の説明
- 前提条件と制約条件
- 担当組織
- スケジュール・**マイルストーン**
- 関連スケジュール・アクティビティ

- 作業を完了するために必要なリソース
- コスト見積り
- 品質要求事項
- **受入基準**
- 技術的な参照
- 合意情報



マイルストーン

ポートフォリオ、プログラム、またはプロジェクトにおける重要な節目やイベントです。



受入基準

成果物が受入れられる前に満たす必要がある一連の条件です。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course


複雑なプロジェクトのマネジメント

複雑さに対処するには、プロセスに基づく以下の戦略を検討します。

イテレーション

エンゲージメント

フェイルセーフ



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン3

プロジェクト・スコープ に関するステークホル ダーの合意を得る

ECO 2.2.2



固定スコープとフレキシブル・スコープ



固定スコープとは、プロジェクトの
スコープが事前に決められ、プロ
ジェクト・ライフサイクル全体を通じ
て一定であるプロジェクトマネジメ
ントのアプローチを指します。



フレキシブル・スコープとは、プロ
ジェクトのスコープが適応可能で、
プロジェクト・ライフサイクル全体を
通じて変更可能なプロジェクトマネ
ジメント・アプローチを指します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

ユーザー・ストーリー、ストーリー・マップ、 ロードマップ



- ストーリー・マップでは、ユーザー・ストーリーを機能グルー
プとプロダクト・ロードマップのナラティブ・フロー
（「全体像」）の中に整理します。
- プロダクトと今後の方向性を特定し、イメージを描き、
優先順位をつけるのに役立ちます。
- 「ストーリー・マップ技法はJeff Patton氏によって開発さ
れました。」



Patton, J. (2006年10月8日). The new user story backlog is a map [ブログ投稿]. Patton Associates, <https://pattonassociates.com/the-new-backlog/>



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン3

プロジェクト・スコープの監視

	スコープの説明	方法
	スコープ・ベースラインとは： ・承認済みのプロジェクト・スコープ記述書 ・ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャー (WBS) ・関連WBS辞書	スコープ・ベースラインに対するプロジェクト・スコープの完了を測定します。
	スコープの進化過程： ・最初のプロダクト・ロードマップ、次に ・リリース・バックログ、次に ・イテレーション・バックログ バックログ (プロダクトのフィーチャーや機能、ユーザー・ストーリーを含む) は、特定され、更新され、再優先順位付けされたプロダクトのニーズを反映します。	ユーザー・ストーリーとDoneの定義 (DoD) が顧客のフィードバックとプロダクト要求事項に合致しているか確認します。
	上記の任意の組み合わせ	上記の任意の組み合わせ



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

プロジェクト・スコープの分解

ECO 2.2.3



スコープ・マネジメント計画書



- ・プロジェクトのスコープに関するアクティビティの概要とその作業の実施方法
- ・プロジェクト・スコープ記述書を作成するためのプロセスを含める必要がある
- ・詳細なプロジェクト・スコープ記述書からワーク・ブレイクダウン・ストラクチャーの作成が可能
- ・スコープ・ベースラインの承認方法と維持方法を確立
- ・完成したプロジェクト成果物の公式な受入れをどのように行うかを指定
- ・正式でも非公式でも、広範なものでも非常に詳細なものでも可



スコープ・マネジメント計画書

プロジェクトマネジメント計画書またはプログラムマネジメント計画書の構成要素のひとつ。スコープの定義、作成、監視・コントロール、および妥当性確認の方法を記述します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン3

スコープ計画: プロセスの比較



プロジェクト・マネジャー

- 要求事項の引出しと分析のプロセスを促進
- 要求事項を以下に文書化:
 - スコープ記述
 - ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャー (WBS)
- 要求事項を実現するためのスケジュール、予算、資源、品質の計画を策定

「ハイブリッド・スコープ計画プロセスはどのようなものになるでしょうか？」



プロダクト・オーナー

- イテレーション計画会議のためにリリース・バックログを作成し改善
- 優先順位付けされた各ユーザー・ストーリーをチームに詳細に説明
- リリース・バックログのユーザー・ストーリーの順序付けと優先順位付けにストーリー・マップを使用


チーム

- 必要な作業工数を見積り、イテレーション・ベースラインを作成し、イテレーションの期待されるペロシティを満たすストーリーを選択
- 特定されたフィーチャーや機能をサポートするために、プロダクト・バックログからリリース・バックログにユーザー・ストーリーを引き出す

データの表現



- マインド・マップ**—個々のブレインストーミング・セッションで生み出されたアイデアを1つのマップに統合し、理解における共通点と相違点を反映させ、新しいアイデアを生み出す
- 親和図**—大量の情報、アイデア、データを、それらに本来備わる関係性や親和性に基づいて、意味のあるカテゴリやグループに整理



スコープ計画: 要求事項の優先順位付け


ツールまたは技法	説明	ベネフィット
MoSCoW手法 <i>Dai Clegg氏が開発</i>	各要求事項の重要性について、ステークホルダーと共通の理解を得るために使用されます。これには以下の意味があります。 - M—Must have (必須) - S—Should have (すべき) - C—Could have (できれば) - W—Will not have (不要)	- 複数の視点を比較 - タイムボックス化と併用し、最も重要な要求事項に集中 - アジャイル・ソフトウェア開発、スクラム、迅速なアプリケーション開発 (RAD)、ダイナミックシステム開発アプローチ (DSDM) で一般的
親和モデル <i>(プロダクト・マネジメント技法)</i> <i>特許取得済氏が開発</i>	顧客の潜在的な要求事項やフィーチャーをすべて把握し、以下の4つのニーズのカテゴリに分類します。 - ディファイター (低キライヤー (魅力要因)) - サティファイヤー (満足要因) - 不満足要因 - 無関心	顧客満足度とロイヤリティに最も影響を与えるものによって、開発作業に優先順位付けが可能
ペア比較分析 <i>LL Thurston氏が開発</i>	一つの案を他の案と比較することで、代替案の評価と順位付けを行います。	主観的な要求事項の範囲が小さい場合に適している
100ポイント法 <i>(固定合計法または固定配分法とも呼ばれます)</i> <i>Dean Lottengruber氏とDon Widing氏が開発</i>	リスト内の要求事項の重要性に投票します。ステークホルダーは、重要だと思う項目に100ポイントを自由に配分します (1モノ/1ポイント・マネー) 手法のように)。	- 大規模なグループを含む、あらゆるグループ・サイズに適している - ステークホルダーは深い思考を行使する必要があり、その意思決定が優先順位付けされる

レッスン3

スコープ計画:分析のためのツールと技法



「要求事項分析のツール/技法と正しい説明を組み合わせてください」。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

22

ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャーにおける作業の要素分解



プロジェクト・スコープと成果物を、より小さくマネジメントしやすいパートに分割、細分化

ステップ:

1. 成果物と、それらを達成するために必要な作業/タスクを特定します。
2. ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャーを構造化し、体系化します。
3. 上位レベルのワーク・ブレイクダウン・ストラクチャーのスコープの構成要素を下位レベルの構成要素に分解します。
4. WBSコードから各コンポーネントに固有の識別コードを作成し、割り当てます。
5. ワーク・パッケージの要素分解をレビューし、プロジェクトに対する要求事項に整合していることを検証します。



「プロジェクトのニーズとプロジェクトを効果的に管理するために必要な詳細度に応じて、要素分解のレベルを調整します」。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

23

プロジェクト・スコープ記述書

プロジェクト・スコープ記述書には、以下のものが含まれます。

- ・ スコープの説明—プロジェクトとプロダクト
- ・ 受入基準
- ・ 必要な成果物
- ・ 明確化のために必要なスコープ外の項目
- ・ 制約条件と前提条件



「プロジェクト・スコープ記述書が承認されベースライン化されると、変更は変更マネジメント計画書に従ってのみ許可されます」。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

24

レッスン3

適応型環境におけるスコープ計画

- ・ 漸進型またはイテレーション型の開発
- ・ ユーザー・ストーリーは、要求事項プロセスの代替的な見方を提案



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

バックログ

- ・ 優先順位付けされた既知の作業範囲のリスト
- ・ 情報はストーリー形式で提示
- ・ チームと協力してプロダクト・オーナーが継続的に更新

例:

プロダクト・オーナーは、プロダクト・バックログを作成し、チームやステークホルダーと協力してストーリーを特定し、追加します。作業項目は、ユーザー・ストーリーを通じて望まれるプロダクトの機能を記述します。

- ・ プロダクト・オーナーは、価値に応じて作業を優先順位付けする責任があります。
- ・ プロダクト・オーナーとチームは、作業項目をイテレーション/スプリント・バックログに移すために協力します。




バックログは、チームやプロジェクトによって少し違った名前では呼ばれるかもしれませんが、一般的にはプロダクト・バックログ、イテレーション・バックログ、リリース・バックログ、スプリント・バックログなど、説明的な名前が付けられます。

PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

エピック > フィーチャー > ユーザー・ストーリー

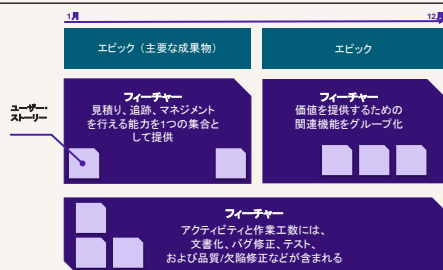

PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン3

エピックとフィーチャー



エピック

一群の要求事項を階層的に組織化し、特定のビジネス成果を実現することを目的とした、大規模かつ関連性のある一連の作業。



フィーチャー

組織に価値を提供する、関連する要求事項または機能の集合です。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

28

スコープは、顧客が成果物を受入れた時点で妥当性が確認されます



受入基準



- Readyの定義 (DoR)
- Doneの定義 (DoD)
- 受入基準
- イテレーション・レビュー



上記の任意の組み合わせ



予測型開発アプローチにおいて、受入基準の決定に役立つ作成物はどれですか？

- a. 責任トレーサビリティ・マトリックス
- b. **スコープ記述**
- c. チーム憲章
- d. ステークホルダー・エンゲージメント計画書



適応型開発アプローチにおいて、ユーザー・ストーリーの受入基準が満たされたと判断するには何が役立ちますか？

- a. プロダクト・ロードマップ
- b. **完了の定義 (DoD)**
- c. リリース計画
- d. カンバン・ボード



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

29

PMP®

価値ベースの デリバリーの確保

ECOタスク2.3

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.



レッスン3

主要ステークホルダー と価値コンポーネント の特定

ECO 2.3.1



価値の概要

- ・ 価値とは、ポートフォリオ、プログラム、またはプロジェクトの目標を達成することで得られる、投資を上回る金銭的および非金銭的ベネフィットの超過分のことです。
- ・ ステークホルダーごとに、価値の捉え方は異なります。
- ・ 価値は、パフォーマンス・メトリックスまたは財務指標を通じて測定できます。
- ・ 価値には、有形のものと無形のものの両方があります。
- ・ 価値は、成果物と混同すべきではありません。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

価値の源泉

価値は、次の方法で実現または創造できます。



新しいプロダクト、サービス、所産を創造する



プラスの貢献を生み出す



効率または生産性を向上させる



必要な変更を可能にする



ベネフィットを維持する



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン3

価値のコンポーネント



機能



品質



コスト



時間



顧客満足



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

34

プロジェクト・マネジャーの役割

価値のコンポーネントを特定するには、次のことを行う必要があります。

- ステークホルダーがプロジェクトから何を欲しいと考えているかを理解します。
- ステークホルダーのプロファイルやペルソナを使用して、影響力、コミュニケーションのニーズ、価値の視点を文書化します。
- 価値工学プロセスで価値のコンポーネントを評価します。
- エンゲージメント戦略を策定します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

35

変更に関する計画

プロジェクトによってもたらされる変更を実施するために必要な知識の移転、トレーニング、準備のアクティビティを定義します。

- 人々の気持ちを知るために、態度調査を含めます。
- 変更慣れを促すために情報提供キャンペーンを作成します。
- 変更の潜在的な影響について、オープンで透明性をもって伝えます。
- 展開計画の作成を検討します。

❗ 「展開計画はプロジェクトマネジメント計画書のコンポーネントではありません」。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

36

レッスン3

変更を支援するアクション



DO

- 同僚をコーチングしてビジネスを支援—忍耐と思いやりのあるメンタリングが重要です。
- アジャイルな運用システムを可能にする—チームメンバーに対しアジャイルに関するコーチングを行い、変更重視のマインドセットへの適応を促進します。
- 知識を最新の状態に保つ—プロセスと知識を継続的に改善します。

DON'T

- 強制的な変更—関与を深めて意見を聞きます。変更の理由について納得してもらうことを目指します。
- 抵抗勢力を遠ざける—変更はコンフリクトを生む可能性があるため、慎重に進めます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

37


価値とステークホルダーのフィードバックに基づく作業の優先順位付け

ECO 2.3.2



戦略上の整合と価値の実現

- 組織はステークホルダーに価値を創造します。
- 期待される創出価値は、しきい値を満たすか、それを上回らなければなりません。
- プロジェクトは、価値を提供したり、価値の生産を高めたりするために特別に設計されます。
- 価値重視の考え方は、投資収益率 (ROI) を最大化することを目的としています。
- 組織のリーダーは、多くの要因に対応してプロジェクトを立ち上げます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

38

レッスン3


ステークホルダーの影響度の理解



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

ステークホルダーからのフィードバックの重要性

- ・ 一貫したフィードバックにより、リスクとその影響を特定できる可能性がもたらされます。
- ・ プロジェクトに対して強い影響力を持ち、好ましくないまたは中立的な見解を持つステークホルダーには、効果的に関与してもらうべきです。
- ・ 価値のマインドセットを持つことで、ステークホルダーと関わり、彼らのニーズや期待を理解することができず。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. 41
This material is being provided as part of a PMI course.

価値とステークホルダーのフィードバックに基づく作業の優先順位付け

想像してみてください。プロジェクトが半分まで進んだ段階で、最も重要なステークホルダーが、プロジェクトが期待される価値を提供していないとして変更を要求したとします。

明確な優先順位や期待についての確固たる理解がなければ、何かが遅れているのか、あるいは何かを完全に見逃しているのかを認識できません。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. 4

レッスン3

バックログの優先順位付けと調整



- イテレーション計画の前にプロダクト・オーナー/顧客によって行われる継続的な調整
- さらなる調整は、スプリント/イテレーションの最中にチームとプロダクト・オーナーが共同で実施可能
- 価値を最初に提供する優先度の高い項目を完了するための、作業の再編成と再優先順位付けが可能
- エピックをユーザー・ストーリーに分割



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

43

プログラム、プロジェクト、業務の整合

組織によっては、ポートフォリオ内で複数のプログラム、プロジェクト、業務をマネジメントしています。ポートフォリオによりホリスティックなビューを得られるため、リーダーは次のことを行えるようになります。



戦略、目標、義務に基づいて、イニシアチブに優先順位を付けて管理します。



価値を最大化するために、複数の分野を調整します。



プロジェクトと業務を組織のゴールに整合させます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

44

インクリメンタルな形で価値を提供する機会を評価する

プロジェクト全体を通して事業価値を調べる

ECO 2.3.3、2.3.4



レッスン3

価値ベースの増分デリバリーの概要

増分デリバリーは、プロダクトやソリューションをより小さな機能・パートや増分で構築しリリースするプロセスです。

考えられる増分的な価値ベースのサービスには、次のようなものがあります。

- コミュニティ食事サービス・プログラム
- 輸送サービス
- グループでの外出やイベント
- 介護者の負担軽減
- 成人向けデイ・ケア



PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

漸進型アプローチを理解する

このアプローチは、以下の点で有益です。


- 一連のイテレーションを通じて成果物が生み出される
- 予測型の特性が適用されるが、部分的な引渡しが要求される場合
- プロジェクトが複数のフェーズや増分に分割されている場合
- ステークホルダーがプロダクトの一部を使用してベネフィットを得られるため、プロジェクトの価値提案を高めることができる場合が多い



PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

漸進型アプローチと反復型アプローチ

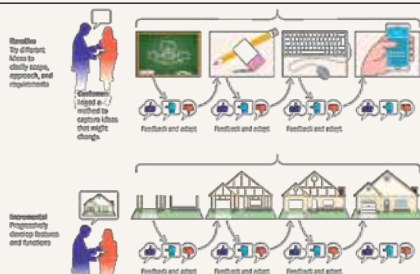

PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン3

継続的引渡しを理解する

継続的引渡しとは、以下のような実務慣行です。

- ・顧客へのフィーチャーの即時引渡し
- ・本番環境への継続的な価値提供
- ・テスト済みで妥当性確認済みのプロダクト増分。
常に本番稼働の準備が整っている

継続的なフローを維持することで、チームは以下のことができます。

- ・ リスクを最小限に抑え、頻繁かつ効率的に展開
- ・ 顧客からのフィードバックと進化する市場傾向に対する応答性の促進



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course


継続的フローの維持

プロジェクト・マネジャーは、望まれる成果を記述し、プロジェクト・ライフサイクル全体を通じて、次の方法を用いてそれらを反復的に評価し、更新する必要があります。

- ・ 品質ゲート
- ・ フィードバック・ループ
- ・ 定期的なレビュー

プロジェクト・チームは、変化に適応し、以下に対する進捗を継続的に評価する必要があります。

- 求められるアウトプット
- ベースライン
- ビジネス・ケース



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

プロジェクト・マネジャーの役割

- ・プロジェクトで期待される価値を分析します。
- ・プロジェクトに適した開発アプローチを特定します。
- ・次に引渡しする増分または要素の方向性を設定します。
- ・プロジェクトの複雑さを評価し、戦略を立てます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン3

ベネフィットを追跡する 測定システムが整って いることを確認する

ECO 2.3.5



ビジネスに基づくベネフィット測定方法



費用便益率

初期コストに対する投資の期待現在価値の尺度

$$\text{費用便益率} = \text{推定コスト} \div \text{推定ベネフィット}$$

比率 > 1 = 実行可能

機会費用

- 数あるプロジェクトの中から特定のプロジェクトを選ぶことで、何を諦める必要があるかを理解するのに役立つ
- 代替案が確実に検討対象に含まれる



「試験では、いずれの計算も必要ありません」。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

財務に基づくベネフィット測定方法



正味現在価値(NPV)

- プロジェクト・ライフサイクルにわたるすべての予想キャッシュ・インフローとアウトフローの現在価値を計算
- 正味現在価値が0より大きければ受容

投資収益率(ROI)

- 投資額に対する利益または損失を測定
- 投資対効果が0より大きければ受容

内部収益率(IRR)

- プロジェクトの正味現在価値が0になる割引率
- 期待収益率を示す
- 内部収益率が資本コストより大きければ受容



「試験ではこれらを計算する必要はありません」。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン3

ベネフィット測定方法



費用便益分析

財務分析方法のひとつです。プロジェクトのコストに対して、プロジェクトから得られるベネフィットを測定するために用います。



ビジネス
ベース



財務
ベース



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

55

現在価値と正味現在価値の使用

現在価値は、貨幣の価値が変化する可能性があるインフレ時などに、複数の期間にわたるプロジェクトに適用されます。

正味現在価値：

- 現在価値を決定する要因には、以下のものがあります。
- 将来価値
 - 金利
 - 期間数
- 資本予算化のために使用
 - インフレやマクロ経済の変化を考慮（割引率）
 - 今日の通貨単位の価値を将来の同じ通貨単位の価値と比較

年	0	1	2	3	4
正味キャッシュ・フロー	-1200	+400	+800	+600	+1200
要因	1	.91	.83	.75	.68
正味現在価値	-1200	+364	+664	+450	+816



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

56

目標と主要な所産が事業価値の実現にどのように役立つか

- 組織目標から始めます。
- 望ましい主な所産を決定します。
- 目標と主要な所産でさらに調整します。
 - 目標とは目的であり意図です。
 - 主要な所産は、目的と意図に沿った、時間的制約のある測定可能なマイルストーンです。

目標と主要な所産に関するベストプラクティス：

- それぞれの目標を、3つから5つの測定可能な主要所産でサポートします。
- 競争力のある目的設定を促すために、70%の成功率を目指します。成功率が100%の場合、十分に挑戦的でないため、再評価してください。
- 行動指向でインスピレーションを与えるOKRを作成し、具体的に測定可能な成果を含めます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

57

レッスン3

価値を提示するための デリバリー・オプションの評価

ECO 2.3.6



価値の定義

価値は、財務的なものだけでなく、さまざまな方法で定義することができます。

一般的な財務メトリクス	投資収益率 (ROI) と正味現在価値 (NPV)
代替の価値指標	規制コンプライアンス、社会的影響、タイムリーな納入、顧客満足、イノベーション
パイロット・プロジェクト	価値は即座にはなく、後になって実現される
支出の増加	価値がタイミングや戦略的成果に結び付いている場合には受容可能




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

事業価値を検証することの重要性

継続的な価値の監視:

- 価値の整合性を確保するのに役立つ
- 早期の軌道修正が可能になる
- より賢明な意思決定を支援

事業価値を継続的に検証することで、プロジェクト・アクティビティと連動して、作業によって確実に影響力がもたらされるようになります。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン3

フェーズを通じた事業価値

立上げ	計画	実行	終結
価値を定義します。	プロジェクトの目的、スコープ、タイムラインを設定し、期待されるビジネス成果をサポートします。	価値提供の測定に重点を置きます。	価値提供を評価します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

61

事業価値の尺度

費用便益率
計画されたベネフィット提供と実際のベネフィット提供との比較
投資収益率(ROI)
正味現在価値(NPV)



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

62

価値を提示するためのデリバリー・オプションの評価

価値実現システム内:



ポートフォリオ、プログラム、プロジェクトは成果物を生み出します。



成果物は成果につながります。



成果はベネフィットを生み出します。



ベネフィットは価値を生み出します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

63

レッスン3

予測型アプローチ: 価値の実現



スコープ、要求事項、リスクが早期に明確に定義されます。



ベネフィットはプロジェクトの終了時にのみ提供されます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

64

適応型アプローチ: 価値の実現

適応型アプローチは、プロジェクト全体を通じて、より小さく、より速いサイクルで価値を提供します。



ベネフィットを段階的に提供します。



フィードバックを得て、より早くプロダクトをリリースできます。



継続的な学習を可能にします。



スキルを向上させ、失敗のリスクを低減します。



価値のタイムラインを短縮したり、早期に投資収益を回収したりできます。



早期のリターンやフィードバックにより、価値が最適化されます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

65

デリバリー・ケイデンスの選択肢を理解する

プロジェクトでは、成果物と開発アプローチに基づいて、さまざまなデリバリー・ケイデンスを使用します。ケイデンスにはそれぞれ独自の価値ベネフィットがあります。

- 成果物のタイミングと頻度を指す
- 以下を含む:
 - 単一のデリバリー
 - 複数回のデリバリー
 - 定期的または継続的なデリバリー
- 価値実現の方法とタイミングに影響を与える



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

66

レッスン3

投資対効果を向上させる

プロジェクトのコストに対する財務的リターン量の尺度です。

- ・プロジェクトの立上げに関する意思決定を支援
- ・プロジェクト・ライフサイクル中の主要ポイントで更新
- ・継続的な追跡を通じて進行中の投資判断を導く



予測型アプローチとアジャイル・アプローチでは、投資収益率(ROI)は、デリバリー・オプションが財務的リターンに及ぼす影響がより早いROIを通じて示されるため、価値主導の意思決定を支援します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

正味現在価値の測定

正味現在価値(NPV) = ベネフィットの現在価値 - コストの現在価値

- 今日の条件における、将来のベネフィット価値を反映
- 現在と将来のコスト、予測されるベネフィット、インフレを考慮
- プロジェクトを開始する価値があるか、継続する価値があるかを判断するのに役立つ




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

正味現在価値の向上

プロジェクト・タイムラインの構成方法は、価値提供の方法とタイミングに直接影響を与えます。

- より短いタイムラインで、より早く価値を提供
- タイムラインの短縮によりインフレの影響を軽減
- デリバリーの加速化により正味現在価値 (NPV) が向上
- 投資回収期間の短縮によりスポンサーの支援を獲得
- 価値を最大化するデリバリー・オプションを選択
- 目標と主要な所産 (OKR) を使用して、価値主導の目標を設定および測定



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン3

目標と主要な所産を理解する

目標と主要な所産(OKR)は、測定可能な目標を定義し、成果を追跡するための、目標設定およびパフォーマンス測定フレームワークです。

目標	主要な所産
- 明確で具体的かつ行動指向であり、理想的には意欲的な内容 - 明確さと方向性を提供	- 時間的制約がある、具体的で測定可能な成果 - 現実的でありながらも挑戦的で、目標達成に向けて進捗を明確に追跡可能



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

70

目標と主要な所産で価値提供を推進する

各OKRは、目標から始まり、その目標に向けた進捗を測定する3〜5の主要な所産が続きます。

目標	顧客満足度を向上させる
主要な所産1	第2四半期末までにNet Promoter Score®(NPS)を50から70に引き上げる
主要な所産2	サポートの応答時間を24時間から12時間に短縮する
主要な所産3	第2四半期末までに、サポート後の調査で90%の満足度を達成する



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

71

価値提供の最適化

ベネフィット測定方法を用いて、価値の提供を加速できるかどうかを評価することができます。

- 基本的なプロダクトを早期に提供します(最小実行可能プロダクト(MVP))。
- より早く市場に参入し、フィードバックを収集して収益を生み出します。
- 予測型アプローチを使用します(4月と6月の成果物)。
- 反復型アプローチを使用します(早期の収益により、回収は7月中旬にシフトします)。





© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

72

レッスン3





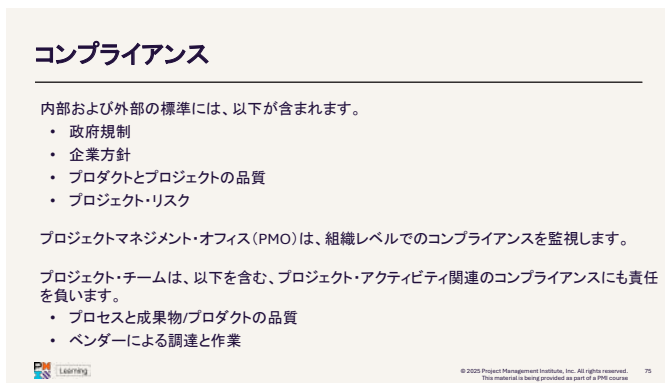

レッスン3

コンプライアンス要求事項

法的または規制上の制約には、以下が含まれます。

- ・ 特定の実務慣行の要求事項
- ・ 標準
- ・ プライバシー法
- ・ 機密情報の取り扱い

品質:プロジェクトに合わせて調整—どの程度のプロセスの厳密さと品質コントロールが適切か？



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

コンプライアンスのカテゴリー分類

- ・ 環境リスク
- ・ 職場の健康と安全
- ・ 倫理的/非腐敗的な実務慣行
- ・ 社会的責任
- ・ 品質
- ・ プロセス・リスク

カテゴリーは以下に基づいて異なります。

- 業界とソリューションのスコープ
- 独自の法的および規制上のエクスポージャー



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

コンプライアンス上の脅威の調査

- ・組織内でコンプライアンスを担当するのは誰ですか？
- ・組織に影響を与える法的または規制上の要求事項は何ですか？例えば、職場の安全、データ保護、専門職能団体への加入などです。
- ・組織の品質方針はどのようなものですか？
- ・チームとステークホルダーは、コンプライアンスの問題を認識していますか？

品質方針

組織が品質マネジメントに組織のシステムを組み入れる際に、組織行動のガバナンスを実行する基本原則となります。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン3

コンプライアンスを サポートする方法の活用

ECO 3.2.4



コンプライアンスをプロジェクトの目標として扱う

- コンプライアンス要求事項に関するリスクを積極的に追跡し、管理します。
- 品質監査を実施する準備をします。
- 成果物に対する法的および規制上のコンプライアンスを継続的に検証します。
- プロジェクト終了前にコンプライアンスを確認し、課題の移行を回避します。
- リスク登録簿または専用のコンプライアンス登録簿には、以下を含めます。
 - 特定されたリスク
 - 責任を負うリスク・オーナー
 - 顕在化したリスクの影響
 - リスク対応



「大規模な組織や規制の厳しい業界では、通常、コンプライアンスの部署を設置していたり、役員を任命していたりします」。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

一般に認められているコンプライアンス実務慣行

- **文書:**コンプライアンスのニーズとリスクの更新
- **リスク計画:**リスク計画においてコンプライアンスを優先
- **コンプライアンス評議会:**品質/監査の専門家や関連する法務/技術の専門家で構成
- **コンプライアンス監査:**正式なプロセス
- **コンプライアンス・スチュワードシップ:**受講者各自の責任です。

Rincon, L.D.(2010年10月12日).My project should be compliant-What do I do now? PMI®グローバル・コンGRESS2010年—北美(ワシントンDC)にて発表された論文、プロジェクト・マネジメント協会: <https://www.pmi.org/learning/library/achieve-compliance-accommodate-constraints-project-6537>



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン3

プロジェクトはコンプライアンス要求事項に適合していますか？



プロジェクトは組織の品質方針に沿っていますか？



コンプライアンス要求事項について、プロジェクトマネジメント・オフィスと定期的に協働していますか？



プロジェクト・チームは、プロジェクトのコンプライアンス要求事項を認識していますか？チームはどのようにマネジメントしていますか？



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

82

プロジェクトのコンプライアンス健全性の評価

プロジェクト実務者は、プロジェクトマネジメント・ツールとプロセスを使用して、次のようにコンプライアンスをサポートし、潜在的な問題を特定できます。



最初のコンプライアンス監査



リスク計画と脅威の特定



品質の計画とマネジメント



受入基準とユーザー・ストーリーの実現




ユーザー・ストーリー・マッピングからコンプライアンス目標へ



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

83

報告およびガバナンス・プロセスの支援






© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

84




レッスン3

プロジェクト・ガバナンス・フレームワークとの整合性



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

意思決定とエスカレーションの促進




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

コンプライアンスと可監査性のサポート

プロジェクトをできるだけ簡単にレビューできるようにします。

- 内部の方針、標準、および監査要求事項に従います。
- 重要な決定事項と文書のトレーサビリティを確保するのに役立ちます。
- 監査やプロジェクト後のレビューの準備として、記録を完全かつ整理された状態で保管します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン3

透明性のある積極的なコミュニケーション

プロジェクトをできるだけ簡単にレビューできるようにします。

- 信頼できる一貫性のある最新情報を共有します。
- 積極的にリスク、差異、リカバリー計画を伝えます。
- ダッシュボード、スコアカード、視覚化などのツールを使用して、パフォーマンスの傾向を強調します。

プロジェクトのパフォーマンスは、常に可視化する必要があります。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

ステークホルダーのガバナンス活動への関与を促進する

プロジェクト文書を最新の状態を保ちアクセス可能にするなど、以下を含みます。



ガバナンス会議と段階ゲート・レビューをスケジュールし、円滑に進めます。



ステークホルダーの積極的な参加とフィードバックを奨励します。



必要に応じてガバナンス・チェックポイントを使用し、スコープ、資源、または時系列を再調整します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

コンプライアンス違反の因果関係の分析

コンプライアンス・ニーズに対応するために必要なアプローチとアクションの特定

ECO 3.2.5、3.2.6



レッスン3

継続的なコンプライアンス・チェック

プロジェクト・マネジャーは、プロジェクトで法律上、規制上、契約上の義務を遵守できるようガイドラインに従ってください。

継続的なコンプライアンス・チェック

法律上、規制上、契約上のコンプライアンスを検証するために、プロジェクトのさまざまな段階でコンプライアンス・チェックを行ってください。

コンプライアンスのための早期計画

プロジェクト計画策定時に、プロジェクト・マネジャーは次のことを行ってください。

- コンプライアンス要求事項を特定します。
- コンプライアンス違反のリスクと代償を分析します。
- それらに対処するための戦略を立てます。

実行中の監視

プロジェクトの進行に伴い、以下を行います。

- マイルストーンで品質チェックを実施します。
- 内部監査を実施します。
- コンプライアンス関連のアクティビティを追跡し、管理します。
- 成果物の妥当性確認を行い、コンプライアンスの不一致を検出します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

コンプライアンス違反のコスト

法律上、規制上、契約上の義務に違反すると、プロジェクトやビジネスにコストが生じる可能性があります。



成果物の手直し



金銭的ペナルティー
または収益の損失



プロジェクト・スケジュールの乱れ



法的措置



世間からの否定的な注目



信頼の喪失



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

コンプライアンスの管理が最優先

成果物のテストと妥当性確認を行います（継続的に、そしてプロジェクトまたはフェーズの終了時に）。

承認権限を持つステークホルダーを特定します。

以下を回避するために、コンプライアンスの問題を是正します。

- タイムラインへの悪影響
- コスト超過
- リスクの増大

以下はコンプライアンスの承認を得ることのメリットです。

- コンプライアンスに対する潜在的な脅威の早期警告
- 差異を把握し、アクションを起こす能力



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン3

プロジェクト・コンプライアンスの度合いの測定


ECO 3.2.7



プロジェクトのコンプライアンスの測定

プロジェクトのコンプライアンスを測定する方法は以下のとおりです。

- ステークホルダー（スポンサー、プロジェクトマネジメント・オフィスなど）を関与させてニーズとメトリックを定義
- コンプライアンスに関する主要な連絡先（法務チーム、コンプライアンス・チームなど）を特定
- プロジェクト・ガバナンスへの準拠を監視
- コンプライアンス要求事項をチームと目に見える形で共有
- ミーティングやレトロスペクティブ（振り返り）でコンプライアンスについて議論
- 必要に応じて監査やテストを実施



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. This material is being provided as part of a PMI course.

プロジェクトのコンプライアンスを測定するためのアプローチ

これらのアプローチを使用して、コンプライアンスを監視します。



予測型

- 全体的な進捗
- プロジェクト・アクティビティ
- 成果物のステータス
- リスク報告書



適応型

- リリース・ロードマップ
- カンバン・ボード
- 累積フロー図
- リスク・バーンダウン・チャート



その他

- テストと妥当性確認のアクティビティ
- 監査と検査
- 承認と妥当性確認



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン3

インタラクティブ・アクティビティ



「コンプライアンスについて話しましょう」。

- 貴社には品質方針がありますか？
- プロジェクトの品質方針や標準をどこで確認できるか知っていますか？
- どのようなコンプライアンス活動に関わっていますか？



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン3終了



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.



Learning

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・
プロフェッショナル(PMP)®試験準備コース

プロジェクトマネジメント 計画書の策定ー統合、 資源、財務

レッスン4



Learning

レッスン4

PMP®

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・プロフェッショナル (PMP)®試験準備コース

基礎

レッスン1

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.



レッスンの概要

成功するプロジェクトはすべて、強固な基盤から始まります。これを、以降のすべての設計図を構築するようなものだと考えてください。

- はじめに
- 基礎



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.



PMP®

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・プロフェッショナル (PMP)®試験準備コース

はじめに

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.



レッスン4

ようこそ

PMI®認定 PMP®試験準備コースにご参加いただきありがとうございます。


認定プロジェクトマネジメント・アソシエイト(CAPM)®資格を当機関で取得された方は、再度ご利用いただきありがとうございます。

別のプロジェクトマネジメントのバックグラウンド、資格、または職務経験をお持ちの方は、PMIの学習コミュニティへのご参加を歓迎いたします。

私たちは、50年以上にわたるピア・トゥ・ピア学習と会員制度の歴史を誇りに思うとともに、プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル(PMP)®資格認定試験の準備に取り組む皆様のご健闘をお祈りします。



インストラクター



学習トピック



このトレーニングの学習トピックは、PMP®資格認定試験のコンテンツ概要から直接抜粋されています。試験内容の概要は、PMP®試験の基礎となるものです。

関連する試験内容の概要は、各トピックの最初に参考として記載されています。

試験内容の概要は、PMP®資格認定を保有し、多様な業界で働く、世界中から選ばれたPMI会員によって作成されました。これには、経験や幅広いビジネス概念など、仕事をする上で受験者が知っておくべきことが含まれています。



レッスン4

ビジネス文書

- プロジェクト開始前に作成されます(通常はビジネスアナリストまたは主要なプロジェクト・ステークホルダーが作成します)。
- プロジェクトの目標とビジネス目標への貢献に関する情報を含みます。
- プロジェクトに必要な時間、資金、資源を投資する価値があるかどうかを企業が判断するのを支援します。

「ビジネス文書は定期的にレビューします。」



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

7

ビジネス・ケース



ポートフォリオ・コンポーネント、プログラム、またはプロジェクトによって提供されるベネフィットの妥当性を確立するために使用される、文書化された経済的な実行可能性調査。

ビジネス・ケース:プロジェクトを正当化し、範囲を明確化

- コスト・ベネフィット分析
- ビジネス・ニーズ
- 品質仕様書
- スケジュールやコストの制約条件

「ビジネス・ケースの承認は通常、プロジェクト憲章の作成につながります。」



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

8

ベネフィット・マネジメント計画書



プログラムやプロジェクトから得られるベネフィットを創出し、最大化し、持続するためのプロセスを定義した記述書。

ベネフィット・マネジメント計画書に含まれる内容は以下の通りです。

- プロジェクト・ベネフィットを創出し、最大化し、維持するためのプロセス
- 短期的および長期的な成果価値の実現のためのタイムフレーム
- ベネフィット・オーナーまたは説明責任者
- メトリックス
- 前提条件、制約条件、リスク

「これはビジネス文書であり、プロジェクトマネジメント計画書の一部ではありません。」




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

9

レッスン4

複雑さの評価:ステイシー複雑性モデル




Stacey, R. D. (1996). *Strategic management and organisational dynamics: The challenge of complexity*. London: Pitman Publishing.



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

複雑さの評価:ステイシー複雑性モデル



Stacey, R. D. (1996). *Strategic management and organisational dynamics: The challenge of complexity*. London: Pitman Publishing.



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

アプローチがどのように、そしてなぜ異なるのかを理解する

- ・ 価値に対する認識の変化(例:持続可能性、顧客中心性)
- ・ ダイナミックかつ永続的なグローバルな変化
- ・ 複雑さとリスクの増大
- ・ 革新とダイナミックさが必要



「どのプロジェクトマネジメント・アプローチを使用していますか？」
「優先的に使用するアプローチはありますか？」



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. 12
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン4

テーラリングされた開発アプローチ

- ・ダイナミックな作業環境をサポートします。
- ・価値提供に関する要求事項を早期に特定します。
- ・ステークホルダーとチームを緊密な連携関係に置きます。

利点:

- ・より優れたフィーチャーやクエパビリティ評価を提供します(継続的改善と品質)。
- ・変更に対する組織の許容度を改善します。

❗ 「サーバント・リーダーはプロジェクトに影響を与え、組織に異なる考え方を促します。」



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

13

プロジェクトマネジメント開発アプローチ

アプローチ	特性	要求事項の確実性	変更とリスク
予測型アプローチ	開発アプローチのひとつ。プロジェクト・スコープ、期間、コストをライフサイクルの初期フェーズで決定します。	最初から高い	・変更は可能だが、コントロールされる ・リスクを慎重に調査し、マネジメントされる
適応型アプローチ	要求事項の不確かさや変動性が高く、プロジェクト期間を通じて変更される可能性が高い開発アプローチです。	不明確、または顧客主導であるため、さらなる発見が必要です。	・大幅な変更があるという前提に基づいて構築される ・リスク・マネジメントのガードレール(安全策)を伴う高いリスク許容度
ハイブリッド・アプローチ	これらの要素を組み合わせた、テーラリングされた開発アプローチ		



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.


14

プロジェクトとプロダクト

プロダクトはプロジェクトの一部であり、プロダクトには独自のライフサイクルがあります。

プロジェクトマネジメントは、プログラムおよびプロジェクトマネジメントの重要な統合点を表しています。

プロダクト・オーナーは、プロダクトの価値を最大化し、最終プロダクトの責任を負う担当者です。



❗ 「なぜプロジェクトにはプロジェクト・マネジャーとプロダクト・オーナーの両方がいることが多いのか、説明できますか？」




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

15

レッスン4

ライフサイクルと開発アプローチ




PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

16

予測型ライフサイクル:例




PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

17

適応型ライフサイクル:例




PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

18

レッスン4

適応型開発アプローチ



「ケイデンスは、スプリント/イテレーション、または継続的フローでタイムボックス化できます。」



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. This material is being provided as part of a PMI course.

19

開発アプローチとライフサイクル用語のクイズ

- 成果物
- 開発アプローチ
- フェーズ
- ライフサイクル

プロジェクト・プロフェッショナルは、予測型、反復型、漸進型、適応型、またはハイブリッドの **開発アプローチ** または方法を使用して、ユニークで検証可能なプロダクト、所産、またはサービスを実行するケーパビリティである **成果物** を創出し、進化させます。

プロジェクトは開始から完了まで、**フェーズ** と呼ばれる一連の論理的に関連したアクティビティを通過します。この一連のプロセスを **ライフサイクル** と呼びます。

プロセス、フェーズ、またはプロジェクトを完了するには、**成果物** の受け入れが必要です。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. This material is being provided as part of a PMI course.

20

ハイブリッド型のライフサイクルと開発アプローチ



- テーラリングによって達成
- 適応型と予測型のライフサイクルや開発アプローチの組み合わせ
- 要求事項が不確実である場合やリスクがある場合に有用
- 成果物をモジュール化できる場合、あるいは異なるプロジェクト・チームが開発できる場合に有用
- 反復型と漸進型の開発アプローチを使用



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. This material is being provided as part of a PMI course.

21

レッスン4

ハイブリッド・プロジェクト・アプローチ:例



- 予測型フレームワーク内でアジャイルまたは反復型の実務慣行を使用
- 適応型ライフサイクル内で予測型の作成物やプロセスを使用
- ビジネスアナリシス技法により、要求マネジメントを支援
- 新しいAIツールを、プロジェクトにおける複雑な要素の特定に役立てる
- 組織の変更マネジメント手法により、プロジェクトのアウトプットを組織に移行させるための準備を整える



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

22

テーラリングできるもの



- プロジェクト・ライフサイクル
- 開発ライフサイクルのコンポーネント
- 作業の進め方
- 知識マネジメント
- 変更マネジメント
- プロジェクト・ガバナンス
- ベネフィット・マネジメント



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

23

開発アプローチ:ガイダンスと質問

- 成果物の種類と開発アプローチは、プロジェクトのデリバリーの回数とケイデンスに影響を与えます。
- 開発アプローチと望まれるデリバリー・ケイデンスによって、プロジェクトのライフサイクルとそのフェーズが決定されます。
- 計画外の作業はどれくらいありますか？
- チームはどのように作業することを好みますか？
- 自分たちの作業に適したケイデンスはどのようなものですか？
- 顧客は何を望んでいますか？増分価値の提供は、顧客にとって本当に重要なのでしょうか？
- スケジュールはどうなっていますか？より着実で構造的なアプローチを望むのか、それともより速いペースを望むのでしょうか？
- リスク選好の特徴は何ですか？
- スプリントは役に立ちますか？



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

24

レッスン4

クリティカル情報の要求を判断する
プロジェクト実行戦略を推奨する

ECO 2.1.3および2.1.4



要求事項から始める

⑨「このようなプロジェクトは要求事項から始まるのでしょうか？」



はい

予測型プロジェクトでは、要求事項はプロジェクトの開始時に引き出され、設定されます。



ある程度

ユーザー・ストーリーは、
要求事項プロセスに対す
る異なる考え方です。



多分

ハイブリッド・プロジェクトでは、要求事項の引出しと調整、または“ユーザー・ストーリー”の作成が行われます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. 26
This material is being provided as part of a PMI course.

要求事項:これらは何を指し、なぜ必要なのでしょう？

要求とは、条件やケーパビリティに関する測定可能な単一のステートメントです。プロダクト、サービス、所産がどのようにビジネス・ニーズを満たすかを示します。



使用ガイドライン:

- ・「詳細を提供する前に、概要から始めるべきです。」
- ・「曖昧さがなく(測定可能かつテスト可能)、追跡可能で、完全で、一貫性があり、主要ステークホルダーに受け入れられるものでなければなりません。」



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン4

要求事項の文書化

- 簡単な形式(例:ステークホルダーと優先順位によって分類された、すべての要求事項をリストアップした文書)、または
- より詳細なもの(例:エグゼクティブ・サマリー、詳細な説明、添付文書)
- 要求事項トレーサビリティ・マトリックス



Requirements Traceability Matrix									
Requirement ID		Requirement Description		Source	Priority	Status	Owner	Created	Updated
R001	1.1.1	The system shall allow users to login.		User Story	High	Approved	John Doe	2023-01-01	2023-01-01
R002	1.1.2	The system shall allow users to register.		User Story	High	Approved	John Doe	2023-01-01	2023-01-01
R003	1.1.3	The system shall allow users to reset their password.		User Story	Medium	Approved	John Doe	2023-01-01	2023-01-01
R004	1.1.4	The system shall allow users to change their email address.		User Story	Medium	Approved	John Doe	2023-01-01	2023-01-01
R005	1.1.5	The system shall allow users to delete their account.		User Story	Low	Approved	John Doe	2023-01-01	2023-01-01
R006	1.1.6	The system shall allow users to view their account information.		User Story	Low	Approved	John Doe	2023-01-01	2023-01-01
R007	1.1.7	The system shall allow users to view their account information.		User Story	Low	Approved	John Doe	2023-01-01	2023-01-01
R008	1.1.8	The system shall allow users to view their account information.		User Story	Low	Approved	John Doe	2023-01-01	2023-01-01
R009	1.1.9	The system shall allow users to view their account information.		User Story	Low	Approved	John Doe	2023-01-01	2023-01-01
R010	1.1.10	The system shall allow users to view their account information.		User Story	Low	Approved	John Doe	2023-01-01	2023-01-01



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

要求事項マネジメント計画書

- コンフィギュレーション・マネジメント・アクティビティ:
 - バージョン管理ルール
 - 影響度分析—トレーシング、追跡調査、報告
- 変更承認に必要な認可レベル
- 優先順位付けの基準とプロセス
- プロダクトのメトリックスと付随する根拠
- 要求事項属性を含むトレーサビリティ構造



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

要求事項のタイプ

タイプ	概要
プロジェクト	プロジェクトが満たさなければならないアクション、プロセス、条件
プロダクト	ビジネス要求事項とステークホルダー要求事項を満たす、プロダクト、サービス、または所産のフィーチャーと特性 • 機能—プロダクトのフィーチャー • 非機能—プロダクトの有効性を高める補足的な環境条件/品質
品質	プロジェクトの成果物の完成またはその他のプロジェクトの要求事項の達成を検証するために必要な条件または基準
ビジネス	組織のより高次のニーズ、プロジェクトの理由
ステークホルダー	ステークホルダー(またはステークホルダー・グループ)のニーズ(報告要求事項とも呼ばれます)
移管/準備	望ましい将来の状態へと確実に移管するために必要な一時的なカーナビリティ



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン4

要求事項の収集プロセス

- 専門家の判断
 - 対人関係/チームのスキル
 - ノミナル・グループ技法
 - 観察
 - ファシリテーション
 - データ収集
 - プレーンストーミング
 - インタビュー
 - フォーカス・グループ
 - アンケートと調査
 - ベンチマーキング
- データ分析
 - 文書分析
 - 代替案分析
 - プロダクト分析(成果物がプロダクトの場合)
 - 意思決定技法
 - 投票
 - 多基準意思決定分析
 - データ表現
 - マインド・マップ法
 - 親和性ダイアグラム
 - コンテキスト図またはユースケース図
 - プロトタイピング(ストーリーボードなど)



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

31

定義:プロセスの比較



要求事項の収集プロセス

プロジェクトの目標を達成するために、ステークホルダーのニーズと要求事項を決定し、文書化し、管理するプロセスです。



要求事項文書

プロジェクトのビジネス・ニーズを個々の要求事項がどのように満たすかを記述したものです。



ユーザー・ストーリー

特定のユーザーにとっての成果を簡潔に記述したもので、詳細を明確にするための会話の約束です。




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

32

戦略的マネジメントの要素とフレームワーク



一部のアジャイル・プロジェクトでは、目標と主要な所産(OKR)などの目標設定フレームワークを使用し、組織の目標と望ましい主要な所産を記述します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

33

レッスン4

統合プロジェクトマネジメント計画書の作成

統合プロジェクトマネジメント計画書の管理

プロジェクトに関する判断を
十分な情報に基づいて下せるように、
データの収集と分析を行う

ECO 2.1.5、2.1.8、および2.1.9



計画はプロジェクトマネジメント計画書から始まります

プロジェクトの実行、監視・コントロール、終結の
方法を記述した文書です。
これには以下が含まれます。

- 補助計画書
- ベースライン
- 追加コンポーネント



プロジェクト・マネジャーは以下を行
えるようになります。

- 実行
- 監視・コントロール
- 閉じる
- コントロールを維持するための
ガードレール(安全策)を設けます。
そうすることで...
- チームは作業の進め方を調整し、
迅速かつ柔軟に行動できるよう
になります。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

ライフサイクル全体の計画を策定する

	予測型	ハイブリッド	適応型
要求事項仕様書	開発前に具体的な条件で定義 される	引渡し中に定期的に詳細化さ れる	引渡し中に頻繁に詳細化される
成果	プロジェクトの終了時に引渡し される	複数のピースに分割可能(増分)	ステークホルダーが望む価値に 応じて、各イテレーションの後に 引渡しされる
変更	可能な限り制約される	定期的な間隔で組み込まれる	引渡し中にリアルタイムで組み込 まれる
ステークホルダーの 関与	特定のマイルストーンで	定期的	継続的に
リスクとコストのコン トロール	大半が既知の考慮事項の詳細な 計画を通じて	計画の段階的詳細化を通じて	要求事項と制約条件が明らかにな ったときに行う



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン4

プロジェクトマネジメント計画書のコンポーネント

補助マネジメント計画書

- スコープ・マネジメント計画書
- 要求事項管理計画書
- スケジュール・マネジメント計画書
- 財務マネジメント計画書
- 品質マネジメント計画書
- 資源マネジメント計画書
- コミュニケーション・マネジメント計画書
- リスク・マネジメント計画書
- 調達マネジメント計画書
- ステークホルダー・エンゲージメント計画書

ベースライン

- スコープ・ベースライン
- スケジュール・ベースライン
- コスト・ベースライン

追加コンポーネント

- 変更マネジメント計画書
- コンフィギュレーション・マネジメント計画書
- パフォーマンス測定ベースライン
- プロジェクトライフサイクル
- 開発アプローチ
- マネジメント・レビュー



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

37

プロジェクト文書



プロジェクト文書

プロジェクトを支援するために準備される文書。例えば、要求事項、仕様書、ベンダーとの契約書、設計文書、テスト計画書、最終プロダクトとともにクライアントに納品される出版物などがあります。

一部の文書はプロジェクト文書類であり、維持管理を行い、プロジェクトの終了時にアーカイブする必要があります。



「それらはプロジェクトマネジメント計画書のコンポーネントではありません。」



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

38

プロジェクト文書

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| ☐ 見積りの根拠 | ☐ 物的資源割り当て | ☐ 要求事項トレーサビリティ・マトリックス |
| ☐ アクティビティ属性 | ☐ プロジェクト・カレンダー | ☐ 資源ブレークダウン・ストラクチャ |
| ☐ アクティビティ・リスト | ☐ プロジェクト伝達事項 | ☐ 資源カレンダー |
| ☐ 前提条件ログ | ☐ プロジェクトスケジュール | ☐ 資源要求事項 |
| ☐ 変更ログ | ☐ プロジェクトスケジュールネットワーク図 | ☐ リスク登録簿 |
| ☐ コスト見積り | ☐ プロジェクト・スコープ記述書 | ☐ リスク報告書 |
| ☐ コスト予測 | ☐ プロジェクト・チームの任命 | ☐ スケジュール・データ |
| ☐ 所要期間見積り | ☐ 品質コントロール測定結果 | ☐ スケジュール予測 |
| ☐ 課題ログ | ☐ 品質メトリックス | ☐ ステークホルダー登録簿 |
| ☐ 教訓登録簿 | ☐ 品質報告書 | ☐ チーム憲章 |
| ☐ マイルストーンリスト | ☐ 要求事項文書 | ☐ テスト・評価文書 |



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

39

レッスン4

作業工数と資源要求事項の見積り

ECO 2.1.6



資源: 人員と設備



- ・ 社内の人的資源 (HR) に価値を見出し、権限を与えます。
- ・ 外部ソースを活用して、可能な限り最高のチームと設備を確保しましょう。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. This material is being provided as part of a PMI course.

資源マネジメント計画書



- ・ **資源の特定**—人員と設備
- ・ **人員と設備を獲得する方法**
- ・ **人員の役割と責任**
 - ・ 役割—プロジェクトにおける個人の職務
 - ・ 権限—資源を使用し、意思決定を行い、成果物を受諾する権利
 - ・ 責任—割り当てられた職務
 - ・ 必要なコンピテンシーとスキル
- ・ **プロジェクト組織図**—資源カテゴリーと報告関係を図示したもの
- ・ **プロジェクト・チームの資源マネジメント**—資源の定義、選択、マネジメント、リリースの方法に関するガイダンス
- ・ **トレーニング**—戦略と要件
- ・ **チーム育成方法**
- ・ **資源コントロール**—必要に応じて非人的な資源の可用性を確保するための手法
- ・ **表彰計画**



資源マネジメント計画書
プロジェクト資源の獲得、割当て、監視、およびコントロールの方法を記述したプロジェクトマネジメント計画書のコンポーネント。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン4

統合プロジェクト計画書における依存関係、ギャップ、継続的事業価値の評価

ECO 2.1.7



事業価値

- ・ 事業価値とは、事業活動から得られる、有形、無形、またはその両方でありうる定量化可能な正味のベネフィットのことです。
- ・ 開始時合意事項におけるプロジェクトの目標または説明の一部です。
- ・ ベネフィットの実現は、事業価値の表明に基づいています。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

事業価値の検証

ステークホルダーとコミュニケーションを取り、調査を行い、専門知識を活用します。

何が価値があるか、あるいは何が価値となりうるのかを正確に判断するために、調査、評価、確認を行います。

具体的に見てみましょう。

- ・株主価値(上場企業の場合)または事業成長(非上場企業の場合)
- ・顧客価値
- ・従業員の知識
- ・チャネルまたはビジネス・パートナーの価値



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン4

事業価値のタイプ



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

資源の計画と マネジメント

ECOタスク2.4



資源の割り当てと責任の分担

- ・ チーム・メンバーをプロジェクトに割り当てます。
 - ・ 役割と責任を決定します。
 - ・ プロジェクト・チーム名簿、プロジェクト組織図、およびスケジュールを作成します。
- ① 「プロジェクト・スケジュール、資源割り当て、予算はすべて相互に関連しており、同時に作成することができます。」
- ・ チーム、ニーズ、およびプロジェクト・アプローチに応じて責任を調整します。
 - ・ 技術的スキルとソフトスキルを考慮します。
 - 経験、知識、スキル
 - 態度
 - グローバルおよび地域の要因



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン4

資源カレンダーを使用する



- 計画されたアクティビティ期間中の資源の可用性(人員、設備、資材、など)を文書化します。
- プロジェクト・アクティビティの見積りや依存関係を理解する際に使用します。
- 特定したチームと物的資源が、プロジェクト期間中にいつ、どのくらいの期間利用可能になるかを明記します。
- プロジェクトを通して段階的に詳細化し、更新していきます。

① 「資源カレンダーは、あらゆる種類のプロジェクトで使用できます。」



資源カレンダー

特定の資源を利用できる作業日とシフトを示すカレンダーです。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

責任分担ツールと技法



責任分担マトリクスまたは RACI(実行責任、説明責任、相談対応、情報提供)マトリクス

- 資源またはステークホルダーに割り当てられた説明責任のタイプを指定
- 情報の可視性を確保

組織

「チーム・メンバー」

- タスクを完了させるため、または成果物を創出するために作業を行う
- すべてのタスクには少なくとも1人の担当者が続く

責任

「チーム内(リーダーシップ/マネジメント)」

- プロジェクトに関連する作業を委任し、確認を行う
- 担当者やチームがプロジェクトへの期待を把握し、スケジュール通りに作業を完了できるようにする
- 各タスクには責任者が1人だけ続く

情報対応

「ステークホルダー」

- プロジェクト作業に関するインプットとフィードバックを提供
- すべてのタスクやマイルストーンに相談対応者が必要なわけではない



「すべてのステークホルダーを考慮するものの、必要なインプットのみを求める」

情報提供

「通常はプロジェクトの意思決定者ではない」

- 各自の業務が影響を受ける可能性があるため、プロジェクトの進捗状況についての情報提供は必要であるものの、詳細は必要ない



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

発注先選定基準



自分のプロジェクトの価値観、スキル、特性と一致する外部リソースと連携します。

- 全体コストまたはライフサイクル・コスト
- ニーズの理解
- 技術的キャパビリティ
- マネジメント・アプローチ
- 技術的アプローチ
- 保証
- 資金力
- 生産能力と意欲
- ビジネスの規模と種類
- 納入者の過去の実績
- 参考文献
- 知的財産権
- 所有権



発注先選定基準

購入者が望み、納入者が契約の対象に選ばれるために満たすか上回ることを要求される一群の属性です。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン4

計画における適応力と回復力

ローリング・ウェーブ計画法

作業パッケージ、計画中のパッケージ、およびリリース計画に適用される、段階的詳細化の一形態です。適応型アプローチや予測型アプローチで使用できます。

ローリング・ウェーブ計画法


反復計画方法の一つ。早期に完了しなければならない作業は詳細に、将来の作業はより概要レベルで計画します。

段階の詳細化

入手可能な情報が増え、より正確な見積りが可能になるにつれて、プロジェクトマネジメント計画書の詳細レベルを高めていく反復プロセスです。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course



レッスン4

予算計画:概要



考慮する:

- コストだけでなく価値も
- 予算とコストに対する組織とステークホルダーの姿勢

プロジェクト・ライフサイクルに従って予算を作成します。



固定予算で開始し、変更管理プロセスを通じて修正します。



ハイブリッド・アプローチにより、確実性に関する適応力が高まります。

「バーン・レート」の使用



アジャイル・チームは、ステークホルダーのパートナーや財務のステークホルダーと協力して、漸進的な予算編成アプローチを提案します。

バーン・レート



プロジェクトが財務資源を消費する割合で、マイナスのキャッシュフローを表します。バーン・レートは、アジャイルプロジェクトにおいて、計画されたイテレーション、スプリント、または増分のコストを予算化するために使用されることが多くあります。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

55

予測型予算計画



- 財務マネジメント計画書を作成します。
- 見積り技法を用いてアクティビティにコストを割り当てます。
- コスト・ベースラインをテラーリングします。
 - プロジェクト全体のコスト・パフォーマンスを監視および測定するために使用
 - 特定されたリスクに対処するための予備予算を含む
 - 正式な変更管理手順でのみ変更可能

完成時総予算 (BAC) は、コスト・ベースラインの最も高い点です。BACは、確定したすべての予算の合計、または計画された作業の総価値です。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

56

予測型予算計画の用語



財務マネジメント計画書

プロジェクトマネジメント計画書またはプログラムマネジメント計画書の構成要素のひとつ。コストの計画、構成、コントロールの方法を記述します。



コスト・ベースライン

時間軸ベースでのプロジェクト予算の承認された版で、マネジメント予備を除いたもの。正式な変更管理手順を経た変更が可能で、実際の結果に対して比較基準として使用されます。



完成時総予算 (BAC)

遂行する作業に対して設定されたすべての予算の合計。




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

57

レッスン4

資金限度額による調整

- 計画されたプロジェクトの支出と資金限度額を比較します。
- 作業と支出をスケジュールに合わせて調整し、支出のペースを均一化します。



PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

過去のデータ: 既知のものから始める

- 教訓リポジトリで、過去の類似プロジェクトの予算や見積り、または直近のイテレーションのデータを確認します。
- 成功例だけでなく失敗例も含め、コスト見積りに役立つ情報を探します。
- 類似の状況に基づき、類推および見積り技法を使用します。



PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

資源コスト

予測型

- プロジェクトのニーズと資源属性(可用性、経験、知識/スキル、態度)を照合します。
- 平均レートに基づいて初期見積りを作成します。
- 必要に応じて修正します。

アジャイル

- 混合レートを割り当てます。
- プランニング・ポーカーまたは親和図を使用してポイント(作業工数)を見積り、チームのベロシティに基づいて完了できるユーザーストーリーの数を見つめます。
- 簡単な計算式を使用して、ポイントあたりのコストを見積ります。
 - $\Sigma(\text{期間}n\text{のチーム積算給与額}) \div \text{期間}n\text{で完了するポイント数}$
- 計算式を使用して、予算を見積ります。
 - $(1\text{ポイントあたりのコスト} \times \text{完了する項目の総ポイント値}) + \text{その他の費用} = \text{予測予算}$

PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン4

コスト見積り



プロジェクトにおける各アクティビティまたはワーク・パッケージのコストを見積ります。

コスト見積りには、以下を含める必要があります。

- 直接労働
- 資材
- 装置
- 施設
- サービス
- 情報技術
- **コンティンジェンシー予備**

使用:

- 超概算見積り (ROM) (-25~+75%)
- 確定見積り (-5~+10%)
- 段階的見積り



スコープの変更が予測されますか？

概算レベルの見積りには、軽量見積り方法を使用します。



コンティンジェンシー予備

既知のリスクに対する実効的な対応戦略のために、スケジュールまたはコスト・ベースラインに割り当てられた時間または資金。

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

プロジェクト予算

- ボトムアップ・アプローチを使用して、アクティビティのコスト、ワーク・パッケージのコスト、およびコスト・ベースラインを集計します。
- リスク・マネジメントをサポートするためにコンティンジェンシーを含めます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.


リスクとコンティンジェンシー の財務配分の定量化

ECO 2.6.2



レッスン4

リスクとコンティンジェンシーの財務配分を適切に評価する



PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

64

リスク・マネジメントにおけるコンティンジェンシー予備



既知の未知のリスクに
対処するために使用



コスト・ベースラインに
組み込まれる



プロジェクトの進行
に合わせて調整

PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

65

適応型プロジェクトとコンティンジェンシー予備資金

適応型またはアジャイル環境では以下のとおりです。

- コンティンジェンシー予備資金は、よりダイナミックに使用されます。
- スコープやリスクの変化に応じて、頻繁に調整する必要があります。
- 新たな不確実性への迅速な対応を支援します。



PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

66

レッスン4

コンティンジェンシー予備の見積り



パーセンテージ、固定額、または定量的手法の結果で表わされる



個々のタスクからプロジェクト全体まで、あらゆるレベルで割り当てられる



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

67

不確実性により生じる手直し: 例

手直しが予想されます。

- 原因としては設計変更や品質に関する問題が挙げられる
- 必要な作業工数とコストが不明

コンティンジェンシー予備を確保しておきます。

- 潜在的な手直しコストをカバー
- 予算の信頼性確保に役立つ
- 予期せぬコスト超過を防ぐ



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

68

コンティンジェンシー予備の管理・調整



より多くの情報が入手可能になるにつれて洗練される



使用、削減、または廃止される場合がある



明確な文書化が必要



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

69

レッスン4

適応型およびハイブリッド型の予算計画



- 長期的な視点よりも短期的な予算とメトリックスに重点を置きます。
- 作業の期間を設定し、その期間内で作業を優先順位付けします。
- その期間に使用される資源に基づいてコストを算出します。



例

- 現在のデータに加え、過去のデータや専門家の指導に基づく予測アルゴリズム(例: リーンまたはカンバン)に基づいて予算を見積りします。
- トップダウン・アプローチを使用し、プランニング・ボーカーや親和性グルーピングなどの概算レベルの見積り技法を、フィーチャー・セットに用います。次に、段階的詳細化とローリング・ウェーブ計画法を用いて、ジャストインタイム方式(反復的に)タスク・レベルまで掘り下げます。
- スプリント計画の間隔で予算を改訂します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

プロジェクト・ ライフサイクル全体の 支出追跡計画を立てる

ECO 2.6.3



支出追跡の計画を立てる

支出の追跡:

- プロジェクト計画中に開始
- プロジェクトの実施と終結を通じて継続
- ライフサイクルモデルによって異なる(予測型、反復型、ハイブリッド)

目的: コストを管理し、
情報に基づく意思決定を支援します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン4

予測型プロジェクト: 予算計画の鍵

予測型プロジェクト環境では、予算計画は構造化された詳細なアプローチに従います。

財務マネジメント計画書

コストの計画、追跡、コントロールの方法を定義するための計画を作成します。

コスト・ベースライン

時間の経過とともに承認される予算を設定し、実コストを測定するためのベースラインを確立します。

完成時総予算 (BAC)

プロジェクトのために定めたすべての予算の合計を算出します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

73

予測型プロジェクト: 支出追跡



コスト・ベースライン

コスト差異 (CV)



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

74

適応型プロジェクト: 反復型および漸進型の予算計画

適応型プロジェクトでは、予算計画は柔軟で、変化するニーズや成果に適応します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

75

レッスン4

適応型プロジェクト: 支出追跡

コストの計画と追跡(イテレーションごと)

変更に基づく予算の調整

資金調達の方法と柔軟性



PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

支出追跡における事業価値メトリックス

投資収益率(ROI)

正味現在価値(NPV)

内部収益率(IRR)

回収期間

便益費用率

計画したベネフィットの提供:
計画と実績の比較



PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

財務資源と制限が支出追跡に与える影響:1

支出の効果的な追跡には、すべての財源と制約条件を理解することが必要です。

資本支出 (CapEx)

- 有形資産の取得、アップグレード、または維持
- 不動産、建物、設備、技術をカバー
- 早期計画と主要マイルストーンとの連携

事業運営費 (OpEx)

- 日常業務に関連する継続的なコストをカバー
- 賃金、家賃、光熱費、事務管理費、広告費を含む
- 組織全体の財務パフォーマンスに影響を与える

PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン4

財務資源と制限が支出追跡に与える影響:2



資金の制約

予算の一部は、内部要員と外部要員など、特定の用途に割り当てられることがあります。



時間的制約のある割当て

予算は特定の期間(会計年度など)に結び付けられ、繰り越すことができない場合があります。



アジャイル予算の柔軟性

予算は四半期ごとに割り当てられ、完了した作業に基づいて調整されることがあります。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

79

支出追跡におけるパフォーマンスデータ

重要業績評価指標 (KPI)

目標と主要な所産 (OKR)



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

80

その他の支出追跡方法



コスト効率指数 (CPI)

管理限界値

アールド・バリュー (EV)

コスト見積り

費用便益分析



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

81

レッスン4

財務報告の計画を立てる

ECO 2.6.4



財務報告の計画を立てる

財務指標の収集は不可欠ですが、これらの指標をどのように活用するかも同様に重要です。

- 財務データがタイムリーで、アクセスしやすく、理解しやすいものになるよう支援します。
- 情報の不確実性を伝えます。
- ダッシュボードやチャートなどのビジュアルを活用して、迅速に洞察を得られるようサポートします。
- プロジェクトパフォーマンスを支援する財務情報の報告方法を計画します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

報告方法

効果的な財務報告は、プロジェクト全体を通じて、情報に基づく意思決定を支えます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン4

ビジュアル・コントロール:タスク・ボード

タスク・ボードは、計画された作業のステータスを示す視覚的なツールであり、何が起きているのかを誰もが一目で簡単に把握することができます。

- タスクを3つのステージ(未着手、進行中、完了)で表示します。
- チームがタスクのステータスや作業配分を把握するのを支援します。
- 色分けされたメモと点を使って、タスクの種類と期間を示します。
- 進行中のタスクを制限することで、フローベースの作業をサポートします。
- 作業が滞ったり、ボトルネックが発生したりしたときは、チームの「スウォーミング」を促します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

ビジュアル・コントロール:バーン・チャート

バーン・チャートはチームのペロシティ、つまり成果物の生成、妥当性確認、受入れの速度を示します。

バーンアップ・チャート

バーンダウン・チャート



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

その他の種類のチャート

視覚的なチャートには、次のような障害リストも含まれます。

- ・ 作業を阻害している要因の説明
- ・ 障害の重大度
- ・ 解決に向けて取られているアクション



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン4

今後の財務上の課題を予測する

ECO 2.6.5



今後の財務上の課題を予測する

脅威と好機を予測するには、それらの潜在的な因果関係を理解することから始まります。不確実性、曖昧さ、複雑さ、変動性に対処することで、次の点において強さを築くことができます。



状況を予測する



健全な意思決定を行う



効果的な計画を立てる



問題を能動的に解決する



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

予測

予測とは、現在の情報と知識に基づいて、将来の状態やイベントを見積もったり予想したりすることです。

予測アプローチの種類

定性的予測

専門家の判断と経験に依存

定量的予測

過去のデータと数理モデルを用いて、将来の成果を予測

因果関係/計量経済学的予測

将来のパフォーマンスに大きな影響を与える変数を特定(回帰分析などを通じて)



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン4

コスト・パフォーマンスの予測が重要な理由

予算の状況を評価する

プロジェクトが承認された予算と許容しきい値の範囲内にあるかどうかを判断します。

変更要求の必要性を特定する

予測コストがベースラインを超え、正式な予算改訂が必要となる状況をフラグで示します。

ステークホルダーとコミュニケーションをとる

ステークホルダーに情報を提供し、関与を維持するため、予測コストに関する透明性の高いデータ主導の最新情報を提供します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

**アード・バリュー・マネジメント
予測メトリックス**

残作業見積り(ETC)

完成時総コスト見積り(EAC)

完成時差異(VAC)



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

予測を支援する分析技法

プロジェクト・パフォーマンスを効果的にマネジメントするには、プロジェクトマネジメント計画書の進捗状況と逸脱度の両方を監視することが不可欠です。

傾向分析

差異分析



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン4

パフォーマンス・メトリックを使用して予測に役立てる


これらのメトリックスは、将来のコストを見積り、調整が必要な箇所を見つけ、資源に関するデータ主導の意思決定を支援するのに役立ちます。

ペロシティ	バーン・レート	スループット
チームが一定時間で完了する仕事量の尺度	予算に対する支出率を反映	一定期間のアウトプット量



データ・タイプのバランスを調整する

予測と履歴データのバランスを調整する



例外計画のマネジメント

例外計画は、予測値またはパフォーマンスが重要なしきい値を超えた場合に、明確な進め方を提示するものです。

- ・しきい値を超えた場合、または予測値がリスクを示す場合に発動される
- ・非公式（ステークホルダーとの話し合いなど）または公式（アクション・プランの文書化など）の場合がある
- ・課題の解決、計画の実施、効果の追跡に重点を置く



レッスン4

財務変動の監視と ガバナンス・プロセス との連携

ECO 2.6.6



財務変動の監視と ガバナンス・プロセスとの連携



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

プロジェクトの財務健全性をコントロールする



コストと財務変動
の監視



財務パフォーマンスの
予測と伝達



ガバナンス・フレーム
ワーク内での運用



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン4

財務変動の監視



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

100

ベースライン設定と予測

財務パフォーマンスを追跡するには、以下を行います。

- 計画時にコスト・ベースラインを確立します。
- アーンド・バリュー・マネジメント (EVM) を使用します。
 - コスト差異 (CV)
 - コスト効率指数 (CPI)



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

101

実コストを追跡する

- 実コストを予算と比較します。
- ダッシュボードと追跡ログを使用します。
- 会計システムと統合します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

102

レッスン4

差異を分析する

- ・コスト超過や節約を調査します。
- ・原因の特定：スコープ、遅延、見積り。
- ・カテゴリー分け：
 - ・内部対外部
 - ・コントロール可能対コントロール不可能



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. 103
This material is being provided as part of a PMI course

将来のパフォーマンスを予測する



完成時総コスト
見積り(EAC)を
使用します。



残作業見積り
(ETC)を使用
します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. 104
This material is being provided as part of a PMI course

透明性のあるコミュニケーションを行う



- 報告書をステークホルダーと共有します。



バーン・レート・チャートなどの図を使用します。



主要な差異をエスカレーションします。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. 105
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン4

ガバナンス・プロセスとの連携

ガバナンスにより以下を実現できます。

- ・ 戦略との整合性
- ・ 方針とコンプライアンスへの準拠
- ・ リスクの監視とコントロール



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. 100
This material is being provided as part of a PMI course

ガバナンス・フレームワークを理解する

ガバナンスの範囲内で運用するには、以下のことが必要です。

- ・ ガバナンスの方針と手続きを把握すること
- ・ 承認しきい値と報告書式を知ること
- ・ エスカレーション・パスを把握すること
- ・ 財務コントロールに準拠すること
- ・ 調達と監査の手続きに従うこと
- ・ 文書のトレーサビリティを確保し、バージョン管理を行うこと



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. 107
This material is being provided as part of a PMI course

ガバナンスにおける変更を管理する

コストまたはスコープに変更が生じた場合、以下を行います。

- ・コストまたはスコープ変更の正式な変更要求を提出します。
- ・価値、リスク、資金調達に基づいて要求を正当化します。
- ・ガバナンスの承認パスと整合を図ります。




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン4

予算に関する課題

- 新規または変更されたプロジェクトに対する要求事項
- 新しいリスク、または既存リスクの発生確率や影響範囲の変化
- コスト見積りの変更



PM Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

アーンド・バリュー・マネジメント

- スケジュールおよびコストのベースラインに基づき、計画されたパフォーマンスに対して実際のスケジュールとコストの進捗を比較し、プロジェクトの進捗を測定する
- スケジュールの進捗と予算の状況を評価する
- 予算の状況またはスケジュールの進捗が悪化するのを防止する




PM Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

アーンド・バリュー・マネジメント:例

変数

- PV プラント・バリュー**
スケジュールされた作業に割り当てられた認可予算
- EV アーンド・バリュー**
その作業に対して承認された予算で表される、遂行された作業の尺度
- AC 実コスト**
特定の期間においてアクティビティで実行された作業に対して発生した実現コスト



PM Learning


© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン4

スケジュール・コントロールを測定する

プロジェクトはスケジュールどおり進んでいますか？
スケジュール差異(SV)は、アーンド・バリュー(EV)と
プランド・バリュー(PV)の差を計算することで、パ
フォーマンスを測定


$$SV = EV - PV$$



チームはどの程度効率的に作業を進めていますか？

スケジュール効率指数(SPI)は、EVとPVの比率を計算することで効率性を測定

$$SPI = EV / PV$$



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.


112

コスト・コントロールを測定する

プロジェクトは予算どおりですか？

コスト差異(CV)を計算して、現在の予算の赤字額/黒字額を算出します。

$$CV = EV - AC$$




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

113

プロジェクトの効率性はどの程度ですか？

コスト効率指数(CPI)を計算して、予算化された資源のコスト効率を測定します。

$$CPI = EV / AC$$



完了時の尺度

プロジェクトのコストは合計でどのくらいですか？

完成時総コスト見積り(EAC)を使用

- 以下に基づきます。
- CPI: 現在の支出効率
 - BAC: 完成時総予算

計算式:

$$EAC = \frac{BAC}{CPI}$$



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

114

プロジェクトの残りの作業を完了するには、どれだけの追加コストが必要ですか？

残作業見積り(ETC)を使用

- 以下に基づきます。
- CPI
 - AC - 実コスト

計算式:

$$ETC = EAC - AC$$

レッスン4

適応型アプローチにおけるアード・バリュー・マネジメント

リリース計画書と実際に完了した作業の比較が可能

「アード・バリュー・マネジメントは、チームが問題点を見つけ、スケジュールどおりに予算内で作業を進められるよう支援します。」

プロセスの例:

1. パフォーマンス測定ベースラインを確立し、マトリックスの基準点を作成します。
2. 3つの質問に答えてください。
 - 計画されているイテレーションは何回ですか？
 - ストーリー・ポイントは全部でいくつありますか？
 - リリース予算はいくらですか？
3. 各イテレーション終了時にデータを収集します。
 - **ブランド・バリュー (PV)**: イテレーションで計画された作業の予算
 - **アード・バリュー (EV)**: イテレーションで完了した作業の予算
 - **実コスト (AC)**: イテレーションの成果物を完成させるためにかかった実コスト



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course. 115

財務予備のマネジメント

ECO 2.6.7



目標の逸脱による不確実性に対処する



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course. 117

レッスン4

財務予備の目的



コストとスケジュールのリスクに対するバッファーです。



不確実性の下でプロジェクト・パフォーマンスを維持します。



リスク対応の柔軟性を高めます。

財務予備の種類

コンティンジェンシー予備:

- 既知の未知への対処
- コスト・ベースラインに組み込まれる

マネジメント予備:

- 未知の未知への対処
- コスト・ベースラインから除外



財務予備の見積りと割当て



リスク分析ツールを使用します。
• リスク登録簿
• 発生確率・影響度マトリックス



予備額をリスク・エクスポージャーにリンクさせます。



プロジェクトのステージとリスクの傾向に基づいて更新します。



レッスン4

財務予備の監視とコントロール



実際のリスクに対する使用状況を監視します。



リスクが顕在化したり解消されたりしたら、予備を調整します。



更新されたリスク・プロファイルに合わせて予備レベルを調整します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

121

ステークホルダーとコミュニケーションをとる



財務予備の目的とその使用に関する制限について説明します。



予備の状況を透明性をもって報告します。



ステークホルダーから信頼と支持を得ます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

122

レッスン4終了



レッスン4





Learning

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・
プロフェッショナル(PMP)®試験準備コース

調達、品質、 スケジューリング

レッスン5



Learning

レッスン5







レッスン5

調達計画

ECO 2.5.1



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

調達戦略の計画

- ・ 前条件となる組織のプロセス資産 (OPA)
- ・ 獲得方法
- ・ 契約タイプ
- ・ 調達フェーズ
- ・ 組織の財務部門または調達部門と連携します。
- ・ 新規ベンダーを要求する前に、事前承認済みのベンダーを使用します。
- ・ 署名者ごとの購入上限を守ります。すなわち、ある一定の金額を超える契約には、複数の署名者が必要です。
- ・ 定義された入札プロセスとテンプレートを使用します。
- ・ 一定のしきい値を超える契約については、提案依頼書 (RFP) の提出を義務付けます。
- ・ 支出限度額の承認については、エスケーション手順に従います。
- ・ 契約に定められた時期に支払います。例えば、作業完了時やプロジェクト終了時など、支払条件が「純額払い」の場合です。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

調達マネジメント 計画書の実行

ECO 2.5.2



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

レッスン5

調達マネジメント計画書



- 使用される契約の種類を指定します。
- 入札の取得と評価のプロセスを説明します。
- 標準化された**調達文書を義務付けます。**
- プロバイダーのマネジメント方法を説明します。



「組織の調達部門は、この計画書の作成に関与します。彼らと緊密に連携し、適切な調達文書を使用して問題を回避します。」



調達マネジメント計画書

プロジェクトマネジメント計画書またはプログラムマネジメント計画書の構成要素の一つ。プロジェクト・チームが母体組織以外から物品やサービスを獲得する方法を記述します。



調達文書

合意の締結、実行、終了に使用されるすべての文書です。これには、プロジェクト以前の文書も含まれることがあります。この文書には、調達プロセスの管理に関するすべての補助記録が含まれます。



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

調達文書：入札およびプロポーザルアクティビティ

- **作業範囲記述書(SOW)**：要求される作業の詳細
- **見積り依頼書(RFQ)**：入札/応札または見積り(コストのみ)
- **入札招請書(IFB)**：購入者が仕事への関心表明を要求します
- **情報提供依頼書(RFI: Request For Information)**：購入者が売り手からより多くの情報を要求します
- **提案依頼書(RFP)**：購入者発行の作業範囲記述書が必要
- **関心表明(EOI)**：売り手が発行する作業への関心表明



作業範囲記述書(SOW)

プロジェクトが提供するプロダクト、サービス、所産についての物語風説明。



提案依頼書(RFP)

提案依頼書は、バイヤーがベンダーにソリューションの提供を求めている、複雑で込み入ったスコープを持つプロジェクトで使用される文書です。



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

正式な調達プロセス 提案依頼書と入札説明会

規制の厳しい業界や政府機関では通常、正式な調達プロセスが使用されます。また、プロジェクトに専門的な作業が必要な場合や、入手可能な最高品質を求める場合にも使用されます。

このプロセスでは、提案依頼書(RFP)、**入札説明会**、および正式なプロセスを使用して、すべてのベンダー候補者が調達について明確かつ共通の理解を持つことを支援します。

調達担当者または調達部門と緊密に連携します。



入札説明会

入札や提案の準備に先立って、納入候補者との打ち合わせ。すべての見込みベンダーが調達について明確かつ共通の理解を持つようになります。コントラクター会議、ベンダー会議、入札前会議とも呼ばれます。



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

レッスン5

望ましい 契約タイプの選択

ECO 2.5.3



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

契約: 生産的な関係の交渉

契約:

- 作業合意を合法化します。
- 仕事上の関係に構造を与えます。
- パートナーとさらに協力します。
- 契約タイプに関連するリスクを考慮します。
- 購入者にベネフィットを提供します (タイプによって異なるベネフィット)。
- パートナースhipに合わせてテラリングします。



契約

互いに他を拘束する合意であり、
納入者に特定のプロジェクト、サービス、
所産を供給する義務を負わせ、購入者
にそれに対する対価を支払う義務を負
わせること。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。


契約の大まかな種類

🔒 定額契約

↔ 実費償還契約

✂ ハイブリッド契約

🔄 アジャイル契約



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

レッスン5

契約に含めるべきキー要素

法務チームと連携し、ベンダー契約では以下をカバーすべきです。

- 責任
- 保証
- 免責事項
- 契約違反
- コンテンジエンス



PM Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

13

ベンダーの パフォーマンス評価

ECO 2.5.4

PM Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

14

ベンダーのパフォーマンス評価

プロジェクト・マネジャーとして、ベンダーのパフォーマンス評価が、次の点で不可欠です：

- 調達リスクのマネジメント
- 品質の維持
- プロジェクト・スケジュールと予算の保護

このプロセスは戦略的でデータ主導であり、一般的に調達マネジメント計画書と契約合意によって指揮されます。



PM Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

15

レッスン5

ベンダーのパフォーマンス評価のアプローチ

正式な評価技法を使用します。

定期的にパフォーマンスを監視します。

パフォーマンス基準を早期に定義します。

パフォーマンス・レビューを実施します。

課題を積極的に管理します。

パフォーマンスデータを文書化し、アーカイブします。

調達の完了時に評価します。




© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

パフォーマンス基準の定義

まず、パフォーマンス・メトリックスが調達文書と契約書に定義されていることを確認することから始めます。一般的なメトリックスは:

- ・ タイムリーさ
- ・ 品質
- ・ コスト・コントロール
- ・ コンプライアンス
- ・ 応答性とコミュニケーション
- ・ イノベーションと付加価値



明確化のために、サービス・レベル・アグリーメント(SLA)または重要業績評価指標(KPI)を使用します。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

パフォーマンス監視

次のようなツールを使用して、定期的にパフォーマンスを監視します:

- ・ パフォーマンス報告書
- ・ 作業パフォーマンス・データと
作業パフォーマンス報告書
- ・ 現場視察または監査
- ・ アード・バリュー(EV)分析
- ・ マイルストーン・レビュー

これらをベースラインのメトリクス
および契約条件に照らして追跡します。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

レッスン5

正式な評価技法の使用

ベンダーのアウトプットを評価するために、構造化された方法を適用します。例えば：

- スコアカード
- 重み付き決定マトリックス
- ベンチマーキング
- 調査またはステークホルダーのフィードバック



PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

19

パフォーマンス・レビューの実施

定期的なチェックポイントを設定します：

- ベンダーとレビュー会議を行い、パフォーマンス、課題、継続的改善について話し合います。
- ディスカッションとアクション・アイテムを文書化します。



PMI Learning


© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

20

課題の積極的な管理

パフォーマンスが基準を下回る場合：

- 契約条件で救済策を確認します。
- 可能な場合は、ベンダーと協力して課題を解決します。
- 課題とリスク・エスカレーション手順に従い、必要に応じてのみエスカレーションします。



PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

21

レッスン5

パフォーマンスデータの文書化とアーカイブ

以下の記録を維持します:

- パフォーマンス・メトリックス
- コミュニケーション
- 改善計画
- 正式な評価

このデータが活用されるのは:

- 教訓
- 契約終了手続き
- 今後のベンダー選定の決定




© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

22

調達の完了時の評価

契約終了時:

- 調達パフォーマンス・レビューを実施します。
- 契約のコンプライアンスとプロジェクト目標への全体的な貢献度を評価します。
- 最終成果物を正式に受け入れ、または却下します。
- 組織のプロセス資産(OPA)をベンダーのパフォーマンスデータで更新します。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

23

適格ベンダー

- 組織によって事前承認されています
- その組織との仕事の実績があります
- 実績があり、アカウントがすでに設定されているため、「優遇」されることが多いです



教訓リポジトリから、ベンダーに関する過去のデータを見つけます。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

24

レッスン5

調達合意の目標達成 の検証


ECO 2.5.5



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI)。権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

25

目標が達成されたかの検証



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI)。権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

26

合意交渉への参加

ECO 2.5.6



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI)。権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

27

レッスン5

交渉戦略の決定

ECO 2.5.7



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

28

プロジェクトにおける交渉の目的

交渉はプロジェクトマネジメントの重要なスキルであり、経験によって向上します。



資源、時系列、成果物、または外部契約についての合意を得るのに役立ちます。



各当事者の契約条件、責任、義務を定義します。



成果物は、署名済みの契約書または正式な合意書です。



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

29

プロジェクト・マネジャーの合意交渉における役割



- ・ 調達担当は交渉を主導し、契約を締結します。
- ・ プロジェクト・マネジャーにできるのは:
 - ・ 技術的なインプットの提供。
 - ・ プロジェクトに対する要求事項を明確にする。
 - ・ ステークホルダーの興味を代表する。
- ・ 積極的な参加は、合意をプロジェクトの目標と整合させるのに役立ちます。



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

30

レッスン5

交渉状況の分析

直接的な権限がなくても結果を出す必要があることが多いため、交渉は重要なスキルとなります。



人材と資源の確保

これは、チーム・メンバー、機器、その他の資源を確保する上で非常に重要です。



管理 ステークホルダー ダー

期待をゴールに合わせ、確実に満足してもらえようようにします。



コンフリクトの 解決

互いに受け入れ可能なソリューションを見つけ、プロジェクトを軌道に乗せます。



契約の 交渉

プロジェクトに最適な価値と条件を確保するための支援をします。



スコープと予算 の調整

ステークホルダーやスポンサーとの合意に達し、プロジェクトの実行可能性を維持できるようにします。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

31

調達交渉の仕組み

調達交渉は、次の点で役立ちます：

- 合意の構造を明確にする。
- 各当事者の権利と義務を定義する。
- 明確な契約条件を確立する。
- 署名前に相互合意をサポートする。
- 今後の誤解を最小限に抑える。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

32

交渉のモデルと成果



Win-Win (ウィンウィン)

両当事者が満足し、両者の利害が一致し、結果が最適であると全員が認めます。



Win-Lose/Lose-Win (ウィンルーズ/ルーズウィン)

このアプローチは、ある一方が他方の犠牲のもとに利益を得て、不均衡を生じさせる競争的な考え方を反映しています。



Lose-Lose

競争が協力を上回り、相互の損失、コンフリクト、連携の好機を逃すことになります。

Covey, S. R. (1989). *The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change* (『7つの習慣 — 人格主義の回復』). ニューヨーク: フリープレス.



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

33

レッスン5

価値を創造する交渉モデルの選択

効果的な調達交渉モデルは、次の役に立つはずですが：

- 合意に達するだけでなく、両者に価値を創出します。
- 適切な戦略を通じて信頼を構築し、リスクを軽減します。
- 強力なパートナーシップとプロジェクトの成功を支える、ウィンウィンの成果を達成します。



PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

サプライヤーと契約 のマネジメント

ECO 2.5.8

PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

サプライヤーと契約のマネジメント

契約はプロジェクトマネジメントにおいて重要な役割を果たします。これらは、プロジェクト作業をサプライヤーとともに実施する際の契約条件を定義します。



プロジェクト・マネジャー、ベンダー、
サプライヤー間の関係に影響を与えます。



両当事者の終了条件を定義します。

組織が交渉する契約は、ベンダー関係の雰囲気や成功を決定します。

PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

レッスン5

契約変更管理システム

契約変更管理システムは、体系化され文書化されたプロセスです。

契約のライフサイクル全体を通じて、契約の変更を追跡し、承認し、管理します

スコープ、コスト、スケジュール、または契約条件の変更がレビューされ、文書化され、承認されるようにします。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。 33
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

契約変更管理システムの重要性

契約変更管理システムが重要なのに、いくつかの理由があります。

スコープ・クリープを防止する
承認されていない作業が紛れ込まないようにします。

有効な変更のみを承認する
法的および財務的な利害を保護します。



誤解を減らす
文書化の明確さは、係争を防ぎます。

透明性と説明責任をサポートする
すべての変更を追跡可能で監査可能にします。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIウェブサイトの一部として提供されるものです。

契約の修正と変更管理

必要に応じて合意を修正する

契約終結前であれば、相互の合意に基づいて変更が許可されます。

変更管理プロセスを適用する

変更は合意された手順に従わなければなりません。

すべての修正を文書化する

文書による記録は、明確さと説明責任を確保するのに役立ちます。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

レッスン5

契約終結アクティビティ



契約終結のタスク

- 納入者の作業が受入れられたことを確認します。
- 未決のクレームを確定します。
- 調達記録を更新します。
- 契約文書をアーカイブします。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

40

調達戦略の計画 とマネジメント

ECO 2.5.9



© 2025 Project Management Institute, Inc. 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

41

調達戦略の計画



調達の要求事項
を定義します。



詳細な調達戦
略を策定します。



必要な調達文
書を準備します。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

42

レッスン5

調達戦略の管理



選定したベンダー
と契約交渉を開始し、合意を最終
決定します。



継続的な調達
プロセスを管理するための
計画です。



契約パフォー
マンスを監視
します。

PMI Learning

© 2025 Project Management Institute (PMI). 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

43

デリバリー・ソリューション の開発

ECO 2.5.10

PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

44

クライアントの成功の定義を理解する

まずはクライアントと協力し、成功の定
義と期待を理解することから始めます。

プロジェクト全体を通してステークホル
ダーと関わり、ステークホルダーの要求
事項を理解し、それに応じてデリバリー
計画を調整します。



PMI Learning

© 2025 Project Management Institute (PMI). 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

45

レッスン5

包括的なデリバリー計画の作成



プロジェクトの範囲、目的、責任、前提条件、プロジェクト・スケジュールを概説した詳細な計画を作成します。

プロジェクトの特定の課題やニーズに基づいて、プロジェクトの実施方法をカスタマイズします。

契約上の義務を果たすだけでなく、クライアントに価値を提供することに集中します。

PM Learning


© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

フィードバック、リスク、コミュニケーション

ステークホルダーやチーム・メンバーからの定期的なフィードバックの仕組みを確立します。

プロジェクトの早い段階で潜在的なリスクを特定し、軽減戦略を策定します。

プロジェクト・チームやステークホルダーとの間で、常にオープンなコミュニケーションを保ちます。



PM Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

PMP®

品質の高い プロダクトと成果物 の計画と最適化

ECOタスク2.7

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.

PM Learning

レッスン5

プロジェクト成果物の 品質要求事項の収集

ECO 2.7.1



© 2025 Project Management Institute, Inc. 権利を留保します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

品質

一群の固有特性が要求事項を満たす度合いです。

含まれるのは:

- ステークホルダーの期待とエンドユーザーの満足度
- 規制や標準へのコンプライアンス
- 継続的改善



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留保します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

品質コスト

失敗を回避するためにプロジェクト期間中に支出されるコスト

・ 予防コスト

(品質の高い製品の構築)

- トレーニング
- プロセスの文書化
- 装置
- 最初から正しく作業を行うために必要な時間—リソースやインフラにかかる費用。

・ 評価(品質アセスメント)

- テスト
- 検査

失敗の発生により、プロジェクト期間中および完了後に支出されるコスト

・ 内部不良コスト

- 手直し
- スクラップ

・ 外部不良コスト

- 負債
- 保証作業
- ビジネスの損失

Crosby, P. B. (1979). *Quality is free: The art of making quality certain*.
(『品質はタダである——品質を確かなものにする技術。』) McGraw-Hill.



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留保します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

レッスン5

レッスン5

品質保証の一般的なツールと技法



プロセス監査



特性要因図



プロセス決定プログラム・チャート (PDPC)



品質マネジメント方法論:
• 統合的品質マネジメント
• シックス・シグマ

品質コントロール

品質コントロールは、検査やテストを通じて成果物の欠陥を特定することに重点を置いた、リアクティブなプロダクト指向プロセスです。

品質コントロールの主な側面:

- リアクティブなプロセス
- 検査とテスト
- 欠陥の特定
- 標準の遵守
- 継続的監視



品質コントロールの一般的なツールと技法



統計的サンプリング



検査とテスト



管理図




チェックシートとヒストグラム

レッスン5

品質マネジメント計画書

- 品質目標を達成するための活動と資源
- 正式または非公式、略式または大まかな枠組み
- プロジェクト全体を通じてレビュー
- ベネフィット:
 - プロジェクトの価値提案に対する、より明確で鋭い焦点
 - コスト削減
 - 手直しによるスケジュール超過の軽減



PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を保護します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

コンプライアンス要求事項

プロジェクトは、以下のような社内外の標準に準拠している必要があります。

- 適切な政府規制
- 組織の方針
- プロダクトとプロジェクトの品質要求事項
- プロジェクト・リスク

コンプライアンスのためのアクション:

- コンプライアンスのカテゴリーを分類します。
- コンプライアンスに対する潜在的な脅威を特定します。
- コンプライアンス違反の代償を分析します。
- コンプライアンスのニーズに対処するために必要なアプローチとアクションを決定します。



PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を保護します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

品質規格と規制

標準または規制	説明	例
標準	監督機関、慣習、または一般的な合意によって確立された文書。	辞書
規制	政府による法令遵守が義務付けられた該当する管理規定を含め、製品・プロセス・サービスの特性を規定する要件。	言語のルール
事実上の標準または規制	広く受け入れられ、使用を通じて採用されているが、まだ公式に義務付けられていない標準または規制	単語はスラングや専門用語のように、グループの中で広く使われます。
法的標準または規制	法律で義務付けられている、または専門家の公認団体によって承認された標準や規制。	単語は辞書に入り、定義された単語となります。



- 品質に関する国際機関や組織は以下の通り多数あります:
- American Society for Quality (ASQ)(米国品質学会)-ISO 9000シリーズ
 - The Chartered Quality Institute(CQI、英国品質保証機構)
 - ASTM-インターナショナル

PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を保護します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

レッスン5

品質計画 プロセスとツール

ECO 2.7.2



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

品質尺度、チェックリスト、プロセス



メトリックスは、テスト、ツールの使用、プロセスを通じて、プロダクトやプロジェクトに望まれる品質属性を測定します。

顧客が受け入れるであろう許容度を含め、受入基準とDone(完了)の定義に望ましい品質レベルを記述します。

品質マネジメント計画書にチェックリスト、テンプレート、品質成果物を含めます。



適応型チームは、レトロスペクティブ(振り返り)と小規模なバッチ・サイクルを使用して、品質を確保します。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

継続的改善のための品質手法

シックス・シグマ(リーン・シックス・シグマとも呼ばれます)—DMAICフレームワーク(定義、測定、分析、改善、管理)—ムダの排除に注力

カイゼン—「より良くするための変化」

計画(Plan)-実行(Do)-確認(Check)-改善(Act)(PDCA)—シューハート/デミング
アジャイルアプローチ—スクラム、カンバン、クリスタル・アプローチ(ソフトウェア)



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

レッスン5

品質マネジメント 計画書の実行

ECO 2.7.3




© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

64

品質マネジメントに関するガイドライン

- プロジェクトのアプローチとアクティビティの品質を評価します。
- 検査とテストを通じて成果物の品質を評価します。
- レビューや監査を通じて、プロジェクトのアクティビティとプロセスの品質を評価します。
- エラーや欠陥の検出と予防に重点を置きます。



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

65

プロダクト品質の評価



プロジェクト・マネジャーは、品質のマネジメント・プロセスを使用して、次のことを行います。

- 成果物が機能要求事項と非機能要求事項を満たしていることを検証します。
- 改善点を特定し、提案します。
- コンプライアンス要求事項との整合性を検証します。
- 特定された差異についてフィードバックを行います。
- 欠陥やその他の不適切問題を解決するための潜在的なアプローチを特定します。
- また、品質報告書と提言を継続的に監視します。



- チーム、顧客、プロダクト・オーナーは、品質のゴールとメトリックスを設定し、それを達成する責任を負います。
- イテレーションからのフィードバックが、品質を継続的に監視します。
- 以下の方法で品質のパフォーマンスを測定します：
 - サービス・レベル・アグリーメント (SLA)
 - 重要業績評価指標 (KPI)
 - 契約上の尺度
 - 品質の方法/フレームワーク (例: リーン・シックス・シグマ)



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

66

レッスン5

規制のコンプライアンス を確実にする

ECO 2.7.4



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

67

プロジェクト・ガバナンス・フレームワークとの整合性



組織のガバナンス
構造を理解します。



必要なガバナンス
機関が適切な情報
を受け取ることを
支援します。



段階ゲートまたは
フェーズ・ゲート・
レビューのプロセ
スに従います。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

68

意思決定とエスカレーションの促進



ステークホルダーの
意思決定を支援す
るため、タイムリー
で正確なデータ
を提供します。



合意されたプロト
コルに従って、課
題、リスク、また
は変更をエスカ
レーションします。



決定事項を文
書化し、アクショ
ン・アイテムを
追跡します。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

69

レッスン5

コンプライアンスと可監査性のサポート

プロジェクトをできるだけ簡単にレビューできるようにします。

- 内部の方針、標準、および監査要求事項に従います。
- 重要な決定事項と文書のトレーサビリティを確保するのに役立ちます。
- 監査やプロジェクト後のレビューの準備として、記録を完全かつ整理された状態で保管します。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

70

透明性のある積極的なコミュニケーション

プロジェクトをできるだけ簡単にレビューできるようにします。

- 信頼できる一貫性のある最新情報を共有します。
- 積極的にリスク、差異、リカバリー計画を伝えます。
- ダッシュボード、スコアカード、視覚化などのツールを使用して、パフォーマンスの傾向を強調します。

プロジェクトのパフォーマンスは、常に可視化する必要があります。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

71

ステークホルダーのガバナンス活動への関与を促進する

プロジェクト文書を最新の状態を保ちアクセス可能にするなど、以下を含みます。

- 📅 ガバナンス会議と段階ゲート・レビューをスケジュールし、円滑に進めます。
- 💬 ステークホルダーの積極的な参加とフィードバックを奨励します。
- 📈 必要に応じてガバナンス・チェックポイントを使用し、スコープ、資源、または時系列を再調整します。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

72

レッスン5

品質コストと持続可能性 のマネジメント

ECO 2.7.5



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

品質コスト・モデル

品質コスト (COQ) モデルは、欠陥やプロダクトの故障を回避するために、予防と評価の
コストに投資する適切なバランスを見つけるのに役立ちます。品質関連コストを4つ
のカテゴリーに分類しています：

予防コスト

評価コスト

内部不良コスト

外部不良コスト



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

継続的な品質レビュー の実施

ECO 2.7.6



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

レッスン5

品質監査



品質監査は、定期的に、スケジュールに沿って、またはアドホックな方法で実施することができます。

トピックに含まれるのは：

- 品質マネジメント方針
- 情報の収集と活用
- 分析方法
- 品質コスト
- 品質プロセス設計



品質監査

プロジェクト活動が組織およびプロジェクトの方針、プロセス、手続きに準拠しているかどうかを判断するための、構造化された独立したプロセス。



「監査を活用して、適応型開発アプローチにおける品質マネジメントの補完を強化または正式化します。」



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。 76

品質のコントロールツール



データ収集

- チェックリストまたはチェックシート
- 統計的サンプリング
- アンケートと調査

データ分析

- パフォーマンス・レビュー
- 根本原因分析

データ表現

- 特性要因図
- 散布図
- 管理図
- ヒストグラム
- パレート図



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。 77

品質保証のマネジメント：例



- チェックシートを使用してデータを収集します。
- ヒストグラムにデータをプロットします。
- パレート図(80/20の法則)を使用して重大なエラーを理解します。
- 選択した問題とソリューションに因果関係分析を使用します。
- 最後に、相関関係を理解するために散布分析を行います。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。 78


レッスン5

プロセスと製品の品質確保を支援する



品質は、プロダクト・スコープ記述書やその他の設計および立上げ文書に記載されているプロダクト受入基準と密接に結びついています。

実験と優先順位付けが行われたらこれらの基準を更新し、受入れプロセスの一環として検証します。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

79

成果物の検証



- プロジェクトチームは、品質規格と要求事項に基づいて成果物を検証します：
 - 品質メトリックス
 - 許容度
- 検証済み成果物が顧客に提示され、受入れられた（検証された）ことにより、受入れ済み成果物が生じます。
- プロジェクトの品質規格に照らしてプロダクトとアウトプットを測定します。
- 品質規格が満たされておらず、許容範囲内にない場合には、是正処置とコントロールを実施します：
 - アジャイルにおけるイテレーションH（またはハーデニング）—品質保証サイクル
 - スクラムにおけるスプリントイテレーション・レビュー



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

80

継続的改善 の実施

ECO 2.7.7



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

81

レッスン5

継続的改善

継続的改善とは、プロセス、プロダクト、システム、サービスを改善する作業工数に焦点を当てた、継続的なプロセスです。

漸進的な改善の特定、分析、実施などです。

継続的改善には、以下のようなアプローチを用いることができます: Plan (計画) - Do (実行) - Check (確認) - Act (改善) (PDCA)、リーン、統合的品質マネジメント、シックス・シグマ、5FS (Five Focusing Steps)、その他の方法。

改善

「Kai」
変更


「Zen」
良い

PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

82

カイゼン



PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

83

現在の継続的改善方法の評価

チームおよび組織は、継続的改善に対応できる体制がどの程度整っているか。



リーン・シックス・シグマ

協働的なチーム手法。プロジェクトの実施と監視の間に、顧客ニーズを的確に把握し、プロジェクト・パフォーマンスを測定する能力を高めます。

- 教訓登録簿は最新の状態になっているか？チームは定期的なレトロスペクティブ(振り返り)を行っているか？チーム・メンバーは、**リー・シックス・シグマ** またはアジャイル アプローチの 認定資格を持っているか？

- 彼らはカイゼン、リーン、クリスタル・メソッド、または能力成熟度モデル・インテグレーション (CMMI) について知っているか？

- また、プロセス改善計画書とプロジェクトマネジメント計画書もチェックします。



「リスク登録簿を使用して、現在の継続的改善措置を評価します。また、プロジェクト品質への脅威対処のためにチームがどのような準備を整えているかも含まれるため、現在の継続的改善策を評価する上で役立つ方法となります。」

PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

84

レッスン5

レトロスペクティブ(振り返り)における方法の見直しと改善



- インスピレーションを与えるトピックを準備します。
- ホワイトボードに2つの列を作ります。
- 出席者に、これらのリストに項目を追加するよう求めます。
- 各参加者に、改善の理由を特定させます。
- 改善が必要な共通項目を決定し、それらに印を付けます。
- 次のスプリントで価値をもたらす改善領域にリストを絞り込みます。
- 計画の改善についてチームの合意を得ます。
- プロダクト・オーナーとの話し合いの後、バックログ上のこれらのタスクを更新します。
- 変更を実施します。

うまくいったこと	改善が必要
スケジュール通りの完了	- レトロスペクティブ(振り返り)法 - 作業スペースの整理整頓



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

85

改善方法の改善



教訓登録簿とレトロスペクティブ(振り返り)を適切に活用することに加えて、以下を試します：

実験

- A/Bテストとチームのフィードバックを使用して改善点を特定します。
- 実験は、チームの効率と効果を向上させる方法を提供します。
- コントロールの適用—1回ずつ行い、結果を分離します。

パレート図、または80/20の法則

- 最大の影響を与えることができる場所に取り組みを向けます
- 大きな問題を小さなピースに分解します



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

86

いくつかの定義



A/Bテスト

ユーザーの類似サービスの異なるセット—アルファ版とベータ版—を示すことで、ひとつの独立変数を用いてユーザーの好みを判別するマーケティング・アプローチです。



パレート図

階層形式で問題の原因をランク付けするために使用されるヒストグラムです。



80/20の法則

多くの事象に応用可能な一般的なガイドライン：プロセスをコントロールする観点では、多くの問題や欠陥（一般に80%）は、比較的少数の原因（一般に20%）によって生み出されるという経験則。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

87


レッスン5

プロセスと標準の更新

成功した実験から得た知見を活用して、継続的改善のためのステップを考案し、提言します。

プロジェクト・レベルでの教訓は、組織の継続的改善プロセスに適用できるか？

もしそうならば、組織レベルでの採用の好機としてこれらの教訓をエスカレーションすべきです。



PM Learning

© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

改善マインドセットによるリーダーシップ

- 自分自身を教育します。
- 「早く失敗する」マインドセットを奨励します。
- 資材の改善、トレーニング、プロセス、または機器を特定します。
- 変更の影響を測定します。
- そして、繰り返します。



PM Learning

© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

PMP®

スケジュール の計画と管理

ECOタスク2.8

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.

PM Learning

レッスン5

アプローチに基づく スケジュールの作成


ECO 2.8.1



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

91

予測型アプローチ



スケジュール・プロセスは高度に構造化されており、詳細な事前計画が含まれます。

タスクは直線的に順序付けられ、明確な依存関係が概説されています。

プロジェクトの開始時に、すべてのタスクの所要期間と資源を見積ります。

ベースライン・スケジュールは、プロジェクト・パフォーマンスを測定する尺度として確立されます。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

92


適応型アプローチ

適応型アプローチでは、柔軟なスケジュールでの上位レベルなロードマップの作成が含まれます。

スケジュールはより流動的です。

アクティビティに優先順位を付け、資源を動的に割り当てます。

スケジュールは継続的に洗練されます。




© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

93

レッスン5

ハイブリッド・アプローチ



ハイブリッド・アプローチは、予測型アプローチとアジャイル・アプローチの両方の要素を組み合わせます。

これにより、さまざまなプロジェクトのニーズや複雑さに柔軟に対応できます。

アジャイルと同様に、資源は漸進的に割り当てられることもあれば、予測型アプローチのように計画され予約されることもあります。

各プロジェクト構成要素は、その特性に最も適したアプローチで扱われます。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

他のプロジェクトや 業務との調整

ECO 2.8.2



© 2025 Project Management Institute, Inc. 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

他のプロジェクトや業務との調整

- プロジェクトは、プログラム、ポートフォリオ、定常業務を含む、より広範なエコシステム内で実行されます。
- このエコシステム内での調整は、依存関係、必要な資源、整合の機会を特定するのに役立ちます。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

レッスン5

調整された方法によるプロジェクトのマネジメント

関連するプロジェクトをプログラムにまとめることで、単独のプロジェクトだけでは得られない、より大きな成果を達成するための調整されたマネジメントが可能になります。



効率を改善し、価値を提供します。

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

プロジェクト、プログラム、定常業務の整合

組織によっては、ポートフォリオ内で複数のプログラム、プロジェクト、業務をマネジメントしています。ポートフォリオによりホリスティックなビューを得られるため、リーダーは次のことを行えるようになります。



プロジェクトと業務を組織のゴールに整合させます。

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

成功する調整の達成

ポートフォリオ、プログラム、プロジェクトの各マネジャーは、定常業務のリーダーと協力しながら、次のバランスを取ることが求められます：

- ・ リソースの割り当て
- ・ ステークホルダー・エンゲージメントとサポート



© 2025 プロ野球選手会。本誌掲載の選手名は、本誌発表の順位表を基準とする。

レッスン5

プロジェクトタスク の見積り

ECO 2.8.3



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

100


プロダクト・ロードマップ

- 全体像を想定し、計画します
- プロダクト戦略、方向性、提供される価値を表示します
- 包括的なプロダクト・ビジョンを持ってリードし、段階の詳細化を用いてビジョンを洗練させます
- 構造と関連性を提供するテーマ(ゴール)を使用します。
- 短期的および長期的な可視化を提供します。



プロダクト・ロードマップ

プロジェクトのプロダクトまたはプロダクトの
ハイレベルな視覚的概要で、目標、マイル
ストーン、潜在的な成果物を含みます。



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

101

マイルストーン

- 大きなイベント、レビュー、期日、支払い、意思決定のための**マーカー**
- 報告要求事項またはスポンサーや顧客の承認のための**プロンプト**
- **作成者は**、プロジェクト・マネジャー、顧客、またはその両方です

マイルストーン・リストは、すべてのマイルストーンを特定し、次のようなものを示します:

- 必須—契約で義務付けられている、または
- 任意—過去の情報に基づく見積り



マイルストーン

ポートフォリオ、プログラム、またはプロジェクト
における重要な節目やイベントです。

マイルストーン・リスト

マイルストーン・リストは、プロジェクトのすべての
マイルストーンを特定し、マイルストーンが必
須かどうかを示します。たとえば、契約で要求さ
れるマイルストーンは必須であり、過去の情報
に基づくマイルストーンなどは任意です。マイル
ストーンは、プロジェクトにおける重要な時点や
イベントを表すもので、その所要期間はゼロとな
ります。




© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

102

レッスン5

プロジェクト・アクティビティの分解

- プロジェクトのアクティビティ(名詞)に分解します。
- 動詞文を使用して、**アクティビティ・リスト**にアクティビティを入力します。
- アクティビティ・リストを使用して、プロジェクト・スケジュールを作成します。
- すべてのアクティビティに所要期間を含めます。

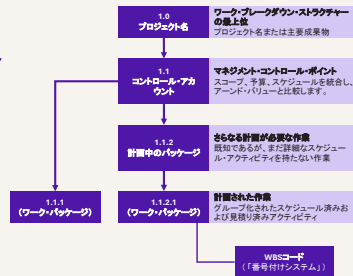

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。 103

定義



プロジェクト・アクティビティ

プロジェクトの過程で行われる作業のうち、明確にスケジュールされた部分。



アクティビティ・リスト

スケジュール・アクティビティを表にした文書。アクティビティ記述、アクティビティ識別子、および詳細な作業範囲を表示しているため、プロジェクト・チーム・メンバーは実行すべき作業を理解できます。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。 104

アクティビティ依存関係のタイプ




	意味	プロジェクト・マネジャーによるアクション
必須	契約で要求されていたり、あるいは作業の性質上必然的に存在します。	スケジュールに組み込む必要あり—絶対を守るべき順序
数量的	良い実務慣行があるか、特定の順序が望まれるために確立されます。	より良い手順に置き換えられる場合や、スケジュール短縮が必要な場合は、必要に応じて修正できます。
外部	プロジェクト・チームの作業外で行われるアクティビティ	コントロールは限られているか、なし
内部	プロジェクト作業において、インプットに応じて	コントロール可能



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を留めます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。 105

レッスン5

先行関係



- 依存関係は、先行関係とアクティビティの実行順序を決定します。
- プレシデンス・ダイアグラム法 (PDM) を使ってこれらを示します
- 先行は、どのアクティビティが関係を駆動するかを示します。
- 先行作業は通常、後続作業よりも早い時期に発生します。



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。 106
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

別の定義




先行関係

ネットワーク図を作成するために使用される技法です。スケジュール・モデルを構築します。スケジュール・モデルでは、アクティビティはノードで表され、1つ以上の論理的関係によってグラフィカルにリンクされ、アクティビティを実行する順序を示します。



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。 107
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

先行関係のタイプ



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。 108
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

レッスン5

リードとラグの定義



リード:

関係する先行アクティビティに対して、後続アクティビティの開始を前倒しできる時間。



ラグ

先行アクティビティに対し、後続アクティビティの開始を遅らせる時間。




© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。 109
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

先行関係におけるリードとラグ

リードとラグタイムを最大2週間、アクティビティに追加します。

アクティビティに関連する前提条件を文書化します。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。 110
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

アクティビティ所要期間見積りの用語



アクティビティ所要期間見積り

- アクティビティを完了するために必要な期間の数の定量的な査定。

経過時間

- 活動を開始してから完了するまでに実際に必要となる層上の時間。

作業工数

- スケジュール・アクティビティまたはWBS要素を完了するために必要な労働単位の数。多くの場合、時間、日数、または週数で表されます。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。 111
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

レッスン5

見積り技法

		👍	👎
概算	- 所要期間（またはコスト）を見積もるために、類似のアクティビティやプロジェクトの過去のデータを使用します。 「トップダウン見積り」とも呼ばれます。	- より低コストで時間もかからない - プロジェクト情報が限られている場合に使用	過去の情報の品質によっては不正確な場合も
パラメトリック	- 過去のデータやプロジェクトのパラメーターに基づいてコストや所要期間を算出するためにアルゴリズムを使います。 - 所要期間は定量的に決定可能 - 一連すべき作業量と、作業単位あたりの労働時間数を掛けます	- モデルから得られるデータの高度さに応じて、よりハイレベルな正確さを表現可能 - スケールアップで直線的	- 学習曲線を考慮しない。すなわち、チームがより熟練するにつれて作業が容易になる - プロジェクトでは、作業ユニットが均一であることは一般的ではありません
三点	- 最可能値、楽観値、悲観値の見積りを用いて、アクティビティ所要期間の最確の見積りを定義 - 過去のデータが不十分なとき、あるいは主観的なときに用いられる	リスクや不確実性の要因を含めることで、単一点見積りの精度を向上させる可能性あり	- 詳細な資源情報が必要 - タスクを見積りに専門知識が必要
ボトムアップ	ワークブレイクダウン・ストラクチャーの下位コンポーネントの見積りの集計値を使用	非常に正確で、下位レベルのマネジャーにより多くの責任を考えます	- 非常に時間がかかる場合あり - WBSが適切に定義された後にのみ使用可能



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。 112
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

三点見積り：例

三角分布（平均）

計算式

$$E = (O + M + P) / 3$$

- 楽観値 = 3週間
- 最可能値 = 5週間
- 悲観値 = 10週間

方程式

$$(3 + 5 + 10) / 3 = 6 \text{ 週間}$$

ベータ分布（PERT平均）

計算式

$$E = (O + 4M + P) / 6$$

- 楽観の見積り = 3週間
- 加重最可能値見積り = 5週間
- 悲観の見積り = 10週間

方程式

$$[3 + 4(5) + 10] / 6 = 5.5 \text{ 週間}$$




© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。 113
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

クリティカル・パス法

プロジェクトの最短期間を見積もり、スケジュール・モデル内で論理ネットワーク・パスにおけるスケジュールの柔軟性を判定するために用いる方法。

必須のクリティカル・パス・アクティビティを順序設定し、プロジェクトの最長パスを見つけ、可能な最短期間とスケジュールの柔軟性を判断します。



$$1[6w] + 2[4w] + 4[3w] + 6[1w] = 14 \text{ 週間}$$

$$1[6w] + 3[5w] + 5[4w] + 6[1w] = 16 \text{ 週間のクリティカル・パス}$$




© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。 114
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

レッスン5

日付と依存関係を含むネットワーク図

計算:

- クリティカル・パス
- 往路時間計算
- 復路時間計算
- フロート

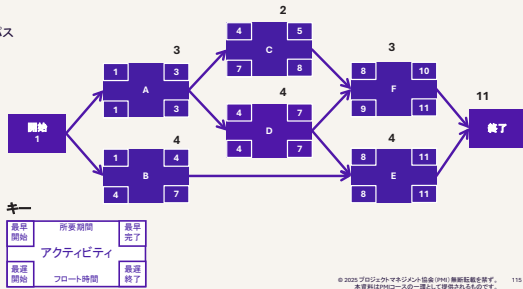

日付と依存関係を含むネットワーク図

フロート

最早日付と最遅日付の間の差。

トータル・フロートは1つのアクティビティ内に、**フリー・フロート**は2つのアクティビティの間にあります。

トータル・フロートとは、プロジェクト終了日を遅らせたり、スケジュールの制約条件を違反したりすることなく、スケジュール・アクティビティの開始を最早開始日から遅らせたり、延長したりできる期間のことです。**フリー・フロート**は、スケジュール・アクティビティを、後続のスケジュール・アクティビティの最早開始日に影響を与えずに遅らせることができる時間です。

すべてのアクティビティについて、**最早開始日**、**最早開始日**、**最遅開始日**、および**最遅終了日**を使用します。

最早終了日

スケジュール・ネットワーク・ロジック、データ日付、およびスケジュールの制約条件に基づき、スケジュール・アクティビティの未完了部分が終了する可能な最も早い時点です。

最早開始日

スケジュール・ネットワーク・ロジック、データ日付、およびスケジュールの制約条件に基づき、スケジュール・アクティビティの未完了部分を開始できる最も早い時点です。

最遅終了日

スケジュール・ネットワーク・ロジック、プロジェクト完了日、およびスケジュールの制約条件に基づき、スケジュール・アクティビティの未完了部分を終了できる最も遅い時点です。

最遅開始日

スケジュール・ネットワーク・ロジック、プロジェクト完了日、およびスケジュールの制約条件に基づき、スケジュール・アクティビティの未完了部分を開始できる最も遅い時点です。

PM Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。 116
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

プロジェクト・スケジュール

- 開始アクティビティと終了アクティビティを含みます。
- 特定の日付と特定の順序を使用します。
- プロジェクトのマイルストーンの日付を設定します。
- プロジェクトを予定通りに完了できるよう、アクティビティを調整します。
- スケジュールのパフォーマンスに基づいてプロジェクトの進捗を追跡し、プロジェクトの状況を上級マネジメントとプロジェクト・ステークホルダーに可視化します。

PM Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。 117
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

レッスン5

スケジュール・プレゼンテーション形式

プロジェクトに合ったスケジュールのタイプを選択します。

- ロードマップ
- ガント・チャート
- マイルストーン・チャート
- プロジェクト・スケジュール・ネットワーク図



プロジェクトマネジメント計画書でスケジュール・アクティビティのスケジュールを作成するために使用したツールの名前を覚えていますか？

ヒント: アウトプットは、プロジェクト・スケジュール・ネットワーク図です。




© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を保護します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

ガント・チャート



時系列に沿ってプロジェクトを可視化し、追跡します




© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を保護します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

マイルストーン・スケジュール



計画された日付を含むマイルストーンを提示します



① マイルストーンは所要期間がゼロであることを覚えておきましょう。




© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 権利を保護します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

レッスン5

プロジェクト・スケジュール・ネットワーク図

アクティビティの相互関係を可視化する



① 記号は図示例のみです。



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。 121
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

資源の最適化

円滑化

- 事前定義された資源制限と、フリー・フロートおよびトータル・フロートの範囲内でアクティビティを調整します。
- クリティカル・パスを変更したり、完了日が遅れることはありません。
- この方法ではすべての資源を最適化できない可能性があります



資源円滑化

クリティカル・パスに影響を与えない範囲で、フリー・フロートとトータル・フロートを使用する資源最適化技法です。

平準化

- 資源の制約条件に基づいて開始日と終了日を調整します。
- 資源の需要と供給のバランスを目指します。
- 共有資源や必須資源の可用性が限られている、または過剰に割り当てられている場合に使用します。
- クリティカル・パスを変更する可能性があります



資源平準化

資源最適化技法のひとつです。資源割当てを最適化するためにプロジェクト・スケジュールを調整します。クリティカル・パスに影響を与えることがあります。



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。 122
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

スケジュール短縮技法

ファスト・トラッキング

- 時間を短縮するためにアクティビティを並行して実行します
- 手直し、リスクの増大、コストの増大を招く可能性があります



ファスト・トラッキング

スケジュール短縮技法の一つ。通常は順番に実施されるアクティビティやフェーズを並行して進行されます。

クラッシング

- 資源を追加することにより、コストの増大を最小限に抑えスケジュールの所要期間を短縮します。
- クリティカル・パス上のアクティビティにのみ有効です
- 実行可能な代替案を常に生み出すとは限らず、リスクやコストの増大につながる可能性があります



クラッシング

資源を追加することにより、コストの増大を最小限に抑えスケジュールの所要期間を短縮するスケジュール短縮技法です。



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。 123
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

レッスン5

スケジュール・ベースライン

- スケジュール計画アクティビティを完了します。
- スケジュール・ベースラインを**プロジェクトマネジメント計画書に追加します**。
 - 理想的には、これはプロジェクトが開始される前に行われます。
- チームが作業している間、実際の進捗をベースラインと比較します。
- 正式な変更マネジメントプロセスを使用して、ベースラインに変更を加えます。



スケジュール・ベースライン



承認済みのスケジュール・モデルで、変更は必ず正式な変更管理手順に従って行います。実績値と比較する基準として用います。プロジェクト開始前に作成すべき主要なプロジェクト文書のひとつです。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。 124
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

特別なインターバル



必要なスケジュールされた「ダウン」時間のインターバルを、どのように、いつ行うかを交渉します。



ブラックアウト時間：変更の保留ソリューションが顧客にリリースされる際に、リスクを低減します。



本番稼働：成果物がパイロットテストされる、または公開されている間、活動は一時停止されます。



ハーデニング・イテレーション/イテレーションH

コードベースを安定させることに特化したイテレーションであり、リリースに十分な堅牢性を持たせます。新しい機能は追加されません。主にリファクタリングや技術的負債のために使用されます。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。 125
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

適応型環境におけるスケジュール・マネジメント：ガイドライン

- チーム構成とライフサイクルに依存します。
- プロジェクトチームはプロダクト・オーナーと協力して決定します。
- ロードマップを作成し、リリース機能とタイムフレームを示します。
- アプローチを選択します：
 - バックログ付きのタイムボックス化されたスケジューリング
 - オンデマンドで継続的なスケジューリング
- プロジェクト・チームは、イテレーション（またはスプリント）内でデリバリーするアクティビティを選択します。
- チームは価値の増分とフィードバックを生み出します。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。 126
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

レッスン5

適応型スケジューリング・アプローチ

オンデマンド(カンバン・リレーベース)	タイムボックス化・イテレーション
- 個別の要求に対応できます - チーム・メンバーの作業を均等化します - アクティビティが均等に分割されている場合に最適です ①「複雑な依存関係のあるプロジェクトではうまく機能しません」 要求の優先順位付けを行って開始順序を決定し、完了までユーザー・ストーリーを個別に順序付けします。 チームはキューから作業を引き出します。 インクリメンタルな事業価値を提供します	- 段階的詳細化(ローリング・ウェーブ計画法)を用いてアクティビティをスケジュールします 2週間などといった特定の作業インターバルを使用します - プロジェクト期間中、いつでも変更を可能にします ユーザー・ストーリーで要求事項を定義し、ストーリーに優先順位を付けます。 優先順位とタイムボックスに基づいて作業を選択し、残りのストーリーをバックログに追加し、後で優先順位に基づいてストーリーを再導入します。 早期に段階的に事業価値を提供します




© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。 127

適応型計画の概要

リリース・スケジュールは通常、3〜6か月間です。
タイムボックス化されたイテレーションやスプリントは、通常1〜4週間続きます。
作業量を判断するために、タスクにストーリー・ポイントを割り当てます。
ベロシティ (Velocity)—チームが作業を完了するキャパシティ

ベロシティ

ベロシティとは、チームがあらかじめ定められた期間内において、成果物を作成・検証・受け入れられるまでの生産性の速度を測る指標です。

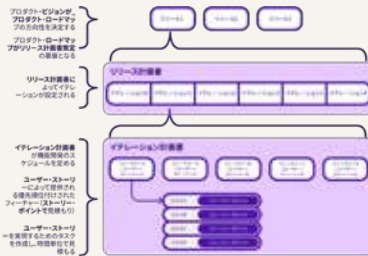

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。 128

フィーチャーとの協働

フィーチャーに合わせたスケジューリングにより、関連する作業が確実に調整されます。

プロダクト・ロードマップにフィーチャーを関連付けることで、機能のブロックがビジネスやエンドユーザーにリリースされるかを可視化できます。




© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。 129

レッスン5

アジャイル・リリース計画:ストーリー・マッピング



- ・ストーリーをシーケンスと優先順位でグループ化します。
- ・リリースのためのフィーチャーと機能を順序付けします。
- ・リリース・バックログのユーザー・ストーリーに優先順位を付け、フィーチャーと機能に関連付けます。

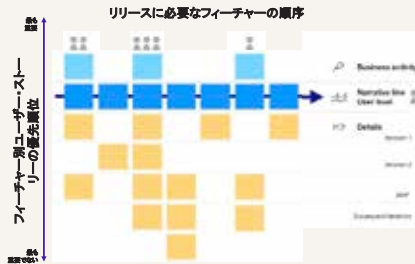

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。 130
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

時間ではなく作業工数を測定する

相対的なサイズ決定

- ・複数のユーザー・ストーリーの作業工数を、値 (XS、S、M、L、XL) の割り当てを通じて比較します。



「共通のシャツ・サイズを使ってユーザー・ストーリーに価値を割り当てます。」

ストーリー・ポイント

- ・フィボナッチ数列のような相対的な尺度を用いて、ユーザー・ストーリーやタスクの難易度や複雑さを特定します。

プランニング・ポーカー

- ・開発作業の工数または相対的な規模を見積ります
- ・フィボナッチ数を修正したカードのデッキを使ってユーザー・ストーリーに投票します



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。 131
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

ベンチマーキングと過去のデータの活用

ECO 2.8.4



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。 132
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

レッスン5

ベンチマーキングと過去のデータから始める

ベンチマーキング

- 現在のプロジェクト・スケジュールを類似のプロダクトやサービスのスケジュールと比較します
- 詳細な分析の前に、見積りの良い出発点を提供します
- スケジュールの初期段階で実現可能性を評価します



過去のデータ

組織内の完了済みプロジェクトから得た教訓



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。 133

プロジェクト・スケジュールの作成

ECO 2.8.5



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。 134

プロジェクト・スケジュール



- 開始アクティビティと終了アクティビティを含みます。
- 特定の日付と特定の順序を使用します。
- プロジェクトのマイルストーンの日付を設定します。
- プロジェクトを予定通りに完了できるよう、アクティビティを調整します。
- スケジュールのパフォーマンスに基づいてプロジェクトの進捗を追跡し、プロジェクトの状況を上級マネジメントとプロジェクト・ステークホルダーに可視化します。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。 135

レッスン5

プロジェクト・スケジュール のベースライン設定

ECO 2.8.6



© 2025 プロジェクトマネジメント協会(PME), Inc. 無断転載を禁ず。
本資料はPMEコースの一環として提供されるものです。

プロジェクト・スケジュールのベースライン設定



比較のためのベンチマーキング

実際のプロジェクト・パフォーマンスと比較するためのベンチマーキングとして機能します。



パフォーマンス測定

スケジュール・パフォーマンスを測定し、差異を特定するために使用されます。



变更管理

調整や変更には、正式な変更管理手順が必要です。



プロジェクト評価

プロジェクトが予定通りに進んでいるか、予定より進んでいるか、遅れているかを評価します。



計画書の構成要素

プロジェクトマネジメント計画書全体の中のベースラインの一部



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。 137
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

スケジュール・マネジメント 計画書の実行

ECO 2.8.7



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。 138
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

レッスン5

スケジュール・マネジメント計画書の実行

スケジュール・マネジメント計画書は、プログラムまたはプロジェクトマネジメント計画書の構成要素であり、スケジュールを作成、監視、およびコントロールするための基準とアクティビティを確立するものです。



スケジュール・マネジメント計画書は正式または非公式であり得るもので、詳細なものから大枠で定められたものでプロジェクトのニーズに基づいてさまざまです。

この計画書には、適切な管理限界値も含まれます。

スケジュール・マネジメント計画書の構成要素



「スケジュール・マネジメント計画書がハイブリッド・プロジェクトにおいてどのように有益なツールとなり得るかについて議論します。誰にベネフィットをもたらすのか？」

プロジェクト・スケジュール・モデル	- スケジュール作成の方法論/ツール - メンテナンス計画を含む、状況更新と進捗を実行中に含みます
正確さ	- 許容範囲は、現実的なアクティビティ所要期間見積りを決定するために使用されます - リスクコンテンションを含む場合があります
測定単位	各リソースに対して定義されます—例えば、労働時間、日、週
組織的手順のリンク	ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャーの活用により見積りとスケジュールとの整合性を確保します
管理限界値	- 行動（エスカレーションやレビューなど）を起こす前に、スケジュールのパフォーマンスを監視するため - ベースラインからの偏差をパーセンテージで表します—例：スケジュールより進んでいるまたは遅れている割合
ルール	パフォーマンス測定—例えば、アーンド・バリュー・マネジメント (EVM) ルール
報告	頻度と形式、スケジュール関連報告書用
プロセス記述	スケジュール・マネジメント・プロセスの文書化方法を説明します。

スケジュール・マネジメント計画書を実行するための重要なステップ

承認されたスケジュール・ベースラインを参照する

アクティビティの開始日と終了日を伝達する

ツールを使って作業の進捗を追跡する

実績とベースラインの比較

差異を特定し、管理する

スケジュール・コントロール対応策の適用

ステークホルダーへの報告

変更の文書化と教訓



レッスン5

スケジュール差異 の分析

ECO 2.8.8



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

スケジュール差異の理解



アード・バリューとブランド・バリューの差で表されるスケジュール・パフォーマンスの尺度です。



$SV = EV - PV$
SV = スケジュール差異
EV = アード・バリュー
PV = ブランド・バリュー

結果の解釈:

- ポジティブ = スケジュールより進んでいる
- ニュートラル = スケジュール通り
- ネガティブ = スケジュールより遅れている



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

スケジュール差異の分析



根本原因を特定します。



傾向を評価します。



代替案を検討します。



是正を提案または予防処置を講じます。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁じます。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

レッスン5

スケジュール・パフォーマンスの測定:方法

ガントチャート:時間経過に伴うスケジュールのパフォーマンスの追跡。

アード・バリュ(EV):ブランド・バリュ(PV)に対するコストと作業工数のパフォーマンスの追跡

品質マトリックス:品質成果物、欠陥、および受入可能なアウトプットの追跡

差異分析:プロジェクトが本来あるべき位置に対してどこにあるのかを示します

- 現在のイテレーション/スプリントで提供され、承認された作業を、見積りと比較します。
- 定例スプリント・デモで完了した作業をレビューします。
- レトロスペクティブ(振り返り)**において、成果物の生産、検証、および受入率を決定します。
- スケジュールされたレビューを実施し、レトロスペクティブ(振り返り)で発見したことを記録します。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。 145

いくつかの定義



アード・バリュ(EV)

その作業に対して承認された予算で表される、遂行された作業の尺度



品質尺度

品質尺度は、プロジェクトやプロダクトの属性、および品質保証プロセスがそれらへの適合をどのように検証するかを具体的に記述します。



差異分析

ベースラインと実際のパフォーマンスとの間の差異の原因と度合いを決定する技法



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。 146

スケジュール・マネジメント・ツール

- 資源の供給と需要を反映するようにスケジュールを調整します。
- 平準化と円滑化を使用します。
- ファスト・トラッキングやクラッシングを含むスケジュール短縮技法を使用します。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 無断転載を禁ず。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。 147

レッスン5

[illegible]



Learning

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・
プロフェッショナル(PMP)®試験準備コース

知識の伝達と転嫁

レッスン6



Learning

レッスン6







レッスン6

プロジェクトにおける 重要な知識の特定

ECO 1.7.1




知識マネジメント入門

知識は、あらゆる組織にとって不可欠な資産です。個人、チーム、組織の知識により、組織はその役割を果たすことができます。

知識は以下であり得ます：

- プロジェクト固有の情報
- プロジェクトの成果
- 新しいトレーニング



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

知識のタイプ

形式知

言葉、絵、数字を使って
容易にコード化できる情報。

暗黙知

容易にコード化できない情報。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン6

知識共有文化の育成



トレーニング、コーチング、メンタリングはすべて、プロジェクトと組織を前進させる知識共有の形態です。

- チーム・メンバーは互いに学び、教え合います。
- 知識共有の文化は、プロジェクト作業や継続的改善の取り組みの一環として、ステークホルダー、チーム・メンバー、顧客を含むすべての人のためのものです。
- 知識共有に特化したプロジェクトの役割もあります。例えば、**アジャイル・コーチ**やスクラム・マスターです。
- 知識共有の文化は、プロダクト納入と移管計画において不可欠です！



アジャイル・コーチ

アジャイルの知識と経験を持ち、組織とチームの変革をトレーニング、メンタリング、指導できる個人。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

7

プロジェクト・マネジャーの役割

知識マネジメントにおける
プロジェクト・マネジャーの役割：

- チームを維持し、知識を転嫁します。
- さまざまな知識転嫁のアプローチを特定します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

8

知識の収集

ECO 1.7.2



レッスン6

知識の収集

プロジェクトにおける知識の収集とは、プロジェクトの目標を達成するために重要な情報を体系的に収集、分析、共有することです。このプロセスは、情報に基づいた意思決定を確実にし、効率を高め、リスクを軽減するのに役立ちます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

10

知識マネジメントの3つのレベル

		
個人	プロジェクト	組織
チーム・メンバーは、プロジェクト作業を行うために何を知る必要があるか？	プロジェクトの目標を達成するために何が必要か？	プログラムやポートフォリオをマネジメントするには何が必要か？
トレーニングや協働を通じて必要な知識を習得するよう、従業員を奨励し、サポートします。	レトロスペクティブ（振り返り）を実施し、組織のプロセス資産など、現在およびその他のプロジェクトからの教訓を提供します。	他のプログラムやポートフォリオから知識を適応させ、実証済みの実務慣行を組み込みます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

11

知識転嫁のための環境を育成する

ECO 1.7.3



レッスン6

資産としての知識のキュレーション

アーカイブして共有するために**形式知**を文書化します。
個人が**暗黙知**を共有し、協働することを奨励します。
知識をチームと組織にとっての資産として扱います。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

13

知識転嫁の機会を組み込む

- ネットワーキング
- 特定分野の関心グループ—例えば、**コミュニティ・オブ・プラクティス**
- 会議、セミナー、またはその他の対面およびバーチャル・イベント
- トレーニング
- **作業観測**



コミュニティ・オブ・プラクティス



共通の関心を持つ個人の集団であり、共通の活動に参加し、知識を交換し、共通の実務慣行や資源を開発することによって学習します。

作業観測



直接観察方法のひとつ。観察者が被観察者の職場環境における仕事、タスク、またはプロセスの遂行を観察します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

14

知識の転嫁

動画登録簿

ネットワーキング

コミュニティ・オブ・プラクティス

会議、セミナー、その他の対面イベント

トレーニング

作業観測



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

15

レッスン6

終結時の知識マネジメント

-

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

教訓の最終化

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. PMBOK® is a registered trademark of Project Management Institute, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

レッスン6

教訓の集約

次の教訓のカテゴリーは、プロジェクトの
終結時に特に重要です：

- スケジュールリング
- コンフリクト・マネジメント
- 顧客とベンダー
- 戦略的
- 戦術的

これらを教訓リポジトリに転記します。



PM Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

19

所産概要最終報告書

説明	成果物やマイルストーンを含む、実施したアクティビティを説明します。
スコープの目標	スコープの評価基準を文書化し、完了基準を満たした証拠を示します。
品質目標	プロジェクトとプロダクトの品質の評価基準を説明します。目標が達成されていることを確認し、実際のマイルストーンの納期と、差異がある場合はその理由を示します。
コスト目標	許容コスト範囲を再確認し、実際のコストと差異の理由を説明します。
妥当性確認情報	最終プロダクト、サービス、または所産に必要な承認を含めます。例：ユーザー満足度調査の結果。
スケジュールの目標	プロジェクトの目標がスケジュール通りに達成されたか検証し、差異やその影響について報告します。
成果価値の実現	最終的なプロダクト、サービス、または所産がどのようにビジネス・ニーズと期待されるベネフィットを達成したかを明らかにします。部分的な場合は、差異と達成スケジュールの詳細を示します。
遭遇したリスクや課題	リスクと課題を列挙し、それらにどのように対処したかを述べます。

PM Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

20

PMP®

コミュニケーション の計画と管理

ECOタスク1.8

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.

PM Learning

レッスン6

コミュニケーション戦略 の定義

ECO 1.8.1



キックオフ・ミーティング

目的

- ・ プロジェクトのコンテキストを確立します。
- ・ チーム結成を支援します。
- ・ チームとステークホルダーをプロジェクトのビジョンに整合させます。

組織／公衆

- プロジェクトの立上げを発表します。
- ハイレベル／上位レベルのビジョン、目的、価値に関する理解を共有します。
- プロジェクトのスポンサー、主要ステークホルダー、プロジェクト・マネジャーを特定します。
- プロジェクト憲章からのハイレベル／上位レベルの項目を含めます。



内部／チーム—合意が最終決定した後に行います

- ・ プロジェクト憲章の概要を説明します。
- ・ チーム・メンバーの役割と責任を明確にします
(初期のチーム憲章を含む場合があります)。



- ・ 計画作業の結果を提示します。



- ・ プロダクト・バックログを開始します。



- ・ プロダクト・ロードマップを提示します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI resource.

チームコミュニケーション

効果的なコミュニケーションの種類には以下が含まれます:

- 口頭
- 書面
- 行動
- 物理的(掲示板)
- バーチャル

プロジェクト憲章にコミュニケーションの期待事項と詳細を含めます。

コミュニケーションを整理することは、プロジェクト・マネジャーとしての役割の重要な部分です：

- ・チームとステークホルダーの協働を促進します。
- ・期待のマネジメントをします。
- ・定期的にチェックして、うまくいっていることを確認します。
- ・コミュニケーションの改善について話し合うために、レトロスペクティブ(振り返り)を計画して活用します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. 24
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン6

コミュニケーションの最適化



- ・レトロスペクティブを目的意識を持って活用し、働き方の改善方法について話し合います。
- ・グループと1対1の両方の場でコミュニケーションを行うことは、特にリモート・チームやバーチャル・チームにとって重要です。
- ・内外のチーム・メンバーやステークホルダーとのコミュニケーションを前向きで一貫性のあるものにします。
- ・テクノロジーとツールを使用し、フィードバックを得て調整し、それらを最適化します。

❗ 「チームはコミュニケーションに関する期待をどこに記録したか」？

「チーム憲章に」！



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

25

フィードバックを活用して高いパフォーマンスを支援する

- ・フィードバックは、どのような環境でも、どのような方法でも、どのチームにとっても非常に重要です。
- ・技術的なパフォーマンスとソフトなパフォーマンスの側面について詳細にコミュニケーションします。
- ・適切な方法を使用します（公開または非公開、個人またはグループ、文書または口頭など）。
- ・タイムリーにフィードバックを行います。
- ・フィードバックを、定期的に、そして必要に応じて要請します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

26

プロジェクト・マネジャーの主な責任

- ・スケジュール・ベースラインを使用してスケジュールを**実行**します。
- ・ベースラインに対する進捗とパフォーマンスを**監視**します。
- ・状況と変更を**伝達**します。
- ・是正処置と予防処置を**適用**します。
- ・ステークホルダーと文書を**更新**します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

27

レッスン6

透明性と協働の促進

フィードバック・ループの確立

報告要求事項の理解

ECO 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4



プロジェクト環境の評価



プロジェクトのタイプ

予測型アプローチでは、より指示的または権威的なリーダーシップが求められるかもしれません。

適応型アプローチは、サーバント・リーダーシップ、権限委譲、ファシリテーションから恩恵を受けます。



複雑さ

複雑度の高いプロジェクトでは、多様なステークホルダーを調整するために、協働型または変革型のスタイルが必要になることがあります。



緊急度

危機的状況では、少なくとも短期的には、より決断力のある独断的なリーダーシップが求められるかもしれません。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

チームのニーズを理解する



スキルと経験

経験の浅いチームには、より多くの指導と構造が必要かもしれません。

専門家チームは、自律性と信頼によってより良いパフォーマンスを発揮する可能性があります。



動機づけ

感情的知性を使って、チームのムード、ストレスレベル、モチベーションを読み取ります。

士気の低さには、変革型またはコーチング・スタイルが必要かもしれません。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン6

組織文化



権威主義型または参加型

リーダーシップ・スタイルは、組織の規範と矛盾してはなりません。



ステークホルダーの期待

上位のステークホルダーは、より構造化された進捗報告や、より厳格なコントロールを期待する場合があります。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

リーダーシップ・スキルとコンピテンシー

- コミュニケーション
- コンフリクト・マネジメント
- クリティカル・シンキング
- 文化的な認識
- 意思決定
- 感情的知性 (EI) の技法
- 倫理的なアプローチ
- PMI倫理・職務規程
- ファシリテーション
- 会議のマネジメント
- 交渉
- ネットワーキング
- チーム形成



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

適切なリーダーシップ・スタイル

適切なリーダーシップ・スタイルの決定は、プロジェクトのコンテキスト、チームのニーズ、組織環境によって異なります。

つまり、その時点でチームとプロジェクトを最もサポートするアプローチを選択するということです。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン6

包括的なリーダーシップ・コンピテンシーを開発するためのガイドライン

- ・リーダーシップのアプローチやスタイルをテラリングします。
- ・共感をもってリードします。
- ・動機付けや作業スタイルが異なることを理解します。
- ・透明性とオープン性を維持し、信頼を築きます。
- ・外部リソースが確実に含まれるように支援します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

34

リーダーシップ・モデルの活用

スタイル	次の場合に最適です:	特性
指示型	迅速な意思決定が求められ、チームには構造が必要です。	明確な指示を与え、プロセスをコントロールします。
支援型	チームは、より多くの動機付けまたは士気の向上を必要としています。	信頼を築き、ウェルビーイングに焦点を当てます。
サーバント型	適応型または協働的な環境において。	チームに力を与え、障害を取り除きます。
変革型	変革が必要であり、ビジョンを伝える必要があります。	鼓舞し、共通の目的を一致させます。
取引型	パフォーマンスを厳密に管理する必要があります。	成果に基づく報酬または罰。
民主型	議論においてチームのインプットは貴重です。	参加と合意を促します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

35

リーダーシップ・スタイル:テラリングの考慮事項

- ・プロジェクトのタイプに関する経験
- ・チーム・メンバーの成熟度
- ・組織のガバナンス構造
- ・分散型プロジェクト・チーム

スタイル	特性
直接型	プロジェクト・マネジャーがすべての意思決定を行う階層型。
コンサルタント型	リーダーは意見を取り入れますが、意思決定は行います。
サーバント・リーダーシップ	リーダーは望ましい行動をモデル化します。
合意／協働	チームは自律的に運営されます
状況適応型	状況やチームの成熟度や経験に合わせてスタイルを変更します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

36

レッスン6

リーダーシップ ≠ マネジメント

リーダーシップ—ディスカッションやアイデアの交換を通じてチームを導きます
マネジメント—あらかじめ定められた一連の行動を用いて行動を指揮します

チームをリードするには、次のことが必要です：

- ・ 状況やステークホルダーに対応したリーダーシップ・スタイルを発揮する。
- ・ 個人とチームの力関係や仕事上の人間関係を認識する。
- ・ 政治的な認識と感情的知性を活用する。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

37

サーバント・リーダーシップ

- ・ マネジメントするのではなく、ファシリテーションを行う。
- ・ コーチングとトレーニングを提供する。
- ・ 作業の障害を取り除く。
- ・ 成果に焦点を当てる。
- ・ 各チーム・メンバーにサーバント・リーダーになるよう奨励します。



サーバント・リーダーシップ

可能な限り最高のチーム・パフォーマンスを実現するために、チーム・メンバーのニーズの理解と対応、育成に重点を置いてチームを導く実務慣行です。

☆☆☆☆



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

38

成長マインドセットの採用

- ・ 過去の経験やプロセスが行動の指針となるようにしますが、それに支配されないようにします。
- ・ 新しいアイデアや視点を見つけるために、継続的に改善し革新することにコミットします。
- ・ ディスカッションと内省を通じて、最良のアプローチを発見します。
- ・ 自己満足と盲目的な受け入れを避けます。



成長マインドセット

スタンフォード大学の心理学者キャロル・ドウェックらが考案した成長マインドセットとは、人の能力や才能は時間をかけて向上させることができるという信念です。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

39

レッスン6

パワー・スキル

プロジェクト専門家は、協働のリーダーシップ、コミュニケーション、革新的な考え方、目的志向、共感などの人間関係のパワー・スキルを使用します。

これらのスキルを持つチームは、さまざまなステークホルダーとの影響力を維持することができます。これは、変革を行うための重要な要素です。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

人間関係とチームに関するスキル

- ・ 積極的傾聴
- ・ コミュニケーション・スタイルの評価
- ・ 感情的知性(EI)
- ・ 影響を与える
- ・ 動機づけ
- ・ ノミナル・グループ技法
- ・ 政治的認識
- ・ 透明性

積極的傾聽



彼の個人と関わる際に、注意深く参加します。それには、話し手の言ったことを自分の言葉で繰り返したり、言い換えたりして理解を確認する、非言語的な合図を使って自分が話に引き込まれていることを示す、必要に応じて説明や拡張を求める、といった具体的なスキルが含まれます。

コミュニケーション・スタイルの評価



計画されたコミュニケーション活動において、ステークホルダーにとって望ましいコミュニケーションの方法、形式、内容を特定する技法です。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

チーム形成

- ・ 結束と団結力は、チームのパフォーマンス向上に役立ちます。
- ・ 優れたリーダーシップは、プロジェクト・チームメンバー間の結びつきを促進します。
- ・ チーム形成活動は、団結、信頼、共感を育み、個人よりもチームに焦点を当てます。
以下の可能性があります：

- 正式または非公式
- 短期または長期

- ・ 自分自身またはプロのファシリテーターによってファシリテートされる

「チーム形成に成功した経験の例を挙げられますか？」



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. 42
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン6

緊急性

- 

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン6

報告ツール



報告要求事項を明確にするための便利なツール：

- ・ **プロジェクトマネジメント情報システム (PMIS)**：プロジェクトのデータの収集、統合、配布を支援します。
- ・ **自動報告ツール**：重要業績評価指標 (KPI) の収集と分析を合理化します。
- ・ **要求事項マネジメント・ツール**：報告要求事項の効果的な把握と保管を促進します。
- ・ **視覚化ソフトウェア**：データをわかりやすいビジュアルに変換し、ステークホルダー向けのプレゼンテーションに活用します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

スポンサーとステークホルダー の期待に沿った報告書の作成

報告およびガバナンス・プロセス の支援

ECO 1.8.5, 1.8.6



情報マネジメント・システム

プロジェクトマネジメント情報システム (PMIS)

- ・ プロジェクトのデータを収集、統合、共有します。
- ・ 収集と報告の一貫性を確保するのに役立ちます。

作成物 マネジメント・システム

- ・ プロジェクト文書類を保管し、維持管理します。

Microsoft Projectまたは同等
のソフトウェア



Microsoft SharePointまたはTeams
Googleドライブ



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン6

ガバナンス・プロセスの支援

コミュニケーションの計画と管理を行う際には、ガバナンス・プロセスを含めることについて学んだことを考慮することが重要です。レッスンで得た重要なポイントを思い出しましょう。

- ガバナンスとコンプライアンスに積極的に取り組みます。
- 適切な関係者と頻繁にコミュニケーションを取ります。
- 可能な限り透明性を高めることで、今後の問題を軽減できます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン6終了



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.



Learning

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・
プロフェッショナル(PMP)®試験準備コース

チームの指揮 および支援

レッスン 7



Learning

レッスン7








レッスン7

コンフリクトの原因の特定


コンフリクトのコンテキスト分析

ECO 1.2.1 および 1.2.2



コンフリクトの要因:コンテキスト

- ・ 競合
- ・ 目標、価値観、認識の違い—これらはイデオロギー的なものになり得ます。
- ・ 役割の要求事項、作業アクティビティ、個人のアプローチに関する意見の相違
- ・ コミュニケーションの断絶
- ・ プロジェクトがユニークで、チームメンバーは一緒に働いたことがない



チーム文化の一部としてのコンフリクト

心理的に安全な職場環境では:

- ・ 混乱とイノベーションはつながっていると考えます。
- ・ 交流と意見の相違を奨励します。
- ・ コンフリクトへのエスカレーションを防ぎます。




レッスン7

リースのコンフリクトレベルを使用する

コンフリクトは、レベル1から5へと段階的に激化します。

コンフリクトは、解決の可能性があるタスク指向から、解決がほぼ不可能な手に負えない解決策へと発展する可能性があります。

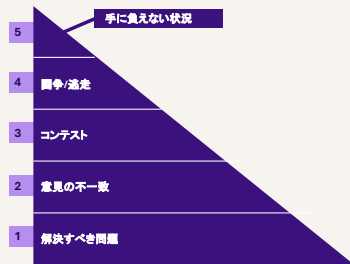

Leiss, S. B. (1983). Leadership and conflict. Abingdon Press.



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

合意された 解決戦略の実施

ECO 1.2.3



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

コンフリクトへの対処



チーム憲章と行動規範に記載された、望ましいコンフリクト・マネジメント方法を使用します。チームを支援するための指導と資源を提供します。



アジャイル・チームは、仕事のやり方にコンフリクト・マネジメント戦略を組み込み、信頼の文化によって支えられています。



「個人ではなく課題に焦点を当てます」。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

レッスン7

コンフリクト・マネジメントが重要な理由



コンフリクト・マネジメントが効果的でないと、以下のようなことにつながります：

- 破壊的な行動
- 敵意
- 低パフォーマンス
- 生産性の低下

効果的なコンフリクト・マネジメントは、以下をもたらします：

- 理解の向上
- より良いパフォーマンス
- 生産性の向上



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

10

コンフリクト・マネジメントの原則を チームおよび外部ステークホルダーに伝える

ECO 1.2.4



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

11

コンフリクト・マネジメントの原則の伝達

コンフリクトの共通理解の促進

行動規範の早期の確立

一般的なコンフリクト・マネジメントのスタイルの説明

ツールとルーティンによるコンフリクトの
解消のサポート

外部のステークホルダーの効果的な関与の促進

プロジェクト全体を通じた原則の強化



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

12

レッスン7

共通の行動規範の順守を促進する 環境の確立

グループのルール違反の管理と是正

ECO 1.2.5 およ 1.2.6



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

13

人間関係のスキルを使ったコンフリクトマネジメント

感情的知性	共感を用いて状況を理解し、和らげます。
影響を与える	相手の口調やアプローチ、考え方について、考え直したり、変更するよう説得します。
リーダーシップ	他者をよりポジティブな方向に導きます。
意思決定	状況を前進させるソリューションを提示します。
積極的傾聴	個人的で非難的な言葉遣いや辛辣で刺々しい口調、防衛的または攻撃的な身体的姿勢に注意します。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

14

コンフリクト・マネジメントのアプローチ

鎮静や対応	- 合意している点を強調します。 - 調和と関係を維持するために、立場を譲ります。
撤退や回避	- 状況から退きます。 - 課題を先送りにします。
妥協/調整	- 複数の視点を取り入れます。 - 協力的な態度やオープンな対話を促し、合意とコミットメントを実現します。
強制/直接	- 他人を犠牲にして自分の見解を追求します。 - 勝ち負けの解決策のみを提供します。
協働/ 問題解決	- さまざまな視点からの複数の見解や洞察を取り入れます。 - 協力的な態度とオープンな対話が必要です。 - 一般的に合意とコミットメントにつながるソリューションを探します。





© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

15

レッスン7







レッスン7

組織の文化を考慮する



権威主義型または参加型

リーダーシップ・スタイルは、組織の規範と矛盾してはなりません。



ステークホルダーの期待

上位のステークホルダーは、より構造化された進捗報告や、より厳格なコントロールを期待する場合があります。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

19

ハイブリッド・チームのためのアジャイル・スペースの創造



コロケーション、協働、コミュニケーション、**透明性**、可視性を促進するチーム・スペースを作ります。



「一人で作業する必要がある人のために、プライベートな空間を確保します」。



透明性

プロジェクトのライフサイクル全体を通じて、コミュニケーション、プロセス、意思決定において可視性とオープン性を維持する実務慣行です。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

20

チーム憲章と行動規範の遵守

チェックリスト

- ・ ルールは目に見えるものか？
- ・ 状況の変化により、ルールを更新する必要があるか？
- ・ 新しいチーム・メンバーは適切に迎えられているか？



「チームはどんな変化の後でも「成立期」を経験するものです」

- ・ 行動規範が違反または破棄されているか？
 - ・ 適切な対応を確実にします。
 - ・ チーム・メンバーに相互合意について再認識させます。
 - ・ チーム・メンバーをコーチします。
 - ・ サーバント・リーダーシップを活用します。
 - ・ 厳しい懲戒処分は、重大な違反の場合にのみ取っておくべきです。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

21

タスクの責任を示す



作業と進捗を常に可視化し、完了した作業の透明性を示します。


- ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャー (WBS) 辞書とワーク・パッケージの説明文書には、タスクと割り当てられたメンバーが記載されます。
- RACI (実行責任、説明責任、相談対応、情報提供) マトリックス は、役割と責任を示します。



チーム・メンバーが説明責任の基準を決める際に継続的に自己組織化するよう促します。



協働的なチーム文化の構築



プロジェクト・マネジャー

- プロジェクト・マネジャーは、個々人が協力し合い、相互作用から価値を得られる文化を支えるためのチームの合意事項、構造、プロセスを構築します。
- プロジェクト・マネジャーは、**資源マネジメント計画書をテラリング**します。



チーム:


- チームは、プロジェクトに対する要求事項をサポートするために集まり、自己組織化します。
- チームはチーム合意とチーム憲章を使用します。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

プロジェクト・チーム結成ビデオ

タックマンのグループ発達段階



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

レッスン7

自己組織化: チームチームの目標を達成するために、必要に応じて流動的にリーダーシップを発揮する人々から成る**機能横断チーム**です。

サーバント・リーダースhip: チームのパフォーマンスを最大限に引き出すために、チーム・メンバーのニーズを理解し、チーム・メンバーの育成に取り組むことに重点を置いてチームをリードする実務慣行です。

①「これらの概念は、あらゆる種類のプロジェクト・チームに適用できます」。

価値ある成果物の増分を提供するために必要なすべてのスキルを持つ実務者を含むチームです。



期待の確立

チームレベルの期待を設定する前に、
チームが以下を理解していることを確認します：

- ・プロジェクトの全体目標
- ・プロジェクトの背景にある理由
- ・彼らの仕事が事業価値にどのように貢献しているか
- ・成功基準



期待の確立の重要性

期待が明確に伝えられ、一貫して強化されている場合：

- ・ チーム・メンバーが自分の役割を理解します。
- ・ 説明責任が高まります。
- ・ 協力が強化されます。



レッスン7

期待の確立

役割と責任を定義します。

パフォーマンスと行動への期待を設定します。

期待する行動の規範を示します。

ツール、プロセス、コミュニケーションの規範を整合させます。

進捗状況がどう追跡されるかを伝えます。



PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

28

チームの強みに焦点を当てる

- メンバーの強みを意識してチームを作ります。
- 弱点を認識します。
- チームの成功を脅かす脅威や、チームのパフォーマンスを向上させる機会を特定します。

SWOT (強み、弱み、機会、脅威) 分析



PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

29

チームの規範

プロジェクトの開始時に、チームとして期待される行動をともに確立します。チームが後で課題に対処できるようにします。

以下のガイドラインと技法を含みます：

- 会議
- コミュニケーション
- コンフリクト・マネジメント
- 共有価値
- 意思決定

チームの価値観を「PMI倫理・職務行動規程」と整合させます

PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

30

レッスン7

チーム憲章と行動規範



チーム憲章は、チームとともに作成する文書で、以下のような内容を含むことがあります：

- 共有された価値
- パフォーマンスの期待値
- 行動規範
- コンフリクト解決のための措置
- コミュニケーションとツールの使用に関するガイドライン
- 会議の時間、頻度、チャネル
- 意思決定のガイドライン
- その他のチームの合意事項

チーム憲章



チームの意義、合意、運用指針を記録した文書であり、プロジェクト・チーム・メンバーに受け入れられる振る舞いへの明確な期待を確立するものです。

行動規範

プロジェクト・チーム・メンバーによる受容可能な行動に関する期待事項のことです。



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

31

チームの役割と責任: レビュー演習



プロジェクト・マネジャー

ANG FEN



TEAM



スクラム・マスター/ アジャイル・コーチ

GREER



プロダクト・オーナー

HELEN



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

32

チームの力を高める

ECO 1.3.2



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

33

レッスン7

チームのニーズを理解する



スキルと経験

経験の浅いチームには、より多くの指導と構造が必要かもしれません。

専門家チームは、自律性と信頼によってより良いパフォーマンスを発揮する可能性が高いです。



動機づけ

感情的知性を使って、チームのムード、ストレスレベル、モチベーションを読み取ります。

士気の低さには、変革型またはコーチング・スタイルが必要かもしれません。

エンパワメント、結束、そして自律性

- チームに、仕事にオーナーシップを感じ、協力して意思決定を行い、責任を共有する力を与えます。
- 個人の貢献よりもチームの団結を優先します。
- チームに自律性を与えて信頼を示し、鼓舞し、生産性を向上させます。

ゴールチームが自分たちの力と影響力を認識すること。権限を与えられた結束力のあるユニットとして、チームメンバーは互いに依存し合い、迅速に望まれる価値を提供するための意思決定や問題解決を行います。



リーダーシップ・モデルの活用

スタイル	次の場合に最適です:	特性
指示型	迅速な意思決定が求められ、チームには構造が必要です	明確な指示を与え、プロセスをコントロールします。
支援型	チームは、より多くの動機づけまたは士気の向上を必要としています。	信頼を築き、ウェルビーイングに焦点を当てます。
サーバント型	適応型または協働的な環境において。	チームに力を与え、障害を取り除きます。
変革型	変革が必要であり、ビジョンを伝える必要があります。	鼓舞し、共通の目的を一致させます。
取引型	パフォーマンスを厳密に管理する必要があります。	成果に基づく報酬または罰。
民主型	議論においてチームのインプットは貴重です。	参加と合意を促します。

レッスン7

チーム形成

- ・ 結束と団結力は、チームのパフォーマンス向上に役立ちます。
- ・ 優れたリーダーシップは、プロジェクト・チームメンバー間の結びつきを促進します。
- ・ チーム形成活動は、団結、信頼、共感を育み、個人よりもチームに重点を置きます。以下の可能性があります：
 - ・ 正式または非公式
 - ・ 短期または長期
 - ・ 自分自身またはプロのファシリテーターによってファシリテートされる



「チーム形成に成功した経験の例を挙げられますか？」



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

37

タックマンのチーム開発段階



成立期

チーム・メンバーが出会い、互いを信頼し始めます。

動乱期

チーム・メンバーが自信を持って発言し、浮上する課題をコントロールし始めます。

規範化

チームは、個人的な受け入れやコントロールの問題を気にすることなく、生産的に作業を開始します。

遂行期

チームは最適な生産性で活動し、容易に協業し、自由にコミュニケーションをとり、自らのコンフリクトを解決しています。

解散

チーム・メンバーは割り当てられた作業を完了し、次のプロジェクトや割り当てられたタスクに移行します。

Tuckman, B. W., & Jensen, M. A. C. (1977). 小グループ開発の段階を再検討済み。『グループ&組織研究』, 2(4), 419-427.



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

38

バーチャル・チーム・メンバー・エンゲージメント

- ・ 以下に焦点を当ててエンゲージメントを管理します：
 - ・ チーム・ダイナミクス
 - ・ 透明性
 - ・ 説明責任
- ・ 効果的なコミュニケーションに注意を払います。
- ・ ビデオ会議ツールを使用し、適応させます。
- ・ 積極的な参加を確認し、ボディランゲージや口調を評価します。
- ・ ツール(カンバン・スタイルのボードなど)を使って、作業と作業状況の可視化を可能にします。




© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

39

レッスン7

バーチャル・チームの良い実務慣行

- 孤立感のリスクを管理します。
- 個人の達成ではなく、共有されたコミットメントとチーム・ゴールに焦点を当てます。
- コミットメントの共有意識を植え付けます。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保有します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

チームがどこでどのように働くか

- 可能ならコロケーションがベストです！
- チームのパフォーマンスを評価する際には、環境と場所を考慮します。
- 自律性をサポートするために、有意義な交流を促進します。
- 合意されたチームの勤務時間と実務慣行（行動規範）を尊重します。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMA) 全ての権利を保有します。 41
本資料はPMAフォームの一環として提供されるものです。

動機づけ理論とアプローチ


- ・ マズローの欲求階層
- ・ ハーズバーグの動機づけ・衛生理論
- ・ マクレガーのX理論とY理論
- ・ マクレランドの達成動機づけ理論



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保有します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

レッスン7

マズローの欲求階層




Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation (人間の動機づけの理論). *Psychological Review*, 50(4), 370-396.



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保有します。 42
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

ハーズバーグの動機づけ・衛生理論
二要因理論とも呼ばれます。



Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1969). *The motivation to work* (2nd ed.) (仕事への動機づけ (第2版)). John Wiley & Sons.



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保有します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

マクレガーのX理論とY理論

X理論
(独裁的)

- ・ 労働者は仕事を嫌い、避けます。
- ・ 人は責任の増加を避けます。
- ・ 人は指示される必要があります。

理論Y
(参加型)

- ・人はアクティブでありたいと思うものです。
- ・労働者は仕事の満足を求めます。
- ・彼らは指示を必要としません。



X理論マネジャーはしばしば「古臭い」と言われますが、このマネジメントスタイルが役立つ現代の文脈を思い浮かべられるでしょうか？

McGregor, D. (1960). *The human side of enterprise* (組織の人間の側面). McGraw-Hill.


© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保有します。 45
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

レッスン7

マクレランドの達成動機づけ理論

個人のニーズは、3つの領域における人生経験によって形成され、1つが優位になります：

- この情報を利用して、目的の設定、フィードバック、動機づけ/報奨システムに反映させます。
- チーム・メンバーの強みに基づいて役割を設計または作成します。
- T字型の人材と高パフォーマンスのプロジェクト・チームを生み出すためのバランスの必要性を特定します。



McClelland, D. C. (1961). The achieving society (達成社会). D. Van Nostrand Company.



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

46

感情的知性のドメイン




Coleman, D. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ (感情的知性:なぜIQより重要になりうるのか). Bantam Books.



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

47

これらのドメインを生きる



Coleman, D. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ (感情的知性:なぜIQより重要になりうるのか). Bantam Books.



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

48

レッスン7

感情的知性のコンピテンシー

自己認識	自己管理	社会的認識	リレーションシップマネジメント
感情的自己認識	感情の自己制御	共感	影響
	適応力		コーチとメンター
	達成志向	組織の認識	コンフリクト・マネジメント
	ポジティブな見通し		チームワーク
			インスピレーション・リーダーシップ

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ (感情的知性:なぜIQより重要になりうるのか). Bantam Books.



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保有します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

共感

- 他者の動機を理解する基盤を提供します。
- 協力的で高いパフォーマンスを発揮するチームに貢献することをより可能にする共感的特性：

内向き(個人を助けます)

- ・ 他者を理解する
- ・ サービス指向



共感

他者の感情、考え、経験を理解し、認識し、
敏感になり、追体験することです。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保有します。 50
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

ソーシャルスキル

高いパフォーマンスを発揮するチームメンバーは、次のような能力に長けています：

- ・ コミュニケーション
- ・ 絆を築く
- ・ 協働と協力
- ・ 変革の促進
- ・ コンフリクトの管理
- ・ 影響を与える
- ・ リーディング



© 2025 プロジェクトマネジメント協会(PMI)全ての権利を保有します。 51
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

レッスン7

動機づけ要素



達成/推進

- ・ 厳しい目標を設定し、チャンスを掴みます。
- ・ 成功を目指します。
- ・ スキルアップの方法を発見します。
- ・ 不確実性を最小限に抑えます。



コミットメント

- ・ チームの基本原則に基づいて意思決定を行います。
- ・ ホリスティックな参加のベネフィットを実現します。
- ・ 会社のゴールを達成するために犠牲を払います。
- ・ チームのミッションを達成する機会を探します。



イニシアティブ

- ・ ゴールに向かって懸命に働きます。
- ・ 卓越した成果を通じて、他者を鼓舞します。
- ・ 好機をつかみます。



素権主義

- ・ 成功を望み、失敗を恐れません。
- ・ 逆境や失敗を自分のコントロール下にあると捉えます。
- ・ 障壁に関係なく、目標に向かって努力します。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

52

チームを動機づける正しい方法を学ぶ



すべきこと

- ・ 自分自身とチームを鼓舞し、やる気を起こさせます。義務ではなく機会を提供する。
- ・ パーチャル・チームとは、常にかつ定期的に連絡を取り合うようにする。
- ・ 適切なトレーニングの機会を提供する。
- ・ 自己評価と内省の時間を試み、プロとしての成長を図る。

すべきでないこと

- ・ チームを会議や作業の中断で圧倒する。
- ・ プロジェクト以外の作業でチーム・メンバーの気を散らす。
- ・ グループ・アクティビティを強制する。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

53

問題解決

ECO 1.3.3




© 2025 プロジェクトマネジメント協会全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

54

レッスン7

意思決定: チームに行動する力を与える

- チーム憲章は、意思決定とコンフリクトの解消基準を明確にしています。
- チームは、意思決定やコンフリクトの解消のための独自の規範や働き方を確立します。
- チームは常に合意を達成しようとしています。



PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

55

意思決定: チームに力を与える機会

アクティビティ

- 要求事項やユーザー・ストーリーを明確化し、優先順位をつけます。
- 要求事項をタスクに分割します。
- 作業工数を見積もります。

リスク

- 分類
- 対応



「チームの意思決定によって対処できる他の課題は思い浮かびますか？」

PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

56

意思決定方法

投票

データに基づくコンセンサス重視

- 集団での意思決定とアセスメント
- いくつかの代替案を決定し、期待される成果として将来のアクションを決定します。
- プロダクト要求事項の生成、分類、優先順位付けに使用します。

多基準意思決定分析

データ主導型

- 方法—意思決定マトリックスで基準を設定します。
例: リスクレベル、不確実性、評価
- 体系的で分析的なアプローチを使用する
- 多くのアイデアを評価し、順位付けします。

独断的な意思決定

データに基づくリーダーシップ主導

1人のチーム・メンバーがグループのために決定します。

PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

57

レッスン7

意思決定方法: 投票

満場一致

全員が単一のアクションコースに同意します。結束力の高いプロジェクト・チームで有効です。
例: デルファイ法

過半数

グループの50%を超える支持を得た決定です。意思決定を確実にし、同票や引き分けを避けるために、参加者の人数を奇数にしてグループを作ります。

相対多数

グループ内で最大勢力の意見に従って決定を下す方式です。多数派に達していなくても適用されます。2つ以上の選択肢が挙げられた場合に、この方法を使用します。



合意に達するための「投票方法」

- ・ フォレスト・オブ・ファイブ
- ・ ブランニング・ポーカー
- ・ ドット投票
- ・ ローマ式投票 (親指)
- ・ ポーリング



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

58

報奨と表彰の活用

報奨

- ・ 有形の物理的な品目
- ・ 特定の成果や達成のため
- ・ 特定の成果に向けて動機づけるために使用します。
- ・ 認識なしに報奨を与えてはいけません！

表彰

- ・ 無形の体験イベント
- ・ 成果ではなく、その人の行動を認めます。
- ・ 受取人が感じる感謝の気持ちを高めるために使用します。
- ・ 報奨なしで与えられます。



「報奨と表彰を使用する際には、透明性を持ち、慎重に行います。競争心の行き過ぎや敵意による悪影響がないか監視します」。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

59

チームの声を代表する

ECO 1.3.4



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

60

レッスン7

プロジェクト・チーム・リーダーシップの目標



プロジェクトの目標を伝える(そして再度伝える)。
円滑な知識共有と継続的で健全なチームのダイナミックを確保するのに役立ちます。
これには、新しいチーム・メンバーを歓迎し、チームを再編成することが含まれます。
チームを価値の提供に集中させます。




© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

61

目標、許容度、しきい値による管理

より生産性が高く、意欲的なチームを作るために、プロジェクト・ライフサイクルを通じて、明確な目的のある、明確で効果的なコミュニケーションを行います。
エスカレートすることなく、効果的に変動をマネジメントするためのしきい値と許容度を知りましょう。



これが適用されるのは:

- 予算
- スケジュール
- 品質
- 非機能要求事項



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

62

集中モデルにおけるプロジェクト・マネジャーの役割

- 進捗を測定し、監視し、適切なアクションを取ります。
- プロジェクト情報を収集、分析し、関係するステークホルダーに伝達します。
- すべてのプロジェクト作業の完了を確実にし、各フェーズ、契約、およびプロジェクト全体を正式に終結させるのに役立ちます
- 必要に応じたフェーズ移管管理
- プロジェクトの成果物、プロジェクト・ライフサイクル、ベネフィット実現計画書の期日が確実に整合するのを助けます
- プロジェクトマネジメント計画書を提供します
- プロジェクトとの間での適切な知識の創造と活用を確実にするのに役立ちます
- プロジェクト・パフォーマンスとプロジェクト活動への変更を管理します
- プロジェクトに影響を与える重要な変更について、統合された意思決定を行います

❗ 「これらのタスクは委任できません。」



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

63

レッスン7

多様性と包括性のサポート

ECO 1.3.5



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

64

バランスのサポート

結束したユニットとしてチームに力を与えますが、個人を尊重します。

チームのバランス育成目標には、以下のようものがあります：

- コストや時間の削減と品質向上のためのチームの知識とスキルの向上
- チームの士気を高め、コンフリクトを減らし、チームワークを向上させるための信頼関係の強化
- 個人とチームのパフォーマンスを向上させ、クロストレーニングとメンタリングを促進するための協働的な文化を構築
- チームが意思決定に参加し、自ら作成したソリューションを所有できるようにする



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

65

心理的安全性の創出とバランスの受容

心理的安全性は、パフォーマンスの高いプロジェクト・チームに要求される心理社会的な状態です。

チームメンバーは、職場で自分らしくいることに安心感を持つべきです。

健全な作業環境：

- **独自性**が受け入れられます。
- **信頼と相互の尊重**に基づいて構築されます。
- **倫理的な意思決定**を支援します。



心理的安全性

地位、キャリア、自己価値への否定的な影響を恐れることなく、自分自身を表現し、活用できること—私たちは職場で自分らしくいることを快適に感じるべきです。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

66

レッスン7

バランスの取れた、公正で信頼できるチームを作るための標準

- チームはグローバルで、文化、性別、身体能力、言語、その他多くの要素が異なります。
- プロジェクト環境は、チームのさまざまなスキルや能力を最適化し、相互信頼の風土を醸成します。



PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

67

コロケーション、バーチャル、ハイブリッド・チーム



バーチャル・チーム

- ほとんどの職場で当たり前になっています
- より低コストでより良いスキル
- 引越し費用の回避
- より良いワークライフ・バランス
- コミュニケーション技術に依存
- 結束の課題があるかもしれません



バーチャル・チーム

プロジェクト・チーム・メンバーは、対面でのミーティングにほとんど時間をかけずに、それぞれの役割を果たします。

コロケーション・チーム

- やり取りは簡単です。
- より良い絆が促進されます。
- 物理的なツールや掲示板の使用が可能です。



コロケーション・チーム

プロジェクト・チーム・メンバーは、コミュニケーション、作業関係、生産性を向上させるため、互いに近い場所に配置されます。

PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

68

バーチャル・チームの課題

- 個人のパフォーマンスの追跡
- 多様性—言語、技術的スキル
- 一人で作業することが、絆の形成を阻害する



PMI Learning


© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

69

レッスン7

バーチャル・チームの運営

- できるだけ頻繁に、個々のメンバーに声をかけます。
- 前向きなネットワーク形成活動を行います。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。 70

バーチャル・チーム・コミュニケーション技術

チームのコミュニケーションと協働方法を計画します。
作業時間、地理的分散、セキュリティ要求事項を考慮します。
適切なツールを使用します：

- タスク・ボード
- メッセージングおよびチャットプログラム
- カレンダー
- 文書の保管
- 知識リポジトリ
- ビデオ会議

© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。 71

バーチャル・チーム・メンバーのニーズへの対応

コラボレーションを優先事項として促進し、
確実にを行うことを支援します。次のようなバー
チャル・チームの基本的ニーズに対応します：

- 結束
- 共有された目標
- 明確な目的
- 役割と期待の明確化



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。 72

レッスン7

性格調査を活用したチームメンバーのコーチング

性格が影響する可能性があるのは：

- チーム内でどのような役割を担っているか
- チームの他のメンバーとどのようにやり取りするか
- 価値観（中核的信条）がチームの価値観と一致しているかどうか

心理的チーム役割：

- 結果志向
- 関係性重視
- 革新的で破壊的な思考を持つ人
- プロセスとルールを遵守する人
- 実用的



（任意）
この心理的チーム役割のリストを使うと、
どのタイプのプロジェクト・タスクやプロセスの役割がそれらに関連していますか？



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

73

適切なリーダーシップ・スタイルの決定

ECO 1.3.6



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

74

パワー・スキル

プロジェクト専門家は、協働的リーダーシップ、コミュニケーション、革新的な考え方、目的志向、共感などの人間関係のパワー・スキルを使用します。

これらのスキルを持つチームは、さまざまなステークホルダーとの影響力を維持できます。これは、変革を行うための重要な要素です。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

75

レッスン7

包括的なリーダーシップ・コンピテンシーを開発するためのガイドライン

- ・リーダーシップのアプローチやスタイルをテラリングします。
- ・共感をもってリードします。
- ・文化のおよび多様性の側面を認識します。
- ・また、動機づけや仕事のスタイルの違いにも目を向けます。
- ・心理的に安全な環境を作ることに重点を置きます。
- ・コミュニケーションと、他者から学ぶとするオープンな姿勢が信頼を築きます。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

76

リーダーシップ・スキルとコンピテンシー

- ・ コミュニケーション
- ・ コンフリクト・マネジメント
- ・ クリティカル・シンキング
- ・ 文化的な認識
- ・ 意思決定
- ・ 感情的知性の技法 (EI)
- ・ 倫理的なアプローチ (PMI倫理・職務規定)
- ・ 専門家の判断
- ・ ファシリテーション
- ・ 会議のマネジメント
- ・ 交渉
- ・ ネットワーキング
- ・ チーム形成



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

77

人間関係とチームに関するスキル

- ・ 積極的傾聴
- ・ コミュニケーション・スタイルの評価
- ・ 感情的知性 (EI)
- ・ 影響を与える
- ・ 動機づけ
- ・ ノミナル・グループ技法
- ・ 政治的認識
- ・ 透明性



積極的傾聴

話し手のメッセージを受け入れ、受け手がメッセージを明確にして、聞いた内容が送信者の意図したメッセージと一致していることを確認するコミュニケーション技法です。



コミュニケーション・スタイルの評価

コミュニケーション・スタイルの評価とは、コミュニケーション・スタイルを評価し、計画されたコミュニケーション活動に適したコミュニケーション方法、形式、内容を特定するために、使用される技法です。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

78

レッスン7

リーダーシップ・スタイルは状況によって異なる

適切なリーダーシップ・スタイルの決定は、プロジェクトのコンテキスト、チームのニーズ、組織環境によって異なります。

つまり、その時点でチームとプロジェクトを最もサポートするアプローチを選択するということです。



PMI Learning

© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

79

リーダーシップ・スタイル: テーラリングの考慮事項

- プロジェクトのタイプに関する経験
- チーム・メンバーの成熟度
- 組織のガバナンス構造
- 分散型プロジェクト・チーム

スタイル	特性
直接型	プロジェクト・マネジャーがすべての意思決定を行う階層型
コンサルティブ型	リーダーは意見を取り入れますが、意思決定は行います。
サーバント・リーダーシップ	リーダーは望ましい行動をモデル化します。
合意/協働	チームは自律的に運営されます
状況適応型	状況やチームの成熟度や経験に合わせてスタイルを変更します

PMI Learning

© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

80

リーダーシップ ≠ マネジメント

リーダーシップ—ディスカッションやアイデアの交換を通じてチームを導きます
マネジメント—あらかじめ定められた一連の行動を用いて行動を指揮します

- 状況やステークホルダーに対応したリーダーシップ・スタイルを発揮します。
- 個人とチームの力関係や仕事上の人間関係を認識します。
- 政治的な認識と感情的知性を活用します。

PMI Learning

© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

81

レッスン7

サーバント・リーダーシップ

- ・ マネジメントではなく、ファシリテーションを行います。
- ・ コーチングとトレーニングを提供します。
- ・ 作業の障害を取り除きます。
- ・ 達成に焦点を当てます。
- ・ すべてのチーム・メンバーにサーバント・リーダーになるよう奨励します。



サーバント・リーダーシップ

チームのパフォーマンスを最大限に引き出すために、チーム・メンバーのニーズを理解し、チーム・メンバーの育成に取り組むことに重点を置いてチームをリードする実務慣行です。



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

適応型チームにおけるプロジェクト・マネジャーの役割

リーダーシップとマネジメントのモデル:

集中型

すべてのチーム・メンバーがリーダーシップ活動を実践し、説明責任は通常、プロジェクト・マネジャーや同様の役割(チーム・リード)など1人に割り当てられます。

分散型

1人のプロジェクト・チーム・メンバー(交代制)がファシリテーターとして、コミュニケーション、コラボレーション、責任あるタスクへの関与を可能にします。



「チームが自己組織化している場合、プロジェクト・マネジャーは必要でしょうか？」

- ・ 「必要でない場合、これらのモデルのうち、どれが最も適しているでしょうか？」
- ・ 「必要な場合、その役割はどのようなものになりますか？」


PMI Learning

© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

ハイブリッド・チームの編成: 例



「プロジェクト・マネジャーやチームリーダーによる集中管理と、作業の一部を担当する自律的に運営されるプロジェクト・チーム。」



PMI Learning

© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

明確な役割と責任の確立

ECO 1.3.7




© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

役割と責任が重要な理由

明確さは混乱を防ぎます。

協働は成功を導きます。

状況に合わせて役割をテラリングします。





© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

プロジェクトの主要な役割の概要

役割	説明	責任
プロジェクト・マネジャー	チームを率います	タスクの調整、スコープの管理を行います
プロジェクト・スポンサー	戦略的方向性を提供します	資金を確保し、課題を解決します
顧客	価値を受け取ります	フィードバックを提供し、作業を承認します
プロダクト・オーナー	ビジネスを代表します	要求事項を優先します
プロジェクト・チーム	タスクを実行します	成果物の設計、構築、テストを行います



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

レッスン7

プロジェクトマネジメント・チーム

プロジェクトマネジメント・チーム：

- 1人でも複数人でもあり得ます
- 計画を立て、メンターを行い、ステークホルダーを調整します
- 不確実性、構造、方法論に適応します

「適応型環境では、役割はスクラム・マスターやアジャイル・コーチによって共有されることがあります」



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。 88

役割の柔軟性とテラリング

役職名と責任範囲がどのように異なるか：

- 「プロジェクト・マネジャー」は「プロジェクト・リード」と呼ばれることもあります。
- 機能部門マネジャーは、マトリックス組織でリーダーシップを発揮することがあります。
- アジャイルの役割は、プロジェクトマネジメントの機能を共有することがあります。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。 89

プロジェクト・スポンサー、顧客、プロダクト・オーナー

役割	影響	主なサポート
プロジェクト・スポンサー	高	戦略的方向性、意思決定
顧客	中	期待の整合、妥当性確認
プロダクト・オーナー	業務レベル	ニーズの優先順位付け、ビジョンの明確化



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。 90

レッスン7

プロジェクト・チーム

定義

プロジェクト作業を実行するグループです。

考慮事項

- 規模、スキル、調整はプロジェクトによって異なります。
- 集中型または自己組織化(スクラム・チーム)であり得ます。
「ベストプラクティス: チーム構造を複雑さとデリバリー・アプローチに合わせます。」



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

91

プロジェクトマネジメント・チームのコンピテンシー



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

92

役割の遂行における技術の役割



AIにより、タスクの
追跡、コラボレー
ション、予測が可
能になります



AIがリスクとスケ
ジュールの最適化
をサポートします



クラウド・ツールは
グローバル・アク
セスを提供します

倫理的かつ安全な使用を確実にするための支援



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

93

レッスン7

役割に基づくコンピテンスの開発



シニアメンバーとジュニアメンバーをペアにします。



コーチングとメンタリングを奨励します。



学習を日々のタスクに組み込みます。



フィードバックと振り返りをサポートします。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。 94

役割を定義するためのベストプラクティス



早めに、立上げの段階で始める。



役割を文書化し、更新する。



権限と意思決定の経路を明確にする。



役割の境界を伝える。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。 95

レッスン7終了



レッスン7





Learning

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・
プロフェッショナル(PMP)®試験準備コース

リスク、変更、 および課題の管理

レッスン8



Learning

レッスン8







レッスン8

リスクの特定

ECO 3.5.1



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

リスクに関する定義



トリガー条件

リスクが発生しようとしていることを示す事象または状況。



好機

顕在化した場合に、1つ以上のプロジェクト目標に対して好ましい影響をもたらすリスク。



脅威

1つ以上のプロジェクト目標に悪影響を及ぼすリスク。



課題

プロジェクトの目標に影響を与える可能性のある、現在の条件または状況。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

プロジェクト・リスク:Shawpe Lifestyle Centerの例



プロジェクト・リスク

- ・ 新規ベンダーとの協業および業務プロセスの構築
- ・ 適切なレンガの調達に関するサプライチェーン上の問題
- ・ 建築基準法の遵守
- ・ 主要ステークホルダー間の対立
- ・ 小売市場の変化(実店舗での購買減少)
- ・ 現地調査の結果、25年以内に海岸侵食による地盤沈下のリスクが示されている点



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン8

リスク特定手法

-  ブレインストーミング
-  チェックリスト
-  インタビュー
-  SWOT 分析
-  文書レビュー
-  故障モード影響解析 (FEMA)
-  前提条件と制約条件の分析
-  デルファイ法
-  インフルエンス・ダイアグラム
-  特性要因図



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

リスク特定に関する定義

-  **プロンプト・リスト**
リスクカテゴリをまとめたチェックリスト。チームがリスクをグループ単位で検討、ブレインストーミングし、最終的に優先順位付けを行うためのきっかけとして用いられます。
-  **リスク・ブレイクダウン・ストラクチャ**
潜在的なリスクの発生源を階層的に表した構造。
-  **緩和図**
多数のアイデアを共通点に基づいてグループ化し、レビューおよび分析を容易にするための手法。
-  **デルファイ法**
ファシリテーターの管理のもと、複数回のフィードバックを通じて専門家の意見を収集し、特定のテーマについて合意形成を図る体系的な手法。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

リスク:ビジネスコンテキスト



-  リスク事象の起こりやすさと潜在的影響度の関係
-  好機と脅威の関係
-  **ビジネスリスク**
組織の業務目標、収益性、評判、または意思決定を効果的に実行する能力に影響を及ぼす可能性のある、不確実性または潜在的な事象を指します。
-  **ビジネスリスク**
ビジネスリスクは、利益を得る機会となる場合もあれば、損失につながる可能性もあります。
-  **プロジェクト・リスク・マネジメント**
プロジェクト・リスク・マネジメントは、好ましい事象の発生確率を最大化すると同時に、好ましくない事象の発生確率および影響を最小化することを目的として、体系的に実施されます。
-  **プロジェクト・リスク・マネジメント**
プロジェクトの不確実性が高まるほど、手直しが発生するリスクも増大します。そのため、適応型ライフサイクルでは、作業を小さな単位に分割し、フィードバックの獲得とスコアの段階的詳細化を可能にしています。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン8

リスク戦略の策定

まず、組織とプロジェクトのリスクパラメータを理解することが重要です。

自分の組織とプロジェクトの**リスク選好度**は、をどのように位置付けられますか？

- ・ リスク志向型？
- ・ リスク中立型？
- ・ リスク回避型？

リスクしきい値は、個人および組織のリスク選好度に基づいて決まります。以下の点を把握していますか？

- ・ 受容するには高すぎるリスクはどれか？
- ・ そのまま受容可能なほど低いリスクはどれか？

マネジメントの指針：

- ・ 定性的評価（高、中、低）または定量的評価（数値）を使用します。
- ・ エスカレーションなしで管理できる最大リスク・エクスポージャー水準を設定します。



リスク選好度

組織または個人が報酬を期待して受け入れようとする不確実性の程度。



リスクしきい値

組織とステークホルダーのリスク選好を反映した、目標に対して許容される変動の尺度です。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

リスク・マネジメント・アプローチの定義と精緻化

まず初期のリスク戦略を設定し、その後で定義および精緻化を行います。

プロジェクトの特性を考慮：

- ・ サイズ
- ・ 複雑性
- ・ 重要性
- ・ 開発アプローチ

リスク・マネジメント計画書を作成

リスク・マネジメント計画書に含める内容：

- ・ リスク戦略
- ・ 方法論
- ・ 役割と責任
- ・ 資金調達
- ・ タイミング
- ・ リスクカテゴリ
- ・ ステークホルダーのリスク選好度
- ・ リスクの発生確率と影響度の定義
- ・ 発生確率・影響度マトリックス
- ・ 報告書式
- ・ 追跡用文書



リスク・マネジメント計画書

ポートフォリオ・マネジメント計画書、プログラム・マネジメント計画書、またはプロジェクトマネジメント計画書の構成要素の一つ。リスク・マネジメント活動の構造化と実施の方法を記述したもの。




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

固有リスク

ステイシー・マトリクスでは、リスクの前段階となる不確実性を2つの軸で表現しています。

- ・ アジャイルプロジェクトでは、ユーザーストーリーやバックログ作業項目の一部としてリスクを組み込みます。
- ・ チームは、通常の業務プロセスの中で行われる計画会議においてリスクについて話し合います。
- ・ チームはリスク登録簿にリスクを記載し、情報ラジエーターを活用して可視性を確保します。
- ・ チームは継続的なリスク査定を含むバックログ洗練プロセスを用います。

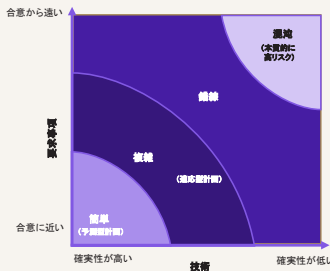

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン8

リスクの分析

ECO 3.5.2



© 2025 プロジェクトマネジメント協会全ての権利を保有します。
本資料はPMコースの一環として提供されるものです

リスク・ブレークダウン・ストラクチャ

リスク・ブレークダウン・ストラチャ
では、以下のような一般的なカテ
ゴリが用いられます。

- ・ 技術
- ・ マネジメント
- ・ 商業
- ・ 外部

システム・プラットフォーム・ストラクチャ レベル	システム・プラットフォーム・ストラクチャ レベル	システム・プラットフォーム・ストラクチャ・レベル
	1. 数値計算	1. 1. 数値計算の基礎 2. 計算機、演算機、制御機 3. 数値計算方法 4. 数値 5. 数値計算のソフトウェア 6. プログラミング言語とその使用法 7. プログラミング言語とその使用法
	2. 数値計算のソフトウェア	1. 数値計算のソフトウェア 2. プログラミング言語とその使用法 3. プログラミング言語とその使用法
	3. 数値計算のソフトウェア	1. 数値計算のソフトウェア 2. プログラミング言語とその使用法 3. プログラミング言語とその使用法
	4. 数値計算のソフトウェア	1. 数値計算のソフトウェア 2. プログラミング言語とその使用法 3. プログラミング言語とその使用法



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. 14
This material is being provided as part of a PMI course

リスクの評価:定性的評価と定量的評価

まず、主観的な**定性評価**を実施します。

発生確率と影響度を評価し、それらを**発生確率・影響度マトリックス**で組み合わせることで、追加分析が必要なリスクの優先順位付けを行います。

その後、さらに裏付けが必要な場合に限り、**定量的評価**を実施します。



「すべてのリスクに定量的評価が必要なわけではありません。」



発生確率・影響度マトリックス

各リスクの発生確率とそのリスクが発生した場合のプロジェクト目標に及ぼす影響度を格子状に位置付けたもの。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン8

リスクの発生確率と影響度の定義の作成:例

尺度	発生確率	時間	コスト	品質
非常に高い	70%超	6か月超	500万米ドル超	全体的な機能に極めて重大な影響
高い	51%～70%	3～6か月	100万米ドル～500万米ドル	全体的な機能に重大な影響
中	31%～50%	1～3か月	50万1,000米ドル～100万米ドル	主要な機能領域に一定の影響
低い	11%～30%	1～4週間	10万米ドル～50万米ドル	全体的な機能に軽微な影響
非常に低い	1%～10%	1週間	10万米ドル未満	二次的な機能に軽微な影響
なし	<1%	変更なし	変更なし	機能への影響なし



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

発生確率・影響度マトリックス

- 数値または色分け、あるいはその両方を使用します。
- 数値を使用する場合は、発生確率 × 影響度を乗算してリスクスコアを算出すると、相対的な優先順位を評価しやすくなります。

これは定量的評価ではありません。


		影響度(度大)				
		1	2	3	4	5
発生確率 (高にシフト)	1	非常に低い	2	3	4	5
	2	2	低い	4	6	8
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	高い	20
	5	5	10	15	20	非常に高い



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

リスクの定量的分析手法(1/4)

- シミュレーション**
- 感度分析**
 - デシジョン・ツリー分析
 - インフルエンス・ダイアグラム
 - 期待金額価値(EMV)
- シミュレーション**—コンピューターモデルを使用してリスク要因を特定します。
- モンテカルロ・シミュレーション**は、スケジュールやコストの入力値を用いて、統合された定量的なコスト・スケジュール・リスク分析モデルを生成します。
- 感度分析**—どのリスクがプロジェクトに最も大きな影響を与えるかを決定します。
- トルネード図**は、複数のリスクの相対的重要性を比較する横バー・チャートであり、最も影響の大きいリスクが最上位に配置されます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン8

リスクの定量的分析手法(2/4)



シミュレーション

目標への潜在的影響を評価するために、不確かさの組み合わせられた影響をモデル化する分析方法。

モンテカルロ・シミュレーション(リスク分析)

プロジェクト・マネジャーが、さまざまなリスクがプロジェクトのコストおよびスケジュールに与える影響を見積もるために用いるリスク・マネジメント手法。この手法により、特定のリスクが発生した場合にプロジェクトのスケジュールやコストがどのように変化するかを把握できます。また、プロジェクト・ライフサイクルのさまざまな段階で使用され、異なるシナリオにおける結果の発生範囲を明らかにできます。

感度分析

プロジェクト個別リスクまたはその他の不確かさの要因のうち、プロジェクト成果に最も大きな影響を及ぼすものを特定するための分析手法。リスクの定量的分析モデルの要素の変動と、プロジェクト成果の変動との相関関係を分析することで、影響度を評価します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

19

リスクの定量的分析手法(3/4)



- ・「シミュレーション」
- ・「感度分析」
- ・ **デシジョン・ツリー分析**
- ・ **インフルエンス・ダイアグラム**
- ・ **期待金額価値(EMV)**

デシジョン・ツリー分析

- ・ 分岐は決定やイベントを表し、それぞれにコストおよびリスクが関連付けられます。
- ・ 分岐の終点は、成果(否定的または肯定的)を表します。

インフルエンス・ダイアグラム

- ・ 品質マネジメントにおける図解的支援ツール。
- ・ リスクによって生じる不確かさの要素を、範囲または確率分布として表現します。

- ① 「デシジョン・ツリーが複雑になりすぎる場合に使用されます。」

期待金額価値(EMV)

- ・ 各成果の金銭的価値に発生確率を乗じて、各分岐のEMVを算出します。
- ・ EMVが最適となる選択肢を選定します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

20

リスクの定量的分析手法(4/4)



デシジョン・ツリー分析

不確かさの存在下で、複数の選択肢が連鎖する場合の影響を評価するための、図式化および計算による分析手法。

インフルエンス・ダイアグラム

プロジェクトマネジメントで複雑な状況をモデル化するために使用される図表表現で、エンティティ、意思決定、不確かさ、成果の間の関係を示します。

期待金額価値(EMV)

金銭的な単位で表した成果の見積り価値です。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

21

レッスン8

監視とリスクの 監視・コントロール

ECO 3.5.3



© 2025 プロジェクトマネジメント協会（登録商標）全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

22

リスクへの対応



二次リスク

残存リスク



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

23

コンティンジェンシー計画と代替計画

コンティンジェンシー
計画

代替計画



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

24

レッスン8

脅威への対応

脅威に対処する際に取ることができるアクションは5つあります。



回避する



軽減



移転



エスカレートする



受入れ



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

25

好機への対応

好機に対応する際に取ることができるアクションは5つあります。



活用



強化する



共有する



エスカレートする



受入れ



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

26

時間、コスト、ライフサイクルのリスク



予測型プロジェクトは、主にコスト関連リスクの影響を受けやすい一方、適応型プロジェクトは、主に時間関連リスクの影響を受けやすいとされています。

この考え方について、あなたは同意しますか、それとも同意しませんか？なぜですか？



以下の典型的なリスクは、予測型プロジェクトと適応型プロジェクトのどちらで、より発生しやすいと考えられますか？なぜそうなのか説明できますか？

典型的なリスク

- ・ 納期の遅れ
- ・ リソースの逼迫
- ・ 明確さの欠如
- ・ スコープ・クリープ



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.


27

レッスン8

リスク対応:良い実務慣行

リスク対応は、以下の条件を満たすべきです。

- リスクの重大さに見合っている
- 費用対効果が高い
- プロジェクトの状況に照らして現実的である
- 関連するステークホルダーの同意を得ている
- 責任者が任命されている



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.



リスクの監視

ガイドライン

- 全体リスクと個別リスクに関する最新情報に基づく意思決定を可能にする。
- 状況、発生確率、影響度を継続的に監視する。
- 新たなリスクを特定する。
- 現在のリスクを再評価する。
- 発生しそうなリスクを終結する。
- 定期的に実施する。
- リスク対応の有効性を継続的に改善する。

尋ねるべき質問

- プロジェクトの前提条件は引き続き有効か？
- リスクに変化はあったか、または対応済みとなったか？
- リスク・マネジメントの方針と手続きは守られているか？
- コンティンジェンシー予備は修正されたか？
- リスク監査は必要か？



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.



プロジェクト・リスクの監視・コントロールにおける主要なステップ



継続的に監視する



リスク対応を確認する



リスク水準を監視する



新たなリスクの兆候に注意を払う



アプローチを評価する



方針とプロセスに従う



コンティンジェンシー予備を監視する



プロジェクトマネジメント戦略を確認する



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン8

コンティンジェンシー予備とマネジメント予備の見直し

予備設定分析:

- 必要なコンティンジェンシー予備とマネジメント予備の金額を設定する
- プロジェクト全期間を通じて実施される
- 残量を比較して、リスク対応に十分であるかどうかを判断する
- バーンダウン・チャートを用いて可視化・共有される場合がある



予備設定分析

プロジェクトのリスクの量と、スケジュールと予算の予備の量を評価し、残余リスクに対して予備が十分であるかどうかを判別するために用いられる方法



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

31

リスク・マネジメント 計画書の策定

ECO 3.5.4



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての特許を保有します。
本資料はPMIの登録商標であり、PMIによって提供されるものです。

32

リスク対応の計画と実行

リスク・マネジメントを効果的に行うためには、次の点が重要です。

- すべてのリスクにオーナーを割り当て、リスクの監視と軽減戦略の発動を担当させる。
- 各コンティンジェンシー対応戦略に、必要なタイミングで対応を発動するためのトリガー条件を含める。
- リスク対応計画は、策定後、確実に実行する。
- 割り当てられたリスクを注意深く監視し、特定されたしきい値に達した場合には対応を発動する。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

33

レッスン8

リスク登録簿の 維持管理

ECO 3.5.5



© 2025 プロジェクトマネジメント協会全ての権利を保有します。 24
本資料はPMI®コースの一部として提供されるものです

リスク登録簿の例

リスクの説明	影響の配注	影響度スコア	発生確率のスコア	リスクスコア(発生確率 × 影響度)	トリガー条件	計画された対応	所有者
	リスクが軽減されない、または排除されない場合に起こるでしょうか	評価 1(低い)から 5(高)	レート 1(低い)から 5(高い)	(影響度 × 発生確率)最も高いものから対処	どのような状況でリスクが発生するのかが示します。	アクション・プラン	対応責任者
適切なレンガの調達に関するサプライチェーン上の問題		5	1	5	サプライヤーへの通知		L.De Souza
建築基準法の遵守		5	2	10	事前チェックが失敗しました		K.Ayoung
新規ベンダーとの協業および業務プロセスの構築		3	3	9	遅延またはコンフリクト		K.Ayoung



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

リスク一覧

リスク	発生確率 (1~10)	影響度 (1~10)	マグニチュード
・新機ベンダーとの協業および業務プロセスの構築	5	6	30
・適切なレングスの調達に資するサプライチェーン上の問題	5	10	50
・建築基準法違反	5	10	50
・主要ステークホルダー間の対立(Josie Byrne)	4	6	24
・小売市場の縮小	8	10	80
・選地調査の結果、25年以内に海岸侵食による地盤沈下のリスクが突き出た	5	3	15

チームは、必要に応じて次のような列を追加(テーラリング)できます。

- ・ オナー
- ・ ステータス
- ・ 特定日
- ・ 解決日
- ・ 対応日数
- ・ 解決戦略



チームは、リスク一覧やリスク登録簿に加えて、情報ラジエーター、リスクを組み込んだバックログ洗練プロセスを活用し、これらを各種計画会議で継続的に議論します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン8

リスク・マネジメント計画 の実行

ECO 3.5.6



© 2025 プロジェクトマネジメント協会。インテグリティの権利を保持します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

27

リスク・マネジメント計画の実行



トリガー条件
の監視



対応策の実行



適応



コミュニケー
ション



リスク登録簿
の更新



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

28

プロジェクトに対する リスクの影響の共有

ECO 3.5.7



© 2025 プロジェクトマネジメント協会。インテグリティの権利を保持します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

29

レッスン8

なぜリスクの状況を共有するのか？



ステークホルダーが
リスクがどのように
変化しているかを理
解するのに役立つ



対応戦略がどの
程度有効に機能
しているかを把
握できる



タイムリーで情
報に基づいた
意思決定を可
能にする



すべてのステーク
ホルダー間で透
明性と信頼を構
築する



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

40

何を共有すべきか？

リスクの状況を報告する際には、次の内容を含めます。

- 現在のリスク状況: リスクは発生中、軽減済み、回避済み、それともクローズ済みか？
- 発生確率と影響度の変化: リスクの発生可能性や重大性は高まったか、低まったか？
- 全体的なリスク・エクスポージャー: プロジェクト全体のリスク水準（高・中・低）に変化はあったか？
- リスク対応の有効性: 軽減策やコンティンジェンシー対応は、想定どおり機能しているか？
- コンティンジェンシー予備: どれだけの時間、コスト、資源が使われたのか、あるいはまだ使えるのか？



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

41

いつ共有すべきか？

リスクの状況は、次のタイミングで共有します。

- 定期的な報告タイミング
(例: 週次または月次レビュー時)
- 次のような重要な変化が発生した場合:
 - 重大なリスクが顕在化したとき
 - 新しいリスクが特定されたとき
 - リスク対応が見直されたとき



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

42

レッスン8

どのように共有すべきか？



リスク・ヒートマップやステータス指標を示すダッシュボードを活用



リスクの要約を含むパフォーマンス報告書を作成



直近の変更点を強調したリスク登録簿を共有



関心事項や影響度に応じて調整した、ステークホルダー別のブリーフィングを実施




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

43

変更の計画と コントロール

ECOタスク3.3



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIのコースの一部として提供されるものです。

44

変更管理プロセス の実行

ECO 3.3.1




© 2025 Project Management Institute, Inc. 全ての権利を保留します。
本資料はPMIのコースの一部として提供されるものです。

45

レッスン8

インタラクティブなディスカッション



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

変更の管理:概要とコントロール

概要	コントロール
変更の評価および実施プロセス 	- 変更の評価および実施プロセス - 変更要求プロセス - 変更管理委員会 (CCB) - 作成物マネジメント(更新)
フィードバックおよび開発サイクル 	- プロダクト・オーナーの役割: 主要な意思決定者であり、バックログを管理・運営 - 全員がバックログの洗練に参加 - デモを活用して要求事項を理解 - スプリント中は変更は許可されない
	上記のすべて



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

予測型プロジェクトにおける新規作業と変更の監視

- ・変更はチームによって管理される。
- ・スコープの変更が導入されるときにリスクを評価する。
- ・プロジェクト・マネジャーと変更管理委員会がプロセスに沿って変更要求を処理する。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. 48
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン8

統合変更管理の実施

- 変更要求の見直し
- プロジェクト・マネジャーの責任であり、プロジェクト全期間を通じて実施される
- 変更は文書で記録し、変更マネジメントシステムに登録する必要がある
- 変更管理委員会 (CCB)



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

49

変更管理

変更マネジメント計画書を使用して、変更に関するプロセスと役割分担を設定します。

変更に関する質問	典型的な答え
誰が変更を提案できますか？	役割があらかじめ割り当てられています
どのようなものが変更に該当しますか？	プロジェクトのベースラインや尺度のいずれかを変更する提案、またはイベントです
この変更はプロジェクトの目標にどのような影響を与えますか？	評価方法を推奨します
変更要求を承認または却下する前に、どのような手順で評価しますか？	品質方針に基づく所定の手順を実施します
変更の種類やレベルごとに、誰が承認権限を持ちますか？	変更管理委員会 (CCB) や、その他の承認者です
変更要求が承認された場合、次のステップ(アクション)はどのプロジェクト文書に記録されますか？	変更ログ
対応状況や完了、品質をどのように監視しますか？	品質尺度、リスク査定、RACI(実行責任、説明責任、相談対応、情報提供)マトリックス、情報ラジエーターを使用します




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

50

プロジェクト変更の要因

- 初期見積りの不正確さ
- 新たな規制の導入
- 要求事項の見落とし
- 仕様変更

「これらの要因は、適応型プロジェクトの変更の原因にもなっていますか？」



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

51

レッスン8

変更要求の4つのタイプ



- **是正処置:**プロジェクトマネジメント計画書に合わせてプロジェクト作業のパフォーマンスを調整します
- **予防処置:**将来において、プロジェクト作業がプロジェクトマネジメント計画書どおりに実行されることを確実にするための対応です
- **欠陥修正:**プロジェクト内の不適合を修正します。
- **更新:**ベースラインや、契約書などの管理対象文書を更新します。

変更管理システム:変更管理委員会



要求された変更を承認または却下するために必要な様式、追跡方法、プロセス、承認レベル


承認レベルの一つとして**変更管理委員会(CCB)**が設定される場合があります、変更マネジメント計画書に記載された承認レベルに基づいて、一部の変更要求を取り扱います。



変更管理委員会(CCB)

プロジェクトへの変更をレビュー、評価、承認、保留、または却下し、その決定を記録し伝達する責任を負う、正式に認可されたグループです。


予測型変更マネジメントプロセスのフローチャート

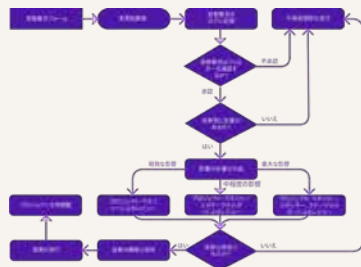

レッスン8

適応型プロジェクトにおける新規作業と変更の監視

- 作業は継続的に進化・適応していきます。
- プロジェクト・マネジャーとプロダクト・オーナーが連携し、期待値を管理します。
- プロダクト・オーナーが、バックログの優先順位付けを継続的に行います。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

契約変更の管理と問題の解決

- ・ベンダーと協力して、契約変更を管理します。
- ・調達、財務、各機能部門など、組織内の関係者と協働し、プロジェクト・マネジャーまたはチームに与えられた権限しきい値の範囲内で対応します。
- ・重大な法的問題に発展する可能性がある場合には、専門家の支援が必要となることがあります。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

契約変更管理システム




契約に対する変更を収集、追跡、判断(裁定)、伝達するために使用されるシステムです。

- ・ 統合変更管理の一部として組み込まれる場合もあれば、独立した組織的システムである場合もあります
- ・ 契約変更の管理に特化しています
- ・ 契約変更の内容を指定します
- ・ 文書、係争解決プロセス、承認レベルを含みます

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン8

契約変更のタイプ



レッスン8

提案された変更の 状況の共有

ECO 3.3.2



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

61

提案された変更の状況の共有



コミュニケーション・マネジメント
計画書



変更ログまた
は登録簿



意思決定者と
の会議



報告書とダッ
シュボード



影響内容の
文書化



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

62

承認されたプロジェクト変更 の実施

ECO 3.3.3



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

63

レッスン8

承認された変更の実施



- 1 変更内容をプロジェクトマネジメント計画書に反映する。
- 2 プロジェクト文書を更新する。
- 3 ステークホルダーとコミュニケーションを取る。
- 4 役割を再割り当てる。
- 5 対応策を速やかに実行する。
- 6 変更を監視・コントロールする。
- 7 プロセスを文書化する。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

64

適切な実務慣行



プロセスに従う

承認と実施に関する組織の方針やワークフローを厳守します。



ツールを活用する

プロジェクトマネジメント情報システム(PMIS)などのプロジェクトマネジメント・ソフトウェアやシステムを活用して、変更の追跡と監査を行います。



変更をベースラインに合わせる

更新されたスコープ、コスト、スケジュールの各パラメーター内に調整が収まるよう、プロジェクト・ベースラインを常に再確認します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

65

変更内容を反映するためのプロジェクト文書の更新

ECO 3.3.4



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

66

レッスン8


プロジェクトマネジメント計画書の更新

変更の範囲に応じて、次の項目を更新する必要があります。

- スコープ
- タイムライン
- ワーク・パッケージ
- チーム・メンバーの割り当て




適応型チームでは、変更を受け入れる余地を確保するために、価値の低い成果物をスコープから除外する場合があります。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

障害の除去と課題の管理

ECOタスク3.4



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIのコースの一部として提供されるものです。

阻害要因、障害、ブロッカー

プロジェクト・チームは事業価値の大部分を創出する存在であるため、プロジェクト・マネジャーが、チームの進捗を妨げるものを取り除き、成果を最大化することは極めて重要です。



阻害要因

プロジェクトの進行を遅らせるが、完全に停止させるほどではない課題です。



障害

克服するために戦略的なアプローチを必要とする課題です。



ブロッカー

プロジェクトの進行を完全に停止させます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン8

課題か阻害要因かにかかわらず、とにかく解決しましょう！

- **課題**: プロジェクトの目標に影響を及ぼす可能性のある条件または状況です
- **阻害要因**: チームが目標を達成することを妨げる障害であり、ブロッカーとも呼ばれます



予測型チームでは、課題ログという用語が使われます。



適応型チームでは、阻害要因ログが使われる傾向があります。



「この用語はスクラムに関連しています。」



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

70

阻害要因の影響 の評価

ECO 3.4.1



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIの登録商標であり、PMIの所有物です。

71

阻害要因の特定



毎日の調整会議



レトロスペクティブ
(振り返り)



ボトルネックの兆
候に注意を払う



依存関係を監
視する



過去のデータ
を追跡する



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.


72

レッスン8

追跡システムの活用

阻害要因、障害、ブロッカーを監視するには:

- ・システム（スプレッドシート、カンバンボード、プロジェクトマネジメントツール）を導入します。
- ・次の情報を記録します。
 - ・ 誰がその課題を報告したか
 - ・ その影響度
 - ・ 解決の責任者は誰か



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

影響度と緊急度の分析

まず、各阻害要因がプロジェクトのスコープ、スケジュール、コスト、品質、リスクにどのような影響を与えるかを分析します。

優先順位付けマトリックス

プロジェクト・チームが最も重要な課題に集中できるよう支援します

影響度と緊急度に基づいて課題をマッピングします

リスク評価で使用する影響度/緊急度マトリックスと同様に機能します



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

依存関係の分析

阻害要因ボトルネックを生み出していないか、またはタスクやチーム間の依存関係に直接影響していないかを確認します。

プロジェクトのマイルストーンと成果物に及ぼす波及効果を評価します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン8

阻害要因の優先度 設定と可視化

ECO 3.4.2



© 2025 Project Management Institute (PMI). All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

課題の優先順位付け

重大なブロッカーの優先順位付け
とエスカレーションを行う方法:

- スコープ、コスト、またはスケジュールへの影響に基づいて、
阻害要因の優先順位を付けます。
- 最も重大な阻害要因から先に対応します。
- 解決により高い権限が必要な場合は、プロジェクト・スポンサーや機能部門マネージャーにエスカレーションします。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

パターンを探す



スプリント、レトロスペクティブ、
またはフェーズを横断して、繰り返し
現れるテーマがないかを確認
します。



根本原因分析を用いて、繰り返し
発生するブロッカーの根本的
な原因を特定し、排除します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン8

課題の優先順位マトリックスの理解

以下は、より詳細な優先順位マトリックスの一例です。

	高い緊急度	中程度の緊急度	低い緊急度
高い影響度	クリティカル	重要	監視
中程度の影響度	重要	中	低い
低い影響度	中	低い	先送り

影響	緊急度	発生確率 (オプション)	作業工数または 複雑さ(オプション)
スコープ、スケジュール、コスト、または品質に影響を与える度合い	課題をどの程度早急に解決する必要があるか	エスカレーションや再発が起こる可能性の高さ	課題解決に必要な難易度または資源量



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

阻害要因を除去または 最小化するための介入 戦略の決定と適用

ECO 3.4.3



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保有します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです

介入戦略の策定



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン8

的を絞った行動によって解決策を適用

チームが特定した解決策を実行し、必要に応じてチームメンバーやステークホルダーを関与させます。

チームの直接的な管理範囲を超える阻害要因に対しては、組織内の資源、当該分野専門家、または外部パートナーを活用します。

メトリクス、フィードバック、パフォーマンス・レビューを用いて、解決策の有効性を継続的に監視します。



PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

リスクが課題となる 兆候の把握

ECO 3.4.5

PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会全ての権利を留保します。
本資料はPMIのコースの一部として提供されるものです。

リスクと課題



- 将来に焦点を当てている
- プラスにもマイナスにもなりうる
- リスク登録簿に記録される
- 対応は「リスク対応」と呼ばれる

- 現在に焦点を当てている
- 常にマイナスの影響を伴う
- 課題ログに記録される
- 対応は「迂回策」と呼ばれる

PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン8

課題



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

移行の兆候の認識



トリガーポイントの追跡

各リスクを監視し、
想定される影響発生日やしきい値に特に
注意します。



リスク指標
の監視

リスク査定時に定義したリスク指標や早期警告サインを定期的にレビューします。



予期せぬプロジェクト状況の評価

プロジェクト実施中に、特定済みのリスクと一致する新たな兆候や事象がないかを監視します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

課題解決に向けた 関係ステークホルダー との協働

ECO 3.4.6



© 2025 プロジェクトマネジメント協会(PMI)全ての権利を保有します。 87
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです

レッスン8

課題を明確に理解する

課題を解決するためには、まずその内容を明確に理解することが不可欠です。

課題とその影響を明確に説明する:

- 課題を具体的かつ客観的に説明します。
- 何がどこで起きているのか、そしてそれがプロジェクトの目標(スコープ、時間、コスト、品質)にどのような影響を与えるのかを説明します。
- ステークホルダー間での共通理解の確立を促進します。
- より迅速かつ効果的な意思決定を支援します。

前提や思い込みではなく、事実に基づいて課題を定義する:

- 客観的なデータ、直接的な観察結果、または文書化された証拠を使用します。
- 主観的な解釈を避けます。
- 表面的に見えている問題ではなく、実際の問題に焦点を当てます。
- チームが正確で効果的な行動を取れるようにします。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

関係するステークホルダーの特定

適切なステークホルダーを特定することは、課題を効果的に解決するうえで不可欠です。

- ステークホルダー登録簿を活用し、課題の影響を受ける人、または解決に貢献できる人を特定します。
- 直接的な影響を受ける人に加え、支援、資源、承認を提供できる人も含めます。
- 以下のような幅広いステークホルダーを考慮します。
 - 日常業務に関与しているチーム・メンバー
 - 意思決定権限を持つプロジェクト・スポンサー
 - 成果の影響を受けるクライアントまたはエンドユーザー
- 解決プロセスの早い段階で、関係するステークホルダーを関与させます。
- 課題の内容、その影響、およびどのように貢献できるかについて、十分に理解できるようにします。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

ステークホルダーを早期に関与させる

プロジェクト全体を通じてステークホルダーを関与させることで、協働の促進、多様な視点の獲得、より良い成果につながります。

ステークホルダーを早期に関与させて...

...洞察を集め、認識の整合を図ります。

コラボレーションを促進することで...

...解決策をブレインストーミングし、選択肢を評価します。

構造化された手法を活用して...

...プロセスを円滑に進めます(ワークショップやブレインストーミング・セッションを活用)。

積極的傾聴を実践して...

...各自の視点を理解し、制約条件を特定します。

事実に基づくデータを提示して...

...データを示し、代替案の検討や影響・結果の評価を行い、十分な情報に基づき意思決定を可能にします。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン8

共同意思決定の促進「(1/5)」


権限ではなく、協働を重視します。

 Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

共同意思決定の促進「(2/5)」


権限ではなく、協働を重視します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

共同意思決定の促進「(3/5)」

権限ではなく、協働を重視します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.

レッスン8

共同意思決定の促進「(4/5)」

権限ではなく、協働を重視します。

多基準意思決定分析

投票

合意形成

投票は、複数の代替案を評価し、望ましい将来の成果を決定するために用いられるグループによる意思決定およびアセスメントの手法です。チームがプロダクト要求事項やアイデアを創出、分類、優先順位付けする際に役立ちます。

- 満場一致:全員が単一の行動方針に同意したときに、決定が下されます。
- 過半数:グループの50%を超えるメンバーが選択肢を支持したときに決定が下されます。
- 相対多数:過半数に達していなくても、最も多くの票を獲得した選択肢が相対多数により採用されます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

94

共同意思決定の促進「(5/5)」

権限ではなく、協働を重視します。

多基準意思決定分析

投票

合意形成

合意形成に至るために、協働的なアプローチを用います。

- 対立する状況では、複数の視点を理解することに重点を置きます。
- 信頼関係と十分な時間を確保できる場合は、合意形成を目標として位置付けます。
- オープンな対話を通じて、多様な視点を取り入れます。
- 協調的な姿勢を促し、ウィンウィンの結果を目指します。
- 包括的な議論を行うことで、関係者のコミットメントを高め、結果として合意形成につながります。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

95

資源オーナーと機能部門マネジャーとの連携



資源マネジャーを早期に関与させます。



資源の可用性を確認します。



作業に影響が出る前に、ギャップをエスカレーションします。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

96

レッスン8

合意事項とアクションプランの文書化

合意された解決策を記録し、課題ログまたはアクション登録簿に責任者を割り当てます。

ID	説明	起票日	期日	優先度	オーナー	状況	割り当てられた対応	コメント
25	トラック運転手のストライキ	1月15日	2月1日	高い	Ang Fen	オープン	輸送会社に圧力をかけ、解決を図る	タスクはクリティカル・パス上
26	ガラス施工サービス停止	1月15日	2月1日	中	元請業者	オープン	代替サプライヤーを探し、見積りを取得	別のサプライヤーを検討中
27	Josie Bynoeが不満を表明	1月15日	2月1日	高い	Ang Fen	オープン	Josieと連絡を取って不満の原因を特定し、アクションプランを策定	運営資金の拠出停止リスク



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

阻害要因、障害、ブロッカーに対処するための継続的な再評価

ECO 3.4.4



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIのコースの一部として提供されるものです。

課題を適切にコントロールする



すべての状況会議で課題を取り上げ、可視性を保ちます。



対応可能な範囲に収めるため、未解決の課題数を管理可能な水準に制限します。



しきい値を超える、またはプロジェクトに影響を及ぼす課題は、プロジェクト・スポンサーや主要ステークホルダーにエスカレーションします。



解決策が有効に機能しているか、新たな課題が発生していないかを継続的に再評価します。




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン8

監視とフォローアップ

解決策を実施した後は、以下を行います。

- 解決策の有効性を監視する。
- ステークホルダーとに状況を確認し、懸念点や必要な調整に対応する。
- 進捗状況および結果を、関係するすべてのステークホルダーに伝える。
- ステークホルダーの専門知識を活用するため、協働を促進する。
- 課題を効率的に解決し、プロジェクトの推進力を維持する。



PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

100

継続的な再評価



PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

101

学びを継続的な計画に組み込む

学びを計画に反映するには:

- 得られた知見を以下にフィードバックします。
 - リスク登録簿
 - レトロスペクティブ（振り返り）記録
 - 継続的改善計画
- チームの合意事項やプロセス文書を更新します。



PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

102

レッスン8

レトロスペクティブ(振り返り)およびレビューにおける再評価



適応型環境では:スプリント・レトロスペクティブ(振り返り)を用いて、過去の阻害要因がどの程度効果的に解決されたかを評価します。



予測型環境では:フェーズ終了時レビューを用いて、ブロッカー解決プロセスを振り返ります。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

103

課題解決のための指針



問題、不整合、または対立を追跡し、解決に向けて前進します。

- 課題が発生したら、速やかに課題ログに追加します。
- 各課題にオーナーを割り当てます。
- 現実的な期日を設定します。

- 各状況会議で課題について話し合います。
- 未解決の課題数を管理可能な範囲に制限します。
- エスカレーションすることをためらわないでください！

ID	説明	起票日	期日	優先度	オーナー	状況	割り当てられた対応	コメント
25	トラック運転手のストライキ	1月15日	2月1日	高い	Ang Fen	オープン	輸送会社に圧力をかけ、解決を図る	タスクはクリティカルパス上
26	ガラス施工サービス停止	1月15日	2月1日	中	元請業者	オープン	代替サプライヤーを探し、見積りを取得	別のサプライヤーを検討中
27	Josie Bynoeが不満を表明	1月15日	2月1日	高い	Ang Fen	オープン	Josieと連絡を取って不満の原因を特定し、アクションプランを策定	運営資金の拠出停止リスク



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

104

レッスン8終了





Learning

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・
プロフェッショナル(PMP)®試験準備コース

進捗の監視と整合性 の維持

レッスン9



Learning

レッスン9







レッスン9

内部顧客と外部顧客 の期待を特定する

ECO 1.6.1



内部のステークホルダーと外部のステークホルダー



内部のステークホルダー

- 組織内の従業員、部署、または部門
- ステークホルダーの期待は、各自の仕事のパフォーマンス向上を促す支援、資源、情報に関することが多いです。



外部のステークホルダー

- クライアント、ユーザー、規制当局、またはその他の外部当事者
- 焦点は、ニーズを満たし、約束を守り、要求を上回ることにあります。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

期待を特定する

- 調査、フォーカス・グループ、インタビューを通じて定期的にフィードバックを収集します。
- 過去のやり取り、パフォーマンスデータ、経験を分析します。
- 業界標準、競合他者の提供物、市場動向などの外部要因に注意を払います。
- プロジェクトのライフサイクル中に、要求事項の定義、パイロットへの参加、漸進的な更新の提供において、内部および外部の顧客を密接に関連させます。
- 透明性のある継続的な情報交換を優先します。
- 顧客満足とエンゲージメントの重要業績評価指標を監視し、パフォーマンスの傾向に基づいて調整します。
- 期待に応えるだけでなく、可能な限り期待を上回るよう努めます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン9

期待を特定するためのツールと技法



ステークホルダー分析

ステークホルダーに関する定量的情報と定性的情報を調査・分析します。



引出しの技法

技法には、インタビュー、調査、フォーカス・グループ、ワークショップ、観察セッションなどがあります。



狩野モデル

顧客の要求事項を基本フィーチャー、パフォーマンス・フィーチャー、ディライター、無関心フィーチャー、逆フィーチャーに分類するのに役立ちます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

7

成果と顧客の期待間の 整合性の確保と維持

ECO 1.6.2



戦略上の整合



- ガバナンス・フレームワークを使用して、ポートフォリオ、プログラム、プロジェクトの各レベルでの整合をサポートします。
- 例えば、ポートフォリオマネジメントの実務慣行を使用することで、それらのポートフォリオをサポートする適切なプロジェクトを選択することができます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

9

レッスン9

ステークホルダー・エンゲージメントとコミュニケーション

- 内部ステークホルダーの場合：
 - プロジェクトのマイルストーン、リスク、所産に関して定期的に更新を行うと、組織の優先順位との整合性を維持できます。
- 外部のステークホルダーの場合：
 - プロダクト・ロードマップ、リリース計画書、使用ベネフィットなどの情報は、顧客中心の視点で提示する必要があります。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

10

顧客満足と期待の監視と必要に応じた対応

ECO 1.6.3



満足度を監視する



顧客満足調査

経験に関するフィードバックと改善が必要な領域に関するフィードバックを収集します。



Net Promoter® Score (NPS)

このメトリクスは、顧客ロイヤリティと顧客満足度を評価します。



統計的改善ツール

管理図、特性要因図、バレット図などのツールは、データの傾向を分析するのに役立ちます。

Net Promoter®, NPS®, NPS Prism®, およびNPS関連の記号は、Bain & Company, Inc., NICE Systems, Inc., およびFried Reichheldの登録商標です。Net Promoter Score™ およびNet Promoter System™は、Bain & Company, Inc., NICE Systems, Inc., およびFried Reichheldのサービスマークです。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

12

レッスン9



プロジェクト・メトリックスを開発し、分析、調整する

必要な作成物の特定とテーラリング

作成物の作成、レビュー、更新、文書化を確実に行うための支援

作成物のアクセシビリティを確保するための支援


作成物マネジメントの有効性を継続的に評価する

ECO 2.9.1、2.9.2、2.9.3、2.9.4、および2.9.8



作成物の標準化:何を含めるか


- ・ 文書を作成し、管理するためのシンプルな方法
- ・ 標準化された形式とテンプレート
- ・ 文書のレビューと承認のための構造化されたプロセス
- ・ バージョン管理とセキュリティ
- ・ 文書のタイムリーな配布



レッスン9

情報の保管と配布に関する良い実務慣行

- アクセスしやすい場所を選択します。
- 情報ラジエーターを使用して、作業を可視化します。
- 保管および配布システムは、プロジェクトの複雑さに見合ったものになります。
- 大規模なプロジェクトでチームメンバーが地理的に分散している場合は特に、クラウドベースのシステムを使用します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

作成物のテーラリング



- ・ プロジェクトマネジメント計画書
- ・ プロジェクト憲章
- ・ 変更要求
- ・ スコープ・ベースライン
- ・ スケジュール・ベースライン
- ・ コスト・ベースライン
- ・ 付随するプロジェクトマネジメント計画書



- ・プロジェクトマネジメント計画書
- ・プロダクトロードマップ
- ・タスク・ボード
- ・実験
- ・プロダクトバックログ
- ・スプリントバックログ



「これらのリストは典型的なものであり、排他的でも規範的でもありません。作成物の種類と使用方法をプロジェクトに合わせてテーラリングします。」



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

作成物の維持管理

コンフィギュレーション・マネジメント計画書

- ・プロジェクトマネジメント計画書の構成要素
- ・プロジェクト情報(およびどの項目)をどのように記録し、更新するかを明記します。
- ・プロジェクトのプロダクト、サービス、所産の一貫性と運用性を促進します。

コンフィギュレーション・マネジメント・システムプロジェクトの作成物を追跡し、これらの作成物への変更を監視・コントロールするために使用される手続きの集合です。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン9

作業情報マネジメント・システム

プロジェクトマネジメント情報システム (PMIS)

- プロジェクトのデータを収集、統合、共有します。
- 収集と報告の一貫性を確保するのに役立ちます。

Microsoft Projectまたは
同等のソフトウェア



作成物マネジメント・システム

- プロジェクト文書類を保管し、維持管理します。

- Microsoft SharePointまたはTeams
- Googleドライブ



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

19

バージョン管理

これは、文書とデジタル記録の管理に関連するコンフィギュレーション・マネジメントのサブセットです。

各更新には以下を含めます。

- 新しいバージョン番号
- 日付と時刻のスタンプ
- 変更を行ったユーザーの名前



「すべての作成物、特にプロジェクトマネジメント計画書のような重要な作成物にバージョン管理を適用します。」



バージョン管理

ファイルへの変更を記録するシステムで、ユーザーが以前の変更履歴を参照できるようにします。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

20

作成物の維持管理を監視する

- 定期的な品質チェックの一部に組み入れます。
- ファイル・ストレージを整理された状態で保ち、バージョン管理を行います。
- データ保護およびセキュリティ上の義務への確実な準備を支援します。
- プロジェクト終了時のアーカイブに備えて、作成物を維持管理します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

21

レッスン9

現在の進捗状況 の評価

ECO 2.9.5



パフォーマンス・アセスメント

- 強み、弱み、願望、好みを特定します。
- 改善の機会を特定します。



- 正式および非公式の評価方法を使用します。
- チーム・メンバーが加わったときにアセスメントを実施し、その後進捗を監視します。



- 心理的に安全な環境にある自己組織化されたアジャイル・チームは、自らのパフォーマンスを評価し、調整します。
- 個人ではなくチームに焦点を当てます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

パフォーマンス・アセスメント・タスク



- パフォーマンスを目標と比較します。
- 役割と責任を再度明確化します。
- ポジティブなフィードバックとネガティブなフィードバックの両方を提供します。
- 未知の課題や未解決の課題を特定します。
- 個別のトレーニング計画を作成して監視します。
- 今後の目標を設定します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン9

パフォーマンス測定のためのガイドライン



「最も重要なのは、最も重要なものを測定することです」

「・ジョン・ドーア」

パフォーマンス測定結果をプロジェクトのコンテキストとステークホルダーに合わせて調整します。

スコープ

- 完了した作業の割合
- 変更要求

スケジュール

- 計画した開始日と終了日に
対する実際の作業期間

予算

- 実コスト
- 調達が必要に対して十分
か確認する

リソース

- チームの割り当て/可用性/調達
- パフォーマンス評価—チーム（ベン
ダーを含む）
- 契約マネジメント

品質

- 技術的パフォーマンス
- 欠陥

リスク

- リスク登録簿

Doerr, J., (2018年), Measure what matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation rock the world with OKRs, Portfolio/Penguin.



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

25

パフォーマンスに関する報告: 必要に応じたテーラリング



マイルストーン・スケジュール	計画された日付に対する作業の進捗状況をハイレベルで視覚化
品質報告書	収集した品質尺度に基づくチャートと報告書
アワード・バリュー・マネジメント (EVM) 報告書	EVMの方程式に基づくグラフと値
差異分析報告書	実際の結果と期待される結果を比較するグラフとその分析
作業パフォーマンス報告書	プロジェクト文書にまとめられた作業パフォーマンス情報を物理的または電子的に表したもので、意思決定、アクション、または認識の喚起が目的
ダッシュボード	大きなデータセットを表す視覚資料や図表を通常含む、物理的または電子的な進捗概要



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

26

プロジェクト・メトリックスの測定、分析、更新

ECO 2.9.6



レッスン9

パフォーマンスの可視化



コミットされた作業と完了した作業の表示:


- チームのダッシュボード(電子的または物理的)に、ビジュアルやグラフィックを表示します。
- バーンダウン・チャートとバーンアップ・チャートにプロダクト・バックログの進捗を表示します。
- 目立つ場所に設置したグラフィックを含む情報ラジエーターに、プロジェクトのデータと進捗状況を表示します。
- 累積フロー・ダイヤグラムを用いて、リード・タイムとサイクル・タイムでパフォーマンスを測定します。
- アジャイル・アプローチでは、カンバンやタスク・ボードを使ってプロジェクト作業を可視化することがあります。
- 継続的フロー・アプローチには、スループット、サイクル・タイム、およびリード・タイムが含まれます。
- タイムボックス化されたアプローチにはベロシティが含まれます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

28


情報ラジエーター




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

29

バーン・チャート: バーンダウン・チャート (イテレーション)



- イテレーションにおいて完了すべき作業を追跡します。
- 計画段階でコミットした作業の理想的なバーンダウンとの差異を分析するために使用します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.


30

レッスン9

バーン・チャート:バーンアップ・チャート
(リリース)

- 完了した作業の累積的な進捗を表示
- 各イテレーションの後に更新

 フィーチャー駆動開発(FDD)ではフィーチャー完了グラフとも呼ばれます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. 37
This material is being provided as part of a PMI course

タスク・ボード

- 作業をカード上のタスクに整理します。
- ワークフローの各段階でタスク情報を表示します。
- タスク・ボードのワークフロー・ステージをカスタマイズします。

 タスク・ボードの種類には、カンバン、やることリスト、手順チェックリスト、スクラム・ボードなどがあります。

未着手	進行中の作業	完了
項目A 見積り:4	項目C 見積り:6	項目B 見積り:8 実績:8
項目D 見積り:2	項目F 見積り:18	
項目E 見積り:8	項目J 見積り:1 計外	
項目G 見積り:20		



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course


ベロシティ:一定の割合を目指す

何か:ペロシティとは、チームがあらかじめ定められた期間内において、成果物を作成・検証・受け入れられるまでの生産性の速度を測る指標です。

どのように: イテレーション中に完了できるストーリー・ポイントの数を見積もって算出されます。その後のイテレーションでベロシティが修正されます。

なぜ: 目標は、あるイテレーションから次のイテレーションへと一定のペロシティ率を達成することです。

ストーリー・ポイントのベロシティ



❗ 「ペロシティはプロジェクト固有のメトリックスであり、チームのパフォーマンスを比較するために使用することはありません。」




© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. 33
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン9

継続的フロー:スループット、リード・タイム、サイクル・タイム


- ・ **進行中の作業**:仕掛かり中だが完了していない作業の測定
- ・ **リード・タイム**:作業項目がプロセス全体を通過するのにかかる時間の長さ
- ・ **サイクル・タイム**:作業項目に取り組んでいる時間の長さ
- ・ **スループット**:システムに投入されそこから出ていく項目の数



データ可視化:特性要因図

問題記述を分解して、個別の分岐で原因を特定します。

「なぜ」と問い続けることで、問題の主な原因、つまり根本原因を特定することができます。




「例:魚の骨図(または石川ダイアグラム)」

データ可視化:散布図

2個の変数間の関係を示すツールです。

散布図は、一方の軸にプロセス、環境、またはアクティビティのいずれかの要素を、もう一方の軸に品質欠陥を示して、それらの関係を示します。




レッスン9

データ可視化:管理図

時間の経過に伴うプロセスの予測可能性、振る舞い、安定性を判断するために使用されるツールです。


- 予測可能な結果を伴う繰り返しのプロセスに最適
- 平均値と、確立された管理限界および仕様限界を示す
- 「7の法則」に従います。傾向または潜在的な課題を示す、7つの連続するデータポイントの増加または減少について調査します。



データ可視化:ヒストグラムとパレート図

パレート図はヒストグラム的一种で、以下の特徴があります。

- 80/20の法則を使用
- 問題発生の頻度を示す
- 特定の問題や課題に関連するデータセットは分析するが、問題の根本原因は定義しない

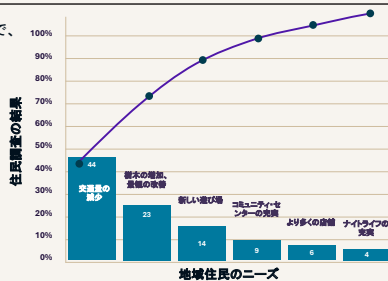

いくつかの定義



ヒストグラム

数値データを図示する棒グラフ



80/20の法則

多くの事象に応用可能な一般的なガイドライン。プロセスをコントロールする観点では、多くの問題や欠陥（一般に80%）は、比較的少数の原因（一般に20%）によって生み出されるという経験則。

レッスン9

プロジェクト状況の周知

ECO 2.9.7



コミュニケーション・マネジメント計画書



- ・ チーム・メンバーとステークホルダーを次のように特定します。
 - ・ 送信者
 - ・ 受信者
 - ・ 承認者(機密情報)
- ・ ステークホルダーのコミュニケーション要求事項をリストアップします。これには以下が含まれます。
 - ・ 情報の種類
 - ・ コミュニケーションの理由
 - ・ 言語、形式、内容、詳細レベル
 - ・ タイムフレームと頻度
 - ・ 受領/確認または応答が必要かどうか
- ・ 以下のためのプロセス、ガイダンス、テンプレート:
 - ・ エスカレーション
 - ・ コミュニケーション・マネジメント計画書の更新または調整
 - ・ プロジェクト状況会議、プロジェクト・チーム会議の実施、電子メールの送信、ウェブサイトの使用、プロジェクトマネジメント情報システム(PMIS)
- ・ プロジェクト情報:
 - ・ コミュニケーションの方法と技術
 - ・ 割り当てられた資源(時間と予算)
 - ・ 用語集
 - ・ フロー・チャート、ワークフロー、報告書リスト、会議計画
 - ・ 制約条件



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

ステークホルダー・エンゲージメント計画書とコミュニケーション・マネジメント計画書の関係性

ステークホルダー・エンゲージメント計画書

- ・ ステークホルダーの特定
- ・ ステークホルダー分析
- ・ エンゲージメント戦略
- ・ 監視と更新

コミュニケーション・マネジメント計画書

- ・ コミュニケーション要求事項
- ・ コミュニケーション方法
- ・ 役割と責任
- ・ コミュニケーション・スケジュール
- ・ フィードバック・メカニズム



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン9

コミュニケーション:2つの方法

積極的傾聴

- コラボレーションを可能にする
- 聞き手は、自分が聞いたことについて、以下の方法でフィードバックを提供する必要がある
 - 再表明
 - 言い換え
 - うなずくなどのボディランゲージの使用
- 理解を確認し、信頼を築く

効果的なフィードバックとは:

- 明確で具体的、かつタイムリーに提供されるもの
- 客観的で批判的
- 客観的なものとして受け入れて理解する場合は建設的
- 誤解されている場合、または信頼と心理的安全性が欠如している場合は非建設的



- 受信者からのフィードバックがない場合は、メッセージが暗黙のうちに受容されたとみなします。
- コミュニケーションの失敗はプロジェクトにおいては脅威であるため、チームのレトロスペクティブ（振り返り）時に、コミュニケーションの課題についてチーム・メンバーと直接オープンに話し合います。主要ステークホルダーの場合は、状況に応じてエスカレーションする必要があるかもしれません。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

43

効果的なコラボレーション

- オープンな対話と有意義なコミュニケーションを通じて、目的と期待に対する理解を最適化します。
- 継続的に関与します。
- エンゲージメント・レベルが変動することを受け入れます。
- 議論の透明性を確保します。
- ステークホルダーが十分な知識を持ち、期待が適切に設定されるよう支援します。
- コミュニケーション・スキル、人間関係のスキル、フィードバック、会議のマネジメントを活用します。
- フィードバック・ループを最大化し、有意義な洞察を得ます。
- 効果的なツールを使用します（例：共有ホワイトボードなど）。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

44

コラボレーション・アクティビティ

- 毎日の調整会議
- コロケーションまたは対面での作業
- スケジュールされたセッション（例：マイルストーン・レビュー、バックログの洗練セッション、プロジェクト更新会議など）
- 知識の移転におけるベアリングやコーチング
- 交渉



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

45

レッスン9

コミュニケーション・マトリックス



簡略化されたコミュニケーション・マネジメント計画書には、以下を含めます。

- 次のように特定したチーム・メンバーとステークホルダー:
 - 送信者
 - 受信者
 - 承認者(機密情報)
- ステークホルダーのコミュニケーション要求事項:
 - 情報の種類
 - コミュニケーションの理由
 - 言語、形式、内容、詳細レベル
 - タイムフレームと頻度
 - 受信や確認、または応答が必要かどうか
- エスカレーションするためのプロセス、ガイダンス、テンプレート
- プロジェクト情報—使用するコミュニケーション方法/技術



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

46

交渉するためのコミュニケーションとコラボレーション

- 交渉とは、合意に達するために、内外の関係者と話し合うことだと考えてください。
- 合意形成を目的として、効果的なコミュニケーション方法で相手とコラボレーションします。
- 建設的な交渉を意識し、成功の可能性を高めます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

47

報告と正式なコミュニケーション



適切なマイルストーンで正式な報告を行うことは、ステークホルダーとの継続的なコミュニケーションを維持するための確かな方法です。

また、作業に対して承認を得ることも必要です。

報告書の受領者と求められる報告頻度は、ステークホルダー・エンゲージメント計画書とコミュニケーション・マネジメント計画書に記載されます。



「いくつか例を思い浮かべることができますか？」



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.


48

レッスン9

ステークホルダーとそのエンゲージメントの監視

- 主要なタイミングでグリッドを更新します。
- 分析と専門家の判断を使用します。
- 今後の変更を可能にするために、配置理由の記録を保持します。
- グリッド内での位置に加えて、マネジメント戦略やアクションを個人に合わせてテラリングします。

① 「権力/影響力や権力/関心度のグリッドでは、絶対に名前を使用しないでください。」

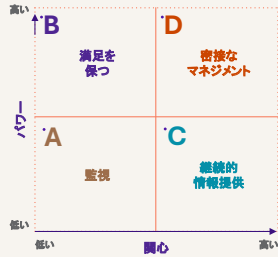

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

会議

- 誰にとっても時間は貴重です。効率的に会議を運営し、参加します。
- しっかりと計画を立てることが重要です。目的と望ましい成果を明確にした議事を用意します。
- 議論の時間をタイムボックス化しましょう。
- 積極的傾聴とフィードバックを実践します。
- コラボレーションを促進します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

ステークホルダー関与度評価マトリックス



- 専門家の判断、感情的知性、人間関係のスキルを用いてステークホルダーを評価します。
- ステークホルダー関与度評価マトリックスを定期的かつ頻繁に更新します。

① 「ステークホルダーをカテゴリー別に関与させ、コーチングを行い、ソリューションを見つけます。」



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン9

成果と顧客の期待との整合性



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

52

成果と期待の整合性



プロジェクト憲章に
期待と要求事項を
文書化します。



成果に対して測定可能
な成功基準を確立します。



ステークホルダー
登録簿と要求事項
文書を使用して明
確性を確保します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

53

プロジェクト全体を通じた整合性の維持

継続的なコミュニケーションによる整合性の維持:

- 進捗と顧客満足を定期的に監視します。
- 報告書、会議、フィードバック・ループを活用します。
- 手直しを避けるために、不整合に対しては迅速に対処します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

54

レッスン9

ツールと技法



ステークホルダー関与度評価マトリックス



コミュニケーション・マネジメント計画書



要求事項トレーサビリティ・マトリックス



調査と製品デモ



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

55

ステークホルダーの期待を監視し、それに応えるためのチーム・コミュニケーションの最適化

コミュニケーション・マネジメント計画書の早期策定

協働的な環境を育む

コミュニケーションを目標と役割に合わせる

メッセージに適したツールを使用する

コミュニケーションをプロジェクト・ルーチンの一部にする



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

56

チームの説明責任を支援し、ステークホルダーの期待に応える



明確で測定可能な目標を共同で設定する



役割と責任を明確化する



日常業務に説明責任を組み込む



心理的安全性を育む



適切なツールを提供する



重要業績評価指標 (KPI) やマイルストーンで進捗を監視する



最後まで責任を持ってやり遂げることを評価し、称賛する



期待する行動の模範を示す



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

57

レッスン9

RACI マトリックスの使用

- R** **Responsible (実行責任)**
タスクや成果物を完成させるために作業をする担当者です。
- A** **Accountable (説明責任)**
タスクを所有する担当者です。作業が確実に行われるようにし、最終的にその成果に責任を負います。
- C** **Consulted (相談対応)**
インプットや専門知識を提供する担当者です。プロセスへの積極的な参加者であり、多くの場合、当該分野専門家です。
- I** **Informed (情報提供)**
作業やレビューに直接関与しないものの、進捗や決定事項について最新情報を把握しておく必要がある担当者です。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

58

フィードバック・ループの必要性



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

59

ステークホルダーとの関与とコミュニケーションの計画

予測型アプローチ:

- 最初の重要な作成物として、ステークホルダー登録簿を作成します。
- 次のような組織のプロセス資産を参照します。
 - ステークホルダー登録簿のテンプレートと手順
 - 過去のプロジェクトの登録簿
 - ステークホルダーの優先事項と行動に関する教訓

適応型アプローチ:

- 正式なステークホルダー・エンゲージメント計画書は必要ない場合があります。
- ステークホルダー登録簿は、作成される場合と作成されない場合があります。
- プロジェクトはそれぞれニーズや優先事項に応じてテラーリングされます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

60

レッスン9

ステークホルダー・エンゲージメント計画書

ステークホルダー・エンゲージメント計画書は、プロジェクトマネジメント計画書の構成要素であり、以下のための戦略とアクションを概説します。

- 生産的なステークホルダーの関与の促進
- 意思決定とプロジェクト実施の支援
- ステークホルダーとの関係の確立、構築、維持



PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

61

コミュニケーション要求事項分析

コミュニケーションのニーズや優先事項を理解するために、以下を行います。

- ステークホルダーを直接関与させます。
- 以下のような重要な側面について話し合います。
 - コミュニケーションの頻度
 - 使用する方法と技術
 - コミュニケーションの対象となる事項
- 次の場合に、フィードバック・ループの確立が支援されます。
 - ステークホルダーが優先事項や懸念を共有する
 - チームがそれに応じてコミュニケーション戦略を調整する



PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

62

コミュニケーション要求事項分析の重要性



ステークホルダーのコミュニケーション・ニーズを明確に記述することにつながる



コミュニケーションのトピック、頻度、モデル、技術について効果的な選択が可能になる



ステークホルダーが自分たちのインプットがコミュニケーション計画に影響を与えることを知るフィードバック・ループを確立する

PMI Learning

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

63

レッスン9

[illegible]



Learning

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・プロフェッショナル
(PMP)®試験準備コース

プロジェクトの円滑な終結

レッスン 10



Learning

レッスン10







レッスン10

プロジェクトやフェーズを円滑に終結させるための判定基準の決定

ECO 2.10.2



© 2025 プロジェクトマネジメント協会。インク全ての権利を保持します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

プロジェクトやフェーズが終結する理由: 成果の達成 (1/2)



ステークホルダーは、プロジェクトマネジメント計画書に記載されているように、プロジェクトの開始時に定義された**受入基準**に基づいて成果物を承認します。

受入基準はプロジェクト・ライフサイクル中に変更されることがあります。

要求事項トレーサビリティ・マトリックスを使用して、すべての要求事項が確実に完了し、承認されるようにします。



受入基準

成果物が受け入れられる前に満たしておく必要がある一連の条件。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会。インク全ての権利を保持します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

プロジェクトやフェーズが終結する理由: 成果の達成 (2/2)



イテレーションの終了時に、チームとステークホルダーは、相互に合意した**Doneの定義 (DoD)**に基づいて、プロダクトやサービスを評価します。

最終的な受け入れは、プロダクトのリリース前に行われます。



受入基準とDoneの定義 (DoD) は、プロダクトに対するステークホルダーの満足度がどの段階にあるかを示す点で、同じ状態を表しています。チームによっては、これらの用語を同義として使用する場合があります。



Doneの定義 (DoD)

成果物が顧客の使用に耐えうるものとみなされるために必要な、すべての基準を満たしたチームのチェックリスト。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会。インク全ての権利を保持します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

レッスン10

早期または強制的な終結

- 要求事項やニーズが変更された場合
- プロジェクトまたは成果物の実現可能性が失われた場合
 - 内部要因: 組織がビジネス・ケースを変更した場合
 - 外部要因: 法的または規制上の変更により、プロジェクトの進行が禁止された場合
- プロジェクトまたは成果物が、もはや望ましいものではなくなった場合
 - 阻害要因が発生した場合
 - 要求事項を満たすための財政的支援を確保できない場合
 - 重大な影響を伴うリスクにより、成功裏の完了が不可能となった場合



「プロジェクトやフェーズの強制的な終結の例を共有できる人はいますか？」



© 2025 Project Management Institute, Inc. 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

7

プロジェクトまたはフェーズの終結活動

- 顧客による成果物またはプロダクトの受け入れを含みます。
- 成果物またはプロダクトの顧客への引き渡しを含みます。
- 企業全体および社内関連部門に通知し、組織のプロセス資産(OPA)を更新します。
- **最終報告書**を作成します。
- 法的、規制上、契約上の事項を含む外部義務を完了します(例: 責任の移転、財務システム上のすべてのアカウントの閉鎖)。
- プロジェクト情報を保管します。
- 資源(人材、財務、物的資産)を解放します。



最終報告書

プロジェクトのパフォーマンス、
スコープ、スケジュール、品質、
コスト、リスクに関する情報の要約。



これらの活動は、「プロジェクトまたはフェーズの終結」プロセスの一部であり、通常はプロジェクトマネジメント計画書およびワーク・ブレイクダウン・ストラクチャー(WBS)の中で、プロジェクトマネジメント機能として定義されています。



© 2025 Project Management Institute, Inc. 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

8

移管に向けた 準備状況の確認

ECO 2.10.3



© 2025 Project Management Institute, Inc. 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

9

レッスン10

引き渡し



成果物は顧客またはオーナーに引き渡されます。成果物の移管または引き渡しに関する仕様は、プロジェクトマネジメント計画に記載されています。



組織に価値をもたらすように調整されたソリューションであり、多くの場合、段階的に提供されます。



各イテレーションのアウトプットはすべてプロダクト・オーナーに引き渡されます。



・「組織によっては、展開計画や移管計画を使用します。」



・「これはプロジェクトマネジメント計画の構成要素では**ありません**。」



© 2025 プロジェクトマネジメント協会、インテグリティの権利を保持します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

10

移管と引き渡しの準備状況

顧客が変化を受け入れ、成功に向けて前進できるよう支援します。

準備状況によっては、利用定着を促進し、抵抗を克服するための追加的な変更マネジメント活動が必要となる場合があります。



「特に、既存のプロダクトやサービスをアップグレードする場合には、これらの対応が非常に重要です。」

関係者全体の準備状況を評価します。



エンドユーザー



組織



プロジェクト・チーム



サポート要員



© 2025 プロジェクトマネジメント協会、インテグリティの権利を保持します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

11

移管および引き渡しの活動

成果物またはプロダクトを効果的に移管し、引き渡すことで、エンドユーザーの認知が高まり、利用定着が促進されます。その結果、ベネフィットの実現につながる可能性が高まります。

移管活動には、次のようなものが含まれます。

- ・ 新しいプロダクトやサービスに関するトレーニング
- ・ プロダクト/成果物の文書化
- ・ プロジェクト・チームと組織間の効果的なコミュニケーション
- ・ 導入後のサポート(例:「ハイパーケア」)



「予測型プロジェクトでは、移管要求はどこに記録されますか？」



© 2025 プロジェクトマネジメント協会、インテグリティの権利を保持します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

12

レッスン10

早期および長期的なベネフィットの実現

ベネフィットの中には、すぐに実現するものもあれば、数か月から数年を要するものもあります。

ベネフィットが実現するタイミングは、次の要因によって異なります。

- 採用しているプロジェクト・ライフサイクル
- プロジェクト作業の性質
- 意図された成果


「価値が非常に早い段階で提供されるプロジェクトの種類を、特定できますか？」
「移管後、数か月、あるいは数年を経てから価値が提供されるプロジェクトを、特定できますか？」



© 2025 プロジェクトマネジメント協会、インク全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

13

ベネフィットの移管と維持: 責任

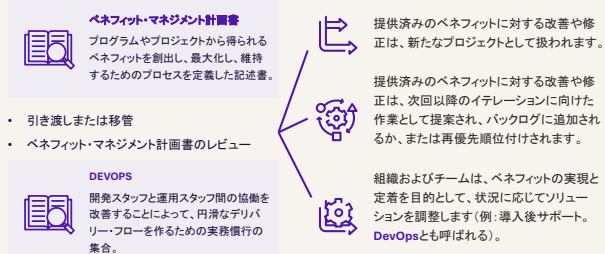

© 2025 プロジェクトマネジメント協会、インク全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

14

ベネフィットの移管と維持

プロジェクト・チーム	顧客	プロダクト・オーナーまたはプロジェクト・マネジャー
顧客組織にベネフィットを提供する	- 改善および提供済みベネフィットの継続的な創出を支援する - 顧客からの追加のインプットを取り込む	顧客と協力して、望ましい改善のために必要な作業を特定する
計画されたパフォーマンスデータを提供する	重要業績評価指標 (KPI) を含め、計画されたパフォーマンスと実際のパフォーマンスを比較する	チームとともに測定したメトリックスを使用してパフォーマンスを測定する
ビジネス・オーナーと協力し、ベネフィット実現のためのメトリックス (測定頻度や監視責任を含む) を提案する	ニーズに応じて調整された適切な間隔で、ベネフィット実現メトリックスを導入する	チームと協力して適切なメトリックスを決定する
ベネフィットの達成を妨げる可能性のある、残存リスクがないかを判断する	- ベネフィットの継続的な実現を確保するために必要なリスク、プロセス、ツールを特定する - 提供済みベネフィットに影響を与えるリスクを監視する	顧客要因ログ上のリスクを監視し、対応についてチームと協働する
プロダクトやサービスを使用するために必要な技術情報を提供する	技術情報 (FAQ など) を更新する	チームと協力して技術情報を更新する



© 2025 プロジェクトマネジメント協会、インク全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

15

レッスン10

ベネフィット・マネジメント計画書



プログラムやプロジェクトから得られるベネフィットを創出し、最大化し、維持するためのプロセスを定義した記述書。

- プロジェクトの承認に向けた重要なインプットとなります
- 要求されたベネフィットを検討し、有形・無形の事業価値の両方がプロジェクトから実現されるかを判断します
- 短期および長期のベネフィット実現までの期間を決定します
- ベネフィットの達成に責任を持つベネフィット・オーナーを特定します。これには、以下が含まれます。
 - 使用するメトリックスまたは尺度
 - 結果を測定する個人またはグループ



ビジネス文書

プロジェクト開始前に作成される成果物で、ビジネス・ケースの一部として使用されます。また、ベネフィットが提供されているかを確認するために、プロジェクトプロフェッショナルによって定期的にレビューされます。



「ベネフィット・マネジメント計画書では、残存しているプロジェクトリスクの中に、ベネフィットの達成を妨げる可能性があるものがないかを判断します。」



「主要ステークホルダーが望ましいプロジェクト・ベネフィットを特定する際には、そのベネフィットをどのように測定すべきかを提案してもらいます。」



© 2025 プロジェクトマネジメント協会、インフラでの権利を保留します。本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。 16

ベネフィット・オーナー

- プロジェクト期間中、プロジェクト・マネジャーまたはチームリードと協働し、計画されたベネフィットが提供される過程で適切に管理されるよう支援します
- 要求されたベネフィットを、受け入れ側組織に移管することを支援します
- 測定のメトリックスと方法が確立され、継続的に監視されるよう支援します
- 提供されたベネフィットの実現結果(価値)について、マネジメントに報告します



ベネフィット・オーナーは、ビジネスアナリスト、スポンサー、または定常業務マネジャーが担当場合があります。



プロダクト・オーナーは、プロジェクト作業が組織にとってのベネフィットにつながるよう支援する責任を負います。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会、インフラでの権利を保留します。本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。 17

ベネフィット実現の検証



選択したメトリックスを使用して、プロダクト・オーナーは各有形ベネフィットの進捗状況を報告します。

無形ベネフィットについては、主観的(定性的)な判断のほうが有用な場合もあります。

報告内容には、次の事項を含める必要があります。

- 有形ベネフィットについて: 目標に向けた進捗状況
- 計画どおりに実現できない可能性があるベネフィット
- 戦略目標に対するマイナスの影響
- プロジェクト・チームによるサポート終了の可能性



「予測型プロジェクトでは、移管が完了した後、ベネフィットが実現されていることを検証する責任は誰にありますか？」



© 2025 プロジェクトマネジメント協会、インフラでの権利を保留します。本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。 18

レッスン10

プロジェクト完了に関する プロジェクト・ステークホルダーの 承認の取得

ECO 2.10.1



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

19

ステークホルダー承認の取得



承認基準を早期に定義する



要求事項に照らして、完了状況をレビューする



受け入れレビューを実施し、促進する



未解決の課題を解消する



正式な承認を取得する



終結を関係者へ周知する



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

20

プロジェクトまたは フェーズ終結のための 最終活動

ECO 2.10.4



© 2025 プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

21


レッスン10

検証と解決

すべての成果物が完成し、最新の状態で、プロジェクトの目標を達成していることを確認します。

契約と運用に関連する未解決の課題、リスク、クレームをすべて解消します。

サインオフを通じて、成果物に対する顧客またはステークホルダーの正式な受け入れを取得します。



PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会。インク全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

22

事務終了



すべてのコストがプロジェクトに計上されていることを確認し、財務上の勘定をクローズします。

最終報告書やパフォーマンス・アセスメントを含む、プロジェクト文書の更新を完了します。

組織で活用できるよう、プロジェクトの記録と教訓をアーカイブします。

PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会。インク全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

23

資源と資産の再配置

プロジェクト要員を、新たな役割または別のプロジェクトに再配置します。

余剰となった資材、施設、設備、その他の資源を処分または再分配します。



PMI Learning

© 2025 プロジェクトマネジメント協会。インク全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一部として提供されるものです。

24

レッスン10

知識の共有



教訓セッションを実施し、将来のプロジェクトに活用できるよう、得られた知見を文書化します。

プロジェクトを通じて得られた知識や洞察を、組織に円滑に引き継ぎます。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会。インク全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

25

移管の準備状況

プロジェクトのアウトプットを、定常業務チームやステークホルダーに移管することを支援します。

定着、ベネフィットの実現、定常業務継続性に向けた準備が整っているかを検証します。

フィードバックと長期的なソリューション評価を、終結活動の一部として取り入れます。



© 2025 プロジェクトマネジメント協会。インク全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

26

レッスン10終了



レッスン10





Learning

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・
プロフェッショナル(PMP)®試験準備コース


組織的かつ継続的な 改善の促進

レッスン11



Learning

レッスン11







レッスン11

教訓の活用

継続的改善プロセスが最新の 状態に保たれるよう支援する

ECO 3.6.1、3.6.2



教訓

プロジェクトマネジメントにおける教訓とは、
プロジェクトを完了する過程で得られた洞察
や知識のことです。

教訓は、将来のプロジェクトの成果を高める
うえで不可欠です。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

教訓の収集



プロジェクト全体を
通じてセッションを
実施する。



中立的なファシ
リテーターを任
命する。



一貫したテンプ
レートと保管方法
を使用する。



教訓を共有し、
リスク・マネジメン
トの議論に組み
込む。



組織全体に知見
を定着させるため、
リーダーシップを
関与させる。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

レッスン11

継続的なプロセス改善の支援



- 構造化された変更マネジメントのアプローチを採用する。
- ガバナンス・プロセスを頻繁に評価し、改善する。
- 教訓を計画および実行の活動に反映させる。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.


7

組織のプロセス 資産の更新

ECO 3.6.3



組織の影響

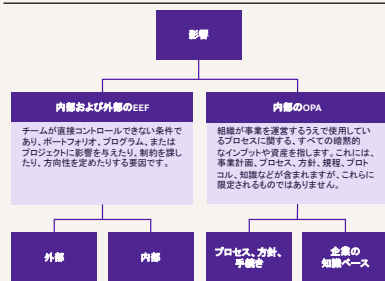

組織のプロセス資産 (OPA)

- プロジェクトに関する方針、手続き、テンプレート
- 過去のプロジェクト情報

組織体の環境要因 (EEF)


- 組織の内部および外部に存在する要因

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

9

レッスン11







レッスン11

組織変革がプロジェクトに与える影響の評価、および必要な対応の特定

ECO 2.9.2



変更マネジメント

- ・ 組織は、戦略の 環として変革を受け入れます。
- ・ プロジェクトマネジメント・オフィス(PMO)は、プロジェクトと組織の間の整合性を構築し、維持します。
- ・ 組織にPMOがあるかどうかにかかわらず、自分自身が変革の担い手です。
 - ・ 状況、人、タイミングに応じて戦略を調整します。
 - ・ 堅牢なアプローチを採用します。

変更マネジメント

個人、グループ、組織を、意図したビジネス上のベネフィットが実現される将来の状態へと現在の状態から移行させるための、包括的で循環的かつ構造化されたアプローチです。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. 14

組織変革がプロジェクトに及ぼす影響の管理

- ・組織文化を**評価**します。
- ・組織変革がプロジェクトに与える影響を**評価**し、必要な対応を特定します。
- ・プロジェクトに対する変更案を**提言**します。
- ・プロジェクト・スコープまたはバックログへの影響を把握するため、外部のビジネス環境を継続的に**監視**します。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course

レッスン11

組織のリスク、文化、変革



リスクしきい値とリスク選好度は、次のような多様な価値観によって形成されます。

- 国や地域
- 業界またはセクター
- リーダーシップ
- プロジェクト・チーム

これらを慎重に理解することは、次の目的において重要です。

- プロジェクトの立ち上げおよび計画において、効果的なアプローチを確立するため
- 業務を進めるうえで受け入れられている手段を特定するため



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

16

コッターの8ステップ変革方法論



- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1 緊急性を生み出します。 | 5 障害を取り除くことで、行動を可能にします。 |
| 2 指導的連合体を構築する。 | 6 短期的な成果を実現する |
| 3 戦略的ビジョンを形成します。 | 7 変革を基盤にします。 |
| 4 ビジョンを伝えます。 | 8 変更 を組織文化に取り入れます。 |

ソース：コッター、J. P. (1996年)。変革をリードすること。Harvard Business School Press。



17

変革を支援するための行動



すべきこと

- 同僚をコーチングしてビジネスを支援する—忍耐と共感に基づくメンタリングが重要です。
- アジャイルな事業運営システムを実現する—変革を中心としたマインドセットの定着を促すため、適応型アプローチについてチームメンバーをコーチングします。
- 知識を最新の状態に保つ—プロセスと知識を継続的に改善します。

すべきでないこと

- 変革を強制しない—関係者を巻き込み、相談しながら、変革の理由に対する納得と支持を得ることを目指します。
- 抵抗する人を除外しない—変革は対立を生む可能性があるため、慎重に進めます。



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

18

レッスン11

変革に向けた計画

プロジェクトによってもたらされる変革を実施するために必要な、知識移転、トレーニング、および準備状況に関する活動を定義します。

- 人々がどのように感じているかを把握するため、意識調査を含めます。
- 変化に慣れてもらうための情報提供キャンペーンを作成します。
- 変革による潜在的な影響について、オープンかつ透明性をもって共有します。
- ロールアウト計画の作成を検討します。

❗ 「ロールアウト計画は、プロジェクトマネジメント計画書の構成要素ではありません。」



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

19

PMP®

外部ビジネス環境 の変化の評価

ECOタスク3.8

© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.



外部ビジネス環境の変化を調査する

変化に基づき、プロジェクト・スコープおよびバックログ
への影響を評価・優先順位付けする

外部ビジネス環境を継続的にレビューする

ECO 2.9.3



レッスン11

外部ビジネス環境の理解



リスクや不確かさをもたらす外部要因や、好機を提供し、プロジェクトの価値や期待される成果に影響を与える外部要因を理解するには、フレームワークやプロンプトを活用します。代表的なプロンプトには、次のようなものがあります。

- **PESTLE**: 政治的、経済的、社会文化的、技術的、法的、環境的要因
- **TECOP**: 技術的、環境的、商業的、運用上、政治的要因
- **VUCA**: 変動性、不確かさ、複雑さ、あいまいさ

さらに、次の分析や検討も行います。

- 比較優位性分析
- 実現可能性調査
- SWOT(強み、弱み、機会、脅威)分析
- 前提条件分析
- 過去情報の分析
- 組織戦略とのリスク整合性の確認



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

22

内部ビジネス環境要因

- 組織の変革は、スコープに大きな影響を与える可能性があります。
- プロジェクト・マネジャー、プロジェクト・スポンサー、またはプロダクト・オーナーは、事業計画、組織再編、プロセス変更、その他の内部活動について十分に把握しておく必要があります。
- 内部のビジネス変化により、次のような事態が生じる可能性があります。
 - 新たな成果物が必要となる
 - 既存の成果物の削除を含む、価値の優先順位の見直し



© 2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.
This material is being provided as part of a PMI course.

23

レッスン11終了



レッスン11





Learning

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・
プロフェッショナル(PMP)®試験準備コース


次のステップ

レッスン12



Learning

レッスン12

[illegible][illegible][illegible]

レッスン12

採点と休憩



誤答による減点はありません



10分間の休憩が2回設けられており



各セクションを提出すると、その前の問題には戻れません




© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保有します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

4

試験内容ドメイン

■ 人 ■ プロセス ■ ビジネス環境



重要なポイント: 試験当日までに、試験の構成(時間配分、形式、ドメイン)を十分に把握しておきましょう。



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保有します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

5

出題形式

セクション2



レッスン12

PMP資格認定試験の出題形式



PMI Learning

© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

7

シナリオベースの問題

シナリオベースの問題の例：

- ・ **変更要求**：プロジェクトのベースラインが承認された後に、主要なステークホルダーから変更要求が出されました。プロジェクト・マネジャーは、次に何をすべきですか。
- ・ **リスク対応**：プロジェクトの実施中に、事前に特定されたリスクが発生し、2週間の遅延が生じました。プロジェクト・マネジャーが次に取るべき行動はどれだろうか。
- ・ **スケジュールの課題**：AI ベースのスケジューリングでは、システム統合テストとユーザー受入れテストを重複させることで、プロジェクト・スケジュールを短縮できる。プロジェクト・マネジャーは、統合欠陥がまだ多く、使用受入テストに大きな影響度をもたらす可能性を認識している。プロジェクト・マネジャーは何をすべきか。

重要なポイント：このような問題では、プロジェクト・マネジャーが次に取るべき行動はどれだろうか。

PMI Learning

© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保留します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです。

8

次のステップ

第3章



PMI Learning

レッスン12

ステップ1：一貫性を保ち積極的に行動する

次の3つの原理・原則に従います。

- ・ 一貫性
- ・ アクティブ学習
- ・ 責任



ステップ2：学習資源の適切な組み合わせを使用する



基礎を学ぶ 知識を深める 実務慣行
試験経験



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保有します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです

ステップ3：プロジェクト・マネジャーのように考える

定義を呼び出す代わりに、
PMP試験では、次のことが求められます。

- ・ 状況分析
- ・ 考えられる回答を評価する
- ・ 最適なアクションを選択する



レッスン12

クリティカル・シンキングスキル

問題を練習するときは、次の点に焦点を当てる。

- 正解の理由を理解する
- 複数の妥当な選択肢の評価
- プロジェクトマネジメント原理・原則の適用
実際のシナリオ



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保有します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです

ステップ3：実際の試験経験をシミュレートする

受験日付：

- ・ 複数回の実務慣行試験を受験する
- ・ 実際の試験タイミング構造に従う
- ・ 同じ間隔で休憩する実務慣行
- ・ 不正解のレビュー
- ・ ロジックを理解する



© 2025 プロジェクト・マネジメント協会 (PMI) 全ての権利を保有します。
本資料はPMIコースの一環として提供されるものです

ステップ4：動機づけは変動する

モチベーションを維持するには、次の戦術を試してほしい。

- ・ カレンダーで学習時間をスケジュール
- ・ 邪魔なものを取り除く
- ・ 家族や同僚にサポートを求める
- ・ マイルストーン報奨の設定



© 権利を保有します。 17
されるものです

レッスン12

ステップ5：受験場所の決定



対面式のメリット：

- 家の雑念の減少
- テクノロジーの心配なし
- 静かなテスト環境



オンラインの利点：

- 利便性
- 身近な環境
- 柔軟なスケジュール設定



試験がんばってね!

Bonne chance! 幸運を!

□□□ □□! Viel Glück!

행운을 빌어요! Boa sorte!

¡Buena suerte! 祝你好运!

Good luck!



レッスン12終了



レッスン12





Learning
