

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・
プロフェッショナル(PMP)®試験準備コース

基礎を築く

レッスン2

レッスンの概要

このレッスンでは、プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル(PMP)®資格認定の試験内容の概要に記載されている以下のタスクについて説明します。

- 共通のビジョンを策定する(ECO 1.1)
- ステークホルダーを関与させる(ECO 1.4)
- ステークホルダーの期待を整合させる(ECO 1.5)
- ガバナンスを定義し、確立する(ECO 3.1)

共通のビジョンを 策定する

ECOタスク1.1

主要ステークホルダー間で 共通のビジョンを確立する

ECO 1.1.1

ビジョンを全員に理解してもらうために: ガイドライン



- 対人スキルおよびリーダーシップの「パワースキル」を活用し、オープンなコミュニケーション・チャネルを維持する
- アジャイル・アプローチを柔軟かつ創造的に活用する
- **プロダクト・ボックス演習**
- **エクストリーム・プログラミング(XP)のメタファー**

プロダクト・ボックス演習



望ましいソリューションや成果を説明するための手法。マーケターが製品の箱に機能や価値(ベネフィット)を表現するのと同じように、ステークホルダーがソリューションの特徴や利点を言語化する。

XPメタファー



プログラムがどのように機能するかについての共通ビジョンを表現する、エクストリーム・プログラミング(XP)で一般的に用いられる手法。

プロジェクト合意事項について合意が得られたら...



プロジェクト憲章の作成方法は一つではありませんが、いずれのプロジェクトにもプロジェクト憲章の策定が不可欠です！



プロジェクト憲章*

役割と重要性:

- プロジェクトを正式に承認する
- プロジェクト・マネジャーがプロジェクト作業に資源を割り当てることを可能にする
- プロジェクトの根拠およびビジネス・ニーズを明確にする
- 戦略目標との整合性を確認する
- 明確なプロジェクト・ビジョンに全員の意識を集中させる



「通常は、プロジェクト・スポンサーまたはプロジェクト・マネジャーが、経営幹部やステークホルダーの承認を得て作成します。作業範囲記述書(SOW)がプロジェクト憲章の役割を果たすこともあります」。



プロジェクト憲章

プロジェクト・イニシエーターまたはスポンサーによって発行され、プロジェクトの存在を正式に承認するとともに、プロジェクト・マネジャーに対して、プロジェクト活動に組織の資源を適用する権限を付与する文書

プロジェクト憲章：目次

含まれる主な内容：

- 氏名：プロジェクト・スポンサー、プロジェクト・マネジャー、主要ステークホルダー
- プロジェクトの説明（初期要件および測定可能な目標を含む）
- ビジネス・ニーズ（財務目標やマイルストーンを含む）
- 集約スケジュールとマイルストーン
- 前提条件、境界条件、制約条件（全体リスク、容認要求事項、承認された予算を含む）
- ビジネス・ケースからの情報（成功基準と終了基準を含む）

プロジェクト憲章: 例



PROJECT CHARTER

PROJECT NAME		PROJECT MANAGER	PROJECT SPONSOR
Shawpe Lifestyle Center (SLC)		Ang Fen	Eugene Lowe
EMAIL	PHONE	ORGANIZATIONAL UNIT	
ang.fen@shawpe.com	000.000.0000	Executive	
ESTIMATED COSTS	EXPECTED SAVINGS	EXPECTED START DATE	EXPECTED COMPLETION
\$10 Million	\$0	Jan 20XX	Dec 20XX+2

PROJECT OVERVIEW

PROBLEM OR ISSUE	Rehabilitate commercial property in downtown Oasestown
PURPOSE OF PROJECT	Establish a profitable commercial development and community partnership in Oasestown
BUSINESS CASE	Attached. Approved by E. Lowe and BOD at Oct 20XX meeting.
GOALS / METRICS	Building code and other local government compliance with historic district construction
EXPECTED DELIVERABLES	"Rehabilitate 128,000 sq metre indoor/outdoor space to meet municipality standards and compliance with National Heritage & Conservation Board (NHC) standards / Property management entity established with Oasestown partner / Secure 14-18 highly reputable commercial tenants"
RISK - CONSTRAINTS, ASSUMPTIONS	1. Site in historical conservation zone 2. New vendors for specialist glasswork and masonry 3. Physical retail market stability 4. Resistant key stakeholder 5. Phase 3 financing dependent on success of Phases 1 and 2

PROJECT SCOPE

WITHIN SCOPE	1. Manage construction contractors and site development; 2. conduct marketing and advertising to secure 14-18 high-quality tenants to anchor commercial space; 3. Work with community partners to establish socially beneficial community spaces and programs; 4. Manage project budget (funded by external grant) within compliance
OUTSIDE OF SCOPE	1. architectural work - interior and exterior - Oases Architects 2. building work - XYZ General Contractors, ZYX specialist contractors 3. External grant fund management

TENTATIVE SCHEDULE

KEY MILESTONE	START	FINISH
Form Project Team / Preliminary Review / Scope	00/00/0000	00/00/0000
Finalize Project Plan / Charter / Kick Off	00/00/0000	00/00/0000
Phase 1	Design and build interior	00/00/0000
	Create contract with community groups	00/00/0000
	Recruit 14-18 tenants	00/00/0000
Phase 2	Design and build outdoor spaces	00/00/0000
	Install community programs	00/00/0000
	Secure \$5M revenue in annual commercial rents	00/00/0000
Phase 3	Finalize all construction	00/00/0000
	Train SLC property management staff	00/00/0000

共有ビジョンの推進

ECO 1.1.2

共通理解を構築する: ガイドライン

- プロジェクト合意事項(ビジョン記述書およびプロジェクト憲章)を、ステークホルダーおよびチームと共有する。
- 合意形成とコミットメントを得るために、合意または交渉を行う。
 - プロジェクト合意事項: ステークホルダー向け
 - 役割と責任、優先順位および担当割り当て: チーム向け
- プロジェクト全体を通じて、合意事項を遵守する。



オープンで信頼性の高いコミュニケーション手法を用い、リーダーシップのパワースキルを発揮します。

プロジェクト・ビジョン記述書

- プロジェクト・スポンサーまたは経営幹部によって作成される
- 達成すべき目標の明確なビジョンを示し、組織の戦略目標と整合している
- 整合性を維持するため、プロジェクト全体を通じて参照する

プロジェクトを全体的に理解する:交渉の目的

まず確認すること...

- プロジェクト合意事項に関する交渉の範囲(境界)
- 議論や問題解決の対象となる事項(該当する場合)
- プロジェクトが目指す望ましい目標

そのうえで...

- クリティカル・シンキングとビジネス感覚を活用する
- 組織の状況(組織内の全体像)や事業目標の中で、プロジェクトがどのような位置づけにあるかを把握する

プロジェクトの全体像を把握する方法

ステークホルダーに対して、ビジョンや提供された意見・情報について詳しい説明や明確化を求めます。特に、スポンサーにはプロジェクト・ビジョン記述書の明確化を依頼します。既存の合意事項には、プロジェクトに関する初期の意図が含まれていたり、プロジェクトの内容が記載されている場合があります。

- 外部関係者との契約書
- 覚書き
- サービスレベル・アグリーメント
- 合意書または意向表明書
- 口頭での合意
- 主要ステークホルダー間のコミュニケーション(特に電子メール)
- 作業範囲記述書(SOW)

ビジネス・ケースとビジネス・ニーズを参照する

ビジネス・ケース:

- 事業として実現可能かどうかを評価する調査
- プロジェクト作業によって得られるベネフィットを明確にする
- 以降のプロジェクト活動を正式に承認するための根拠を提供する

ビジネス・ニーズ文書:

- ハイレベルな成果物を特定する
- 正式なビジネス・ケース作成の前提条件となる
- 要求事項を記述する(何を作成し、または実施する必要があるか)

プロジェクト・ビジョンを 最新の状態に保つ

ECO 1.1.3

プロジェクト・ビジョンとは何か？

プロジェクト・ビジョンとは：


- 強力なモチベーション・ツール
- プロジェクトが目指す将来像に対して、情熱や意義を生み出す手段



優れたプロジェクト・ビジョンの特徴


優れたプロジェクト・ビジョンとは:

- プロジェクトの概要を簡潔にまとめている
- 達成しうる最良の成果を示している
- 共通で一貫性のあるイメージを生み出す
- 成果に対する情熱を喚起する

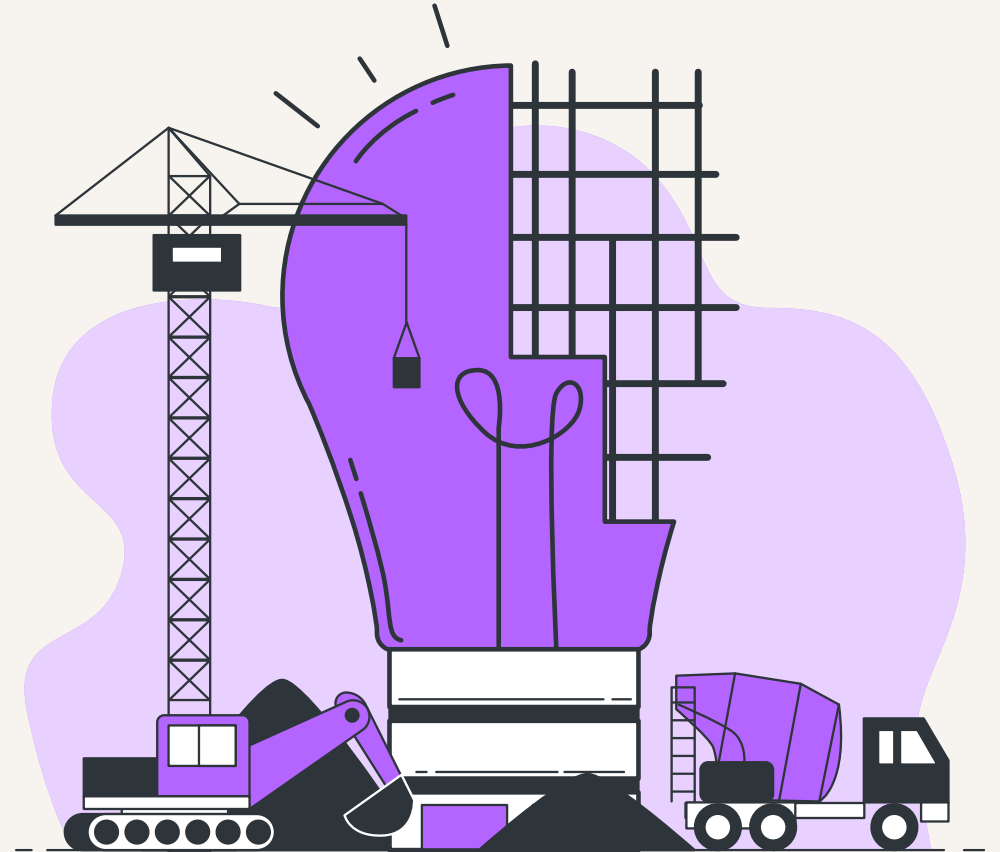

プロジェクト・ビジョンを軸とした協働

- プロジェクトの目的は何か？
- プロジェクトが成功したと言える基準は何か？
- プロジェクトの成果が提供されたとき、将来はどのように良くなるのか？
- プロジェクト・チームは、プロジェクト・ビジョンから逸脱していることをどのように把握できるか？

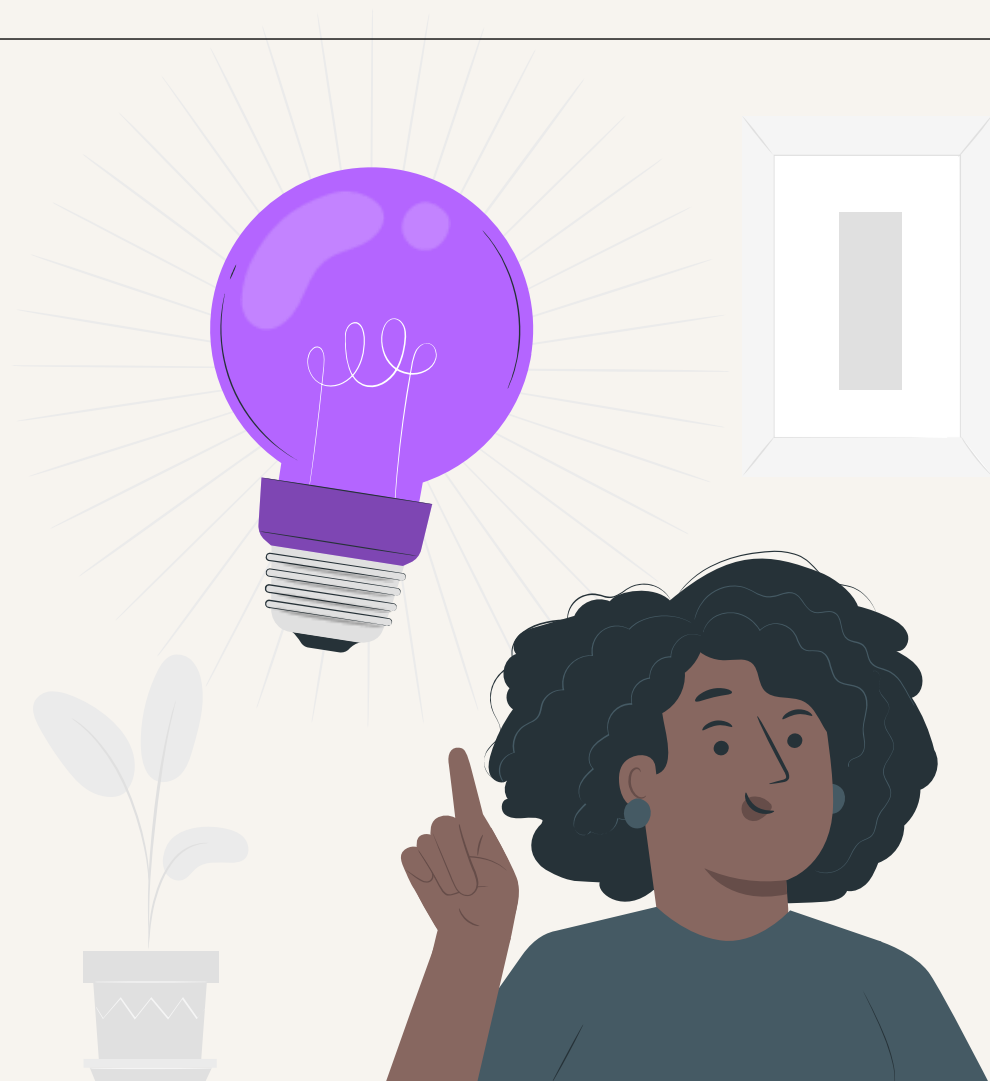

プロジェクト・ビジョンに基づいて成果を実現する

成果物そのものではなく、目指す成果に目を向けることで、プロジェクト・チームは、単に成果物を作るだけでなく、プロジェクトのビジョンや目的の実現に近づくことができます。

成果物は成果の実現を支える要素ではありますが、それだけでビジョンや目的が完全に達成されるとは限りません。



状況を分解し、プロジェクト・ ビジョンに関する誤解の 根本原因を特定する

ECO 1.1.4

誤解の根本原因を特定する

ステップ1

関係するすべてのステークホルダーと関与する

ステップ2

実際の問題を特定するために、より深く掘り下げる

ステップ3

影響しているすべての要因を分析する

ステップ4

生じている可能性のある誤解を調査する

ステップ5

合意した内容の実行を支援する

5つのなぜ: 例

実際の問題を特定するために、より深く掘り下げる

なぜPMP試験に合格できなかったのか？

なぜ多くの質問を間違えたのか？

相手が何を聞いているのか、なぜわからなかったのか？

どの試験分野を勉強しなかったのか？

なぜ適応型アプローチについて勉強しなかったのか？

多くの問題を間違えていた。


何を聞いていたのか、本当に知る必要がある。

長年プロジェクトに携わってきたので、勉強する必要はないと思っていた。

予測型アプローチについてはよく知っていたが、適応型アプローチについては十分に理解していなかった。

試験の幅を過小評価していた。

特性要因図の例

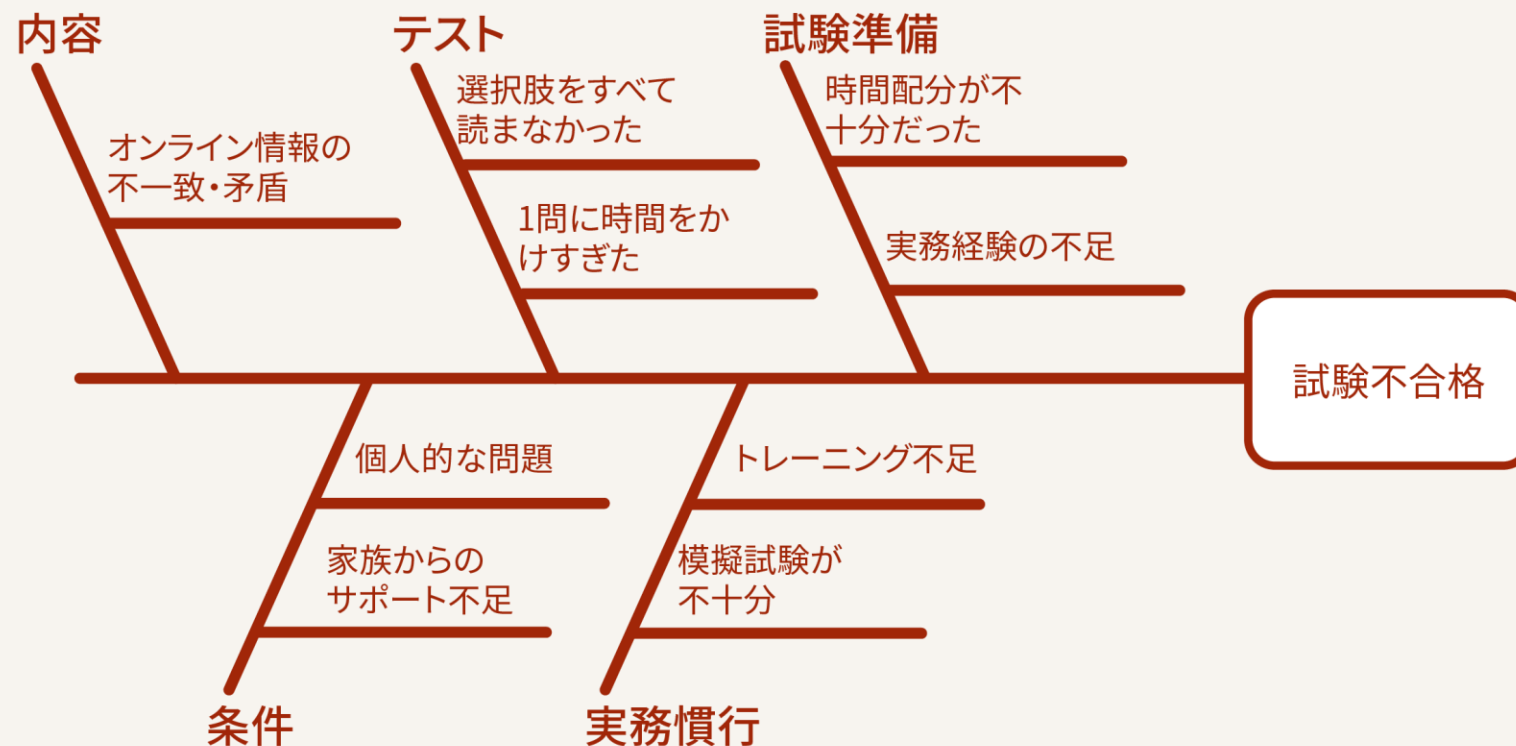

石川, 薫 (1968年)。品質管理ガイド。東京: JUSE (日本科学技術連盟)。

ステークホルダー を関与させる

ECOタスク1.4

ステークホルダーの特定

ECO 1.4.1



代表的なプロジェクト・ステークホルダー*



ステークホルダー

ポートフォリオやプログラム、プロジェクトの意思決定、活動、成果に影響を与える、または影響を受ける、あるいは影響を受けると感じている個人、グループ、組織。

これらのステークホルダーを分類できますか？通常、プロジェクト・チーム・メンバーであるのは誰ですか？誰が該当しませんか？プロジェクト作業に積極的に関与するのは誰ですか？

- エンドユーザー
- マネジャー
- サプライヤーとコントラクター
- 顧客
- スポンサー
- 政府機関
- 従業員
- ビジネス・パートナー
- コミュニティ
- 組織

ステークホルダーの特定

誰がステークホルダーか？

- ビジネスケースやベネフィット・マネジメント計画書で関係者の名前を確認する
- その後、課題/阻害要因ログ、変更ログ、要求事項文書を確認し、その他の必要な関係者や記載されている人物を特定する

プロジェクトとの関係性は何か？

- 関心
- 関与度
- 相互依存関係
- 影響
- プロジェクト成功への潜在的な影響度



「プロジェクトの後半で想定外の事態が起こらないよう、早い段階でステークホルダーを特定し、関与させましょう」！

ステークホルダーおよびコミュニケーション・マネジメント:概要

- ステークホルダー登録簿
- ステークホルダー・エンゲージメント計画書
- コミュニケーション・マネジメント計画書
- ステークホルダー・エンゲージメント評価マトリックス
- 評価用グリッド/マトリックス/モデル



ステークホルダーの分析

ECO 1.4.2

ステークホルダーの評価



ステークホルダー分析

プロジェクト全体を通じて、誰の利害を考慮すべきかを判断するために、定量的および定性的な情報を体系的に収集し分析する手法。

データ収集

- アンケートと調査
- ブレーンストーミング

データ分析

- ステークホルダー分析
- 文書分析

データ表現

- 二次元(2D)グリッド
 - 権限/関心度
 - 権限/影響力
 - 影響度/影響力
- 三次元(3D)グリッド—ステークホルダー「キューブ」
- セイリエンス・モデル
- 影響の方向性

ステークホルダー登録簿の作成



ステークホルダー登録簿

プロジェクトのステークホルダーの評価や分類など、ステークホルダーに関する情報を含むプロジェクト文書

- 重要なステークホルダー情報を収集し、記録します。
- 組織のプロセス資産(OPA)を考慮します。
- プロジェクトを通じて更新し、ステークホルダーとの関係性の変化を記録します。



ステークホルダー・エンゲージメント計画書を実行するために必要な情報を含みます。



- 過去の類似プロジェクトのステークホルダー登録簿を参考にしてください。
- これは公開文書であることを念頭に置き、記載する情報が適切であることを確認してください。

ステークホルダー登録簿



	氏名	役職名	内部/ 外部	プロジェクトでの役割	主な要求事項	期待	影響力/ 態度
1	Eugene Lowe	CEO	内部	スポンサー	正常完了	スケジュールどおりの完了、効果的なパートナーシップ	主導的
2	Oasestown Municipality		外部	政府パートナー(連絡担当)、資金提供者、SLC用地所有者	施設およびパートナーシップの成功	説明責任	支援的
3	Kara Black	プリンシパル(Oases Architects)	外部	パートナー、設計者、専門知識(保存建築)	明確な設計ブリーフ、効果的なパートナーシップ	柔軟な資金調達と円滑なコミュニケーション、設計の裁量	主導的
4	Josie Bynoe	取締役会議長	内部	Shawpe Industriesの戦略的地域パートナーシップ推進	プロジェクト作業の環境持続可能性、「著作権人格権」	Oasestown保全地区・環境への悪影響がないこと	抵抗的
5	Helen Grey	事業開発責任者	内部	プロダクト・オーナー	注目度の高いテナント、地域・保全面での高評価	組織学習、リーダーシップ機会	中立的
6	Hasan Persaud	事業開発担当VP	内部	ポートフォリオ・オーナー	継続的な収益創出能力	フェーズ3でのエンドユーザー	中立的
7	Mandeep Chahal	財務担当VP	内部	予算管理責任者	資金提供パートナーとの直接連携	明確なデータ	中立的
8	Kei Leung	マーケティング担当VP	内部	マーケティング専門家	ブランド価値の向上	高品質のテナント	支援的
9	テナント		外部	収入源	特注スペース	高品質	中立的
10	コントラクター		外部	ベンダー(建設)	明確な指示、契約		中立的
11	Oasestown地元住民		外部	プロジェクト周辺居住者	交通・騒音対策	不便が生じないこと	抵抗的
12	Oasestown Community Partnership		外部	Oasestownで活動するコミュニティ・グループ	なし	Shawpeライフスタイルセンター内の無償スペース	主導的

ステークホルダーを理解する

肩書きだけで判断しない

権力	権限のレベル
関心	プロジェクトの成果についての懸念のレベル
影響 (姿勢または影響)	- プロジェクトの成果に影響を与えたり、計画や実行に変更をもたらしたりする能力 - プロジェクトへの潜在的な貢献または混乱の大きさ 「無関心」、「抵抗的」、「中立」、「支援的」、「主導的」など、状況を表す用語を使用




「これは公開文書であるため、特に抵抗的なステークホルダーについては、実名を記載しない方が賢明な場合があります。氏名の代わりに番号を使用してください」。

ステークホルダーの認識

顧客中心のプロジェクトマネジメントでは、ステークホルダーの認識を包括的に把握する必要がある

ステークホルダーの認識は、ネガティブであれポジティブであれ、プロジェクトに悪影響を及ぼす可能性がある

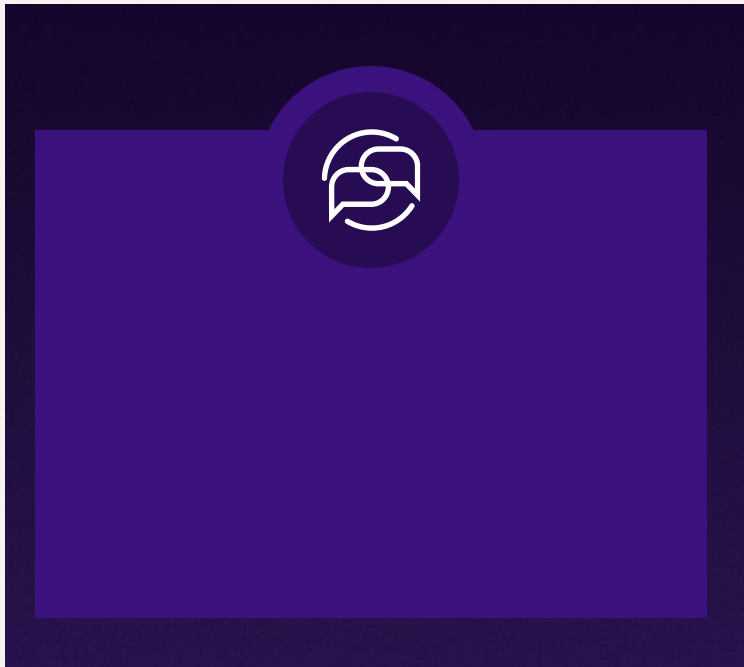

ステークホルダーのフィードバックと認識の把握



- 対人関係のスキル
- 積極的傾聴
- 感情的知性
- 効果的なコミュニケーション方法



主要ステークホルダー

- プロジェクトに対する要求事項、ビジョン、コミュニケーションの好みを理解するためのインタビュー



すべてのステークホルダー

- 適切で定期的なプロジェクト・コミュニケーション




大規模で公開性の高いグループ

- アンケート/調査
- ファシリテートされた対話・セッション(オンラインまたは対面)
- デジタルメディア(メールキャンペーン、ウェブサイト、グループチャット)
- ポスターや広告

ステークホルダーのニーズ に応じたコミュニケーション の分析とテールリング

ECO 1.4.3

コミュニケーション要求事項分析



- ステークホルダーのコミュニケーション・ニーズを明確に言語化できる
- コミュニケーションの内容、頻度、方法、使用するテクノロジーについて、効果的な選択が可能になる
- 分析結果は、コミュニケーション・マネジメント計画書に記録される

コミュニケーション: 手法とテクノロジー



他にどのようなコミュニケーション手法や技法をプロジェクトで使用していますか？

組織として使用を認めていないコミュニケーション手法はありますか？それはなぜですか？

会議/口頭

- 対面
- オンライン(ビデオ会議)
- 電話

デジタル/電子メディア

- ウェブサイトとソーシャルメディア
- インスタント／テキスト・メッセージ(電話またはプラットフォーム経由)
- 電子メール

物理的

- ボディランゲージとジェスチャー
- ホワイトボード

コミュニケーション・アプローチ




インタラクティブ

- 会話（電話、オンライン、対面）
- メッセージング
- ワークショップ/コラボレーション
- ホワイトボードの活用



適応型チームでは、高い協働性を実現するため、可能な限りメンバーを同一拠点に配置します。



プッシュ型—ステークホルダーに送信

- 電子メール・メッセージ
- メモ
- 状況報告

プル型—ステークホルダーが必要に応じて参照

- イン트라ネット・サイト
- ナレッジレポジトリ
- ドキュメントライブラリ



コミュニケーションにおける課題と考慮事項


- 情報ニーズの緊急性
- テクノロジーの利用可否および信頼性
- 使いやすさ
- プロジェクト環境(言語、形式など)
- 情報の機密性と秘匿性
- コミュニケーションに関する組織のプロセス資産(例: ソーシャルメディア運用ルール)
- データ保護法/規制
- アクセシビリティ要件

コミュニケーション・モデル




情報伝達の例を思い浮かべてください。使用する手法によって、どのようなノイズ(阻害要因)が影響する可能性がありますか？

異文化コミュニケーションのためのコミュニケーション・モデル

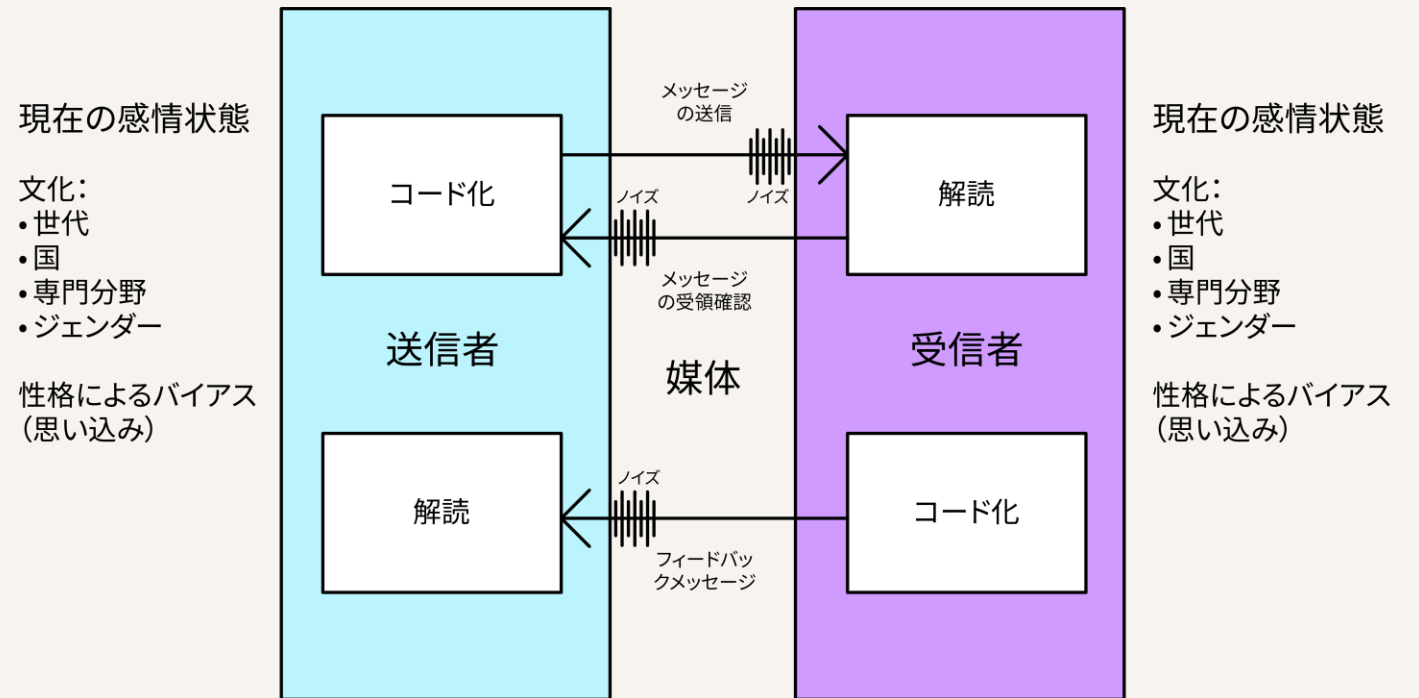

ステークホルダーとのコミュニケーションの計画



プロジェクトのステークホルダー・エンゲージメント計画書とコミュニケーション・マネジメント計画書は、相互に関連した作成物です。



ステークホルダー・エンゲージメント計画書

プログラムマネジメント計画書またはプロジェクトマネジメント計画書の構成要素のひとつです。プログラムまたはプロジェクトの意思決定と実行において、ステークホルダーの生産的な関与を促進するために必要な戦略と行動を特定します。

チームは、**コミュニケーション・マネジメント計画書**に記載されたコミュニケーションを通じて戦略を遂行します。



コミュニケーション・マネジメント計画書

ポートフォリオマネジメント計画書、プログラムマネジメント計画書、またはプロジェクトマネジメント計画書の構成要素のひとつです。情報をどのように、いつ、誰が管理し、発信するかを記述します。

ステークホルダー・ エンゲージメント 計画書の実行

ECO 1.4.4



ステークホルダー・エンゲージメント戦略

- ステークホルダーの関与を促進する。
- 効果的なマネジメント戦略の実行を支援する。
- 良好な関係を築き、継続的に維持する。



ステークホルダー・エンゲージメントのマネジメント

ステークホルダーとコミュニケーションを取り、協同することで、以下を実現します。

- ステークホルダーのニーズと期待に応える。
- 発生した課題に適切に対処する。
- 適切なレベルでのステークホルダーの関与を促進する。

主なベネフィット

- ステークホルダーからの支持を高める。
- プロジェクトに対する抵抗を最小限に抑える。



ステークホルダー・エンゲージメントのマネジメント



ステークホルダー・エンゲージメントを管理するには:

- 重要な段階でステークホルダーを関与させ、継続的なコミットメントを確保する。
- 明確なコミュニケーションと交渉を通じて、期待値を管理する。
- リスクに対処し、ステークホルダーの懸念を予測する。
- 特定された課題を明確にし、解決する。

ステークホルダーのニーズ、 期待、プロジェクト目標間の 整合性を最適化する


ECO 1.4.5

ステークホルダーのニーズの整合



- 議論の透明性を保ちます。
- ステークホルダーに必要な情報を共有し、期待値を管理するとともに、全体像を示します。
- ステークホルダーのニーズや制約条件への理解を深めるために、積極的に関与します。

ステークホルダー関与度評価マトリックス例



「ステークホルダーのエンゲージメント・レベルのラベルは、プロジェクトの状況、チーム、または組織に合わせて調整してください」。

「マトリックスに実名を使用せず、ステークホルダーは番号で参照してください」。

ステークホルダー	関心	抵抗的	中立的	支援的	主導的
ステークホルダー1	C			D	
ステークホルダー2			C	D	
ステークホルダー3				C、D	

C—現在の関与度レベル | D—望ましい関与度レベル

マネジメントとリーダーシップ

目標によるマネジメント


- 明確な目標を使用して生産性を導き、意欲を促す。
- チーム・メンバーと協力して目標を設定する。
- 挑戦的でありながら達成可能な目標を設定する。
 - プロジェクトやフェーズの開始時
 - イテレーション計画セッションなど、プロジェクト・ライフサイクル全体を通じて

サーバント・リーダーシップ

3つのステップ:

1. ビジョンを定義する。
2. 人々をそのビジョンに整合させる。
3. ビジョンの実現に向けて人々を動機づける。

チームの取り組みと価値提供との整合を継続的に図る

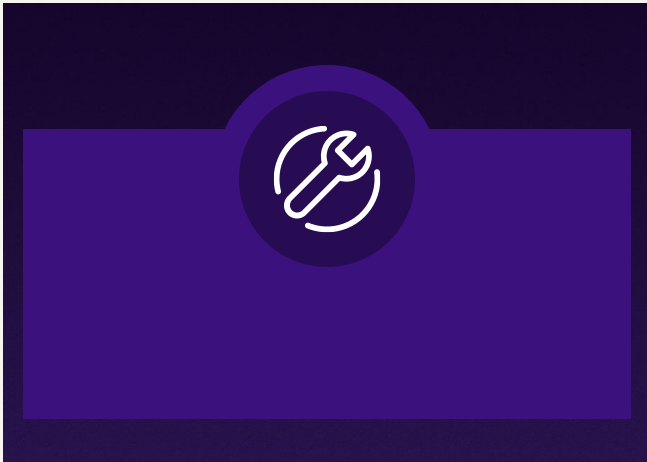

チームの結束を優先し、価値の提供に注力します。

チーム・メンバーや外部の関係者の参加や離脱、変更や混乱が生じたときは、チームが再調整できるようにサポートします。

- 新しいメンバーを、新しい知識やモチベーションの源として歓迎する。
- プロジェクトのゴールと合意事項についての共通理解を促進する。
- チーム・メンバーがどのように価値を付加できるかを、協働して見出す。
- 混乱や対立を建設的に乗り越える。

信頼の構築と ステークホルダーへの 働きかけによる プロジェクト目標の達成

ECO 1.4.6

信頼を築くための価値観



誠実さ



正直さ



公正さ



尊重

特にプレッシャーのかかる状況において、意思決定の指針とする。

誠実さと公正さを行動で示す。

共通の利益を最優先に考える。

ステークホルダーとの信頼関係を構築する。

ステークホルダーへの影響力の発揮

信頼は影響力の源

効果的なリーダーは、信頼を活用してステークホルダーに働きかけ、成功への支持を得ます。



ステークホルダー の期待の調整

ECOタスク1.5

ステークホルダーの分類

ECO 1.5.1





ステークホルダー・マッピング

2つの次元を使ってステークホルダーをマッピングします。

- 権限/関心度グリッド
- 権限/影響力グリッド
- 影響度/影響力グリッド

または、3つの次元(立方体)を用いて、分析をさらに精緻化することもできます。

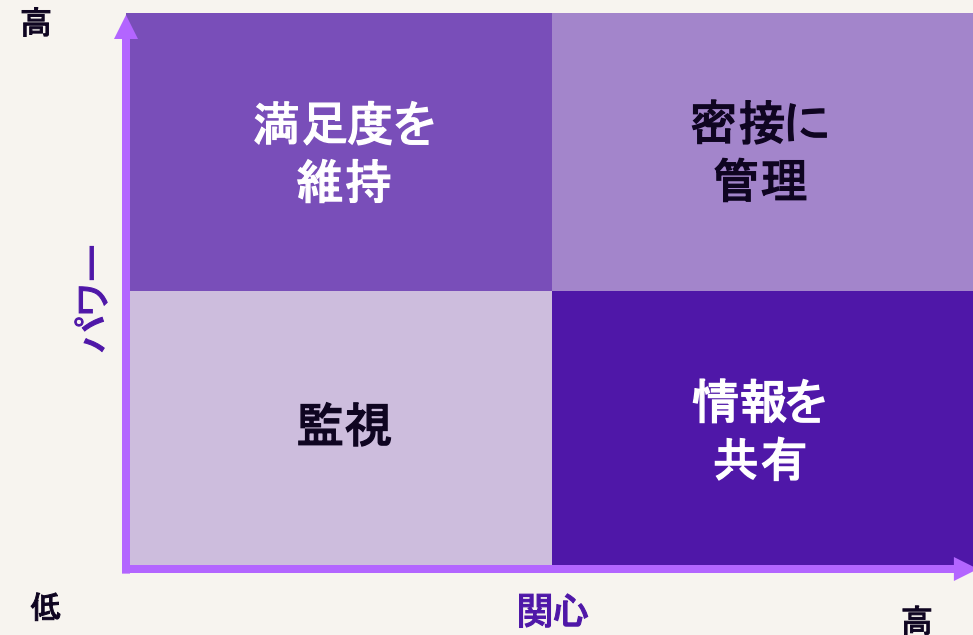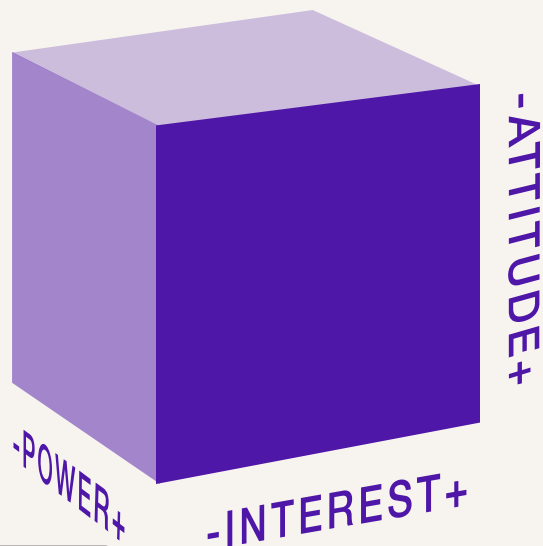

方法:

- 各ステークホルダーをグリッド上に配置する(実名は使用しない)。
- 象限のラベルは同じまま、軸のラベルを変更して使う。



影響の方向性

プロジェクト・ステークホルダーが形成するソーシャルネットワークを理解し、特にプロジェクトに対してどの方向に影響を及ぼすかを把握する必要があります。

上向き	親組織—シニアマネジメント(事業面・財務面の利害関係)
下向き	プロジェクト階層内—チームまたはスペシャリスト
外向き	プロジェクトの利害関係者—クライアント、エンドユーザー、外部関係者
横向き	資源をめぐる協調関係または競合関係—プロジェクト・マネジャーの同僚、他部門・他部署

セイリエンス・モデル



プロダクト・オーナーの役割に注目してください。その人は、意思決定を行い、プロジェクトを前進させるために、プロジェクトに十分に精通し、関心を持ち、関与していますか？

緊急性

- 必要とされる注意や詳細対応のレベル
- 時間的制約
- 影響の大きさ

正当性

意思決定における権限のレベル、または(チーム内ステークホルダーに適用される)プロジェクト作業への適切な関与度合い・近接性を示すもの

パワー

権限のレベル

ステークホルダーの 期待の特定

ECO 1.5.2

ワークショップとインタビュー

ファシリテートされたワークショップは、特定の目的に向けてステークホルダーを集め、協働を促す手法です。この場合は期待値を整合させることが目標です。

インタビューは、1対1の形式でステークホルダーから情報を引き出すために用いられます。事前に質問を用意する構造化インタビューとして行うことも、自由な対話を許容する非構造化インタビューとして行うこともできます。



検証と整合



ステークホルダーと定期的に関与し、期待を検証するとともに、プロジェクト目標と整合させます。

誤解を解消し、プロジェクトの範囲内で実現できないかもしれない期待に対処します。

フィードバック・ループを導入します。

合意事項と決定事項を文書化します。

プロジェクト成功基準についての交渉と合意

ステークホルダーへのインタビューを実施します。
技術的成功基準に関する**専門家の判断**を収集します。
以下を確認します。

- 組織(プログラム、定常業務)における**重要業績評価指標 (KPI)**
- 教訓と過去のデータ
- 品質方針
- ユーザー受入れテストの要求事項



- 目標に対する報告と検証の基準
- 各テストにおける成果物および目標の受入基準の特定



- イテレーション成果物に加え、プロジェクトのDoneの定義(DoD)が指定される場合もある

重要業績評価指標(KPI)



組織のリーダーシップによって定義され、組織の目的や目標に定められた達成目標または最終状態に向けた進捗を評価するために用いられる指標であり、戦略上の整合の実現を支援するもの。

期待のすり合わせのための 議論のファシリテーション

ECO 1.5.3

会議の前に



準備と 計画

プロジェクトの状況、目標、ステークホルダーの期待に関する関連データと情報を収集します。



明確な目標を 設定する

会議の目標を明確に定義し、参加者全員と事前に共有します。

会議中



ステークホルダー を関与させる

すべてのステークホルダーに積極的な参加を促します。




効果的にファシリテートする

効果的なファシリテーション手法を用いて、会議の流れを適切に管理します。



明確化とコミュニケーション

プロジェクトの目標について、全員が共通の理解を持てるように努めます。



合意形成を図る

プロジェクトの状況、目標、ステークホルダーの期待に関する関連データと情報を収集します。

会議後



文書化とフォローアップ

会議での主な成果、合意事項、アクション・アイテムを文書化します。



安心して意見を出せる雰囲気をつくる

ステークホルダーが自分の考えや懸念を気兼ねなく共有できるような、前向きでオープンな環境を育みます。

メンタリングの機会を整理し、 行動につなげる


ECO 1.5.4

メンタリング・プログラムの設定



目的と目標を定義する

メンタリング・プログラムの目標を明確にします。



ニーズを評価する


組織内のスキルや知識のギャップを特定します。



参加者を募集・選定する

メンターおよびメンティーの候補者を特定し、募集します。

メンタリング・プログラムを成功に導く準備



メンターとメン ティーのマッチング


目標、関心、経験レベルに
基づいて、メンターとメン
ティーをマッチングします。



参加者への トレーニングの提供


メンターとメンティーに対して、
メンタリング関係を最大限に
活用する方法についてト
レーニングを実施します。

メンタリング・プログラムの運営



プログラムを 実施する

明確なタイムライン、
構造、計画されたアク
ティビティを備えたプロ
グラムを開始します。



双方向の学びを 促進する


メンターとメンティーの
両方が互いの経験か
ら学べる環境を促進し
ます。



継続的なサポー トを提供する

参加者と定期的に状
況を確認し、支援を行
うとともに、発生した課
題に対処します。

プログラムの評価と監視

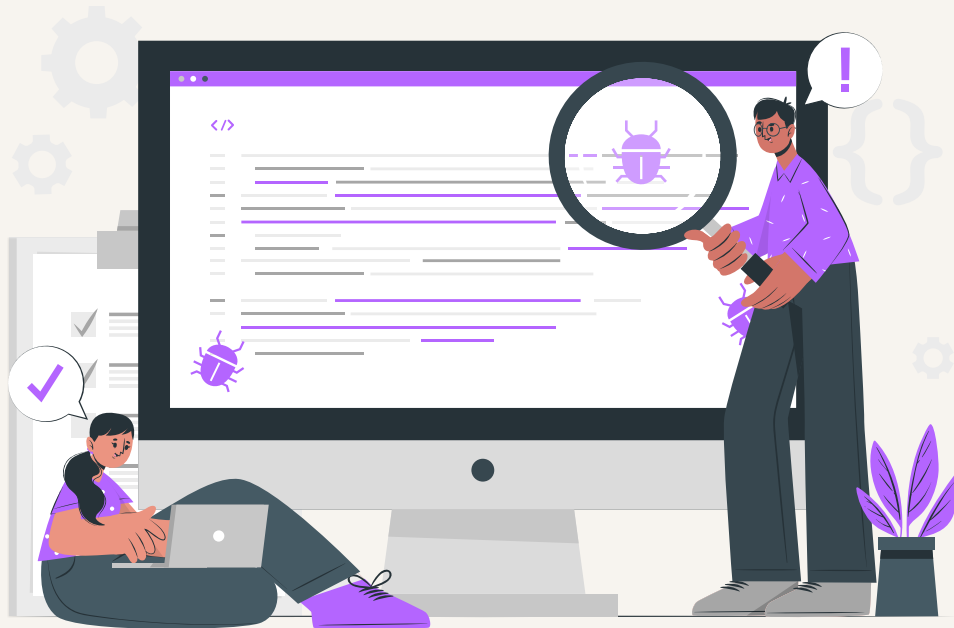

参加者からのフィードバックを通じて、プログラムの有効性を継続的に評価します。

メンタリング・プログラムの価値を示すために、成果や成功事例を記録します。

ガバナンスの 定義と確立

ECOタスク3.1

組織のプロセス資産を活用した、 組織の構造、ルール、手続き、 報告、倫理、方針の定義

ECO 3.1.1


プロジェクトマネジメント・オフィス



組織エンティティであり、通常は部門またはチームとして設立され、主にポートフォリオ、プログラム、および/またはプロジェクトの管理に関連する活動を一元化する任務を負っています。これらの活動の性質は、各組織の固有のニーズに応じて異なるものです。



リソース
マネジメント



アプローチ
開発



トレーニングと
監督



監視
コンプライアンス



文書化
マネジメント



コミュニケーション
の調整



「大規模で確立された多くのプロジェクト指向の組織には、プロジェクトマネジメント・オフィスがありますが、このオフィスはプロジェクトマネジメントの実践においては必須要件ではありません」。

プロジェクトマネジメント・オフィスのタイプ



支援型

- 優先すべき実務慣行、方法論、標準、テンプレートを開発
- プロジェクト・マネジャーのコーチング、メンタリング、トレーニング、指導



コントロール

- プロジェクト監査を通じて、プロジェクトマネジメントの標準、方針、手続き、テンプレートの遵守状況を監視



指示型

- 共有リソースを管理
- 複数のプロジェクトにわたるコミュニケーションを調整



アジャイル・センター・オブ・エクセレンス

- チームのコーチング
- 組織全体にアジャイルのマインドセット、スキル、能力を構築
- スポンサーとプロダクト・オーナーをメンタリング


組織の影響

組織体の環境要因(EEF)

- 組織の内部および外部に存在する要因

組織のプロセス資産(OPA)

- プロジェクトに関する方針、手続き、テンプレート
- 過去のプロジェクト情報

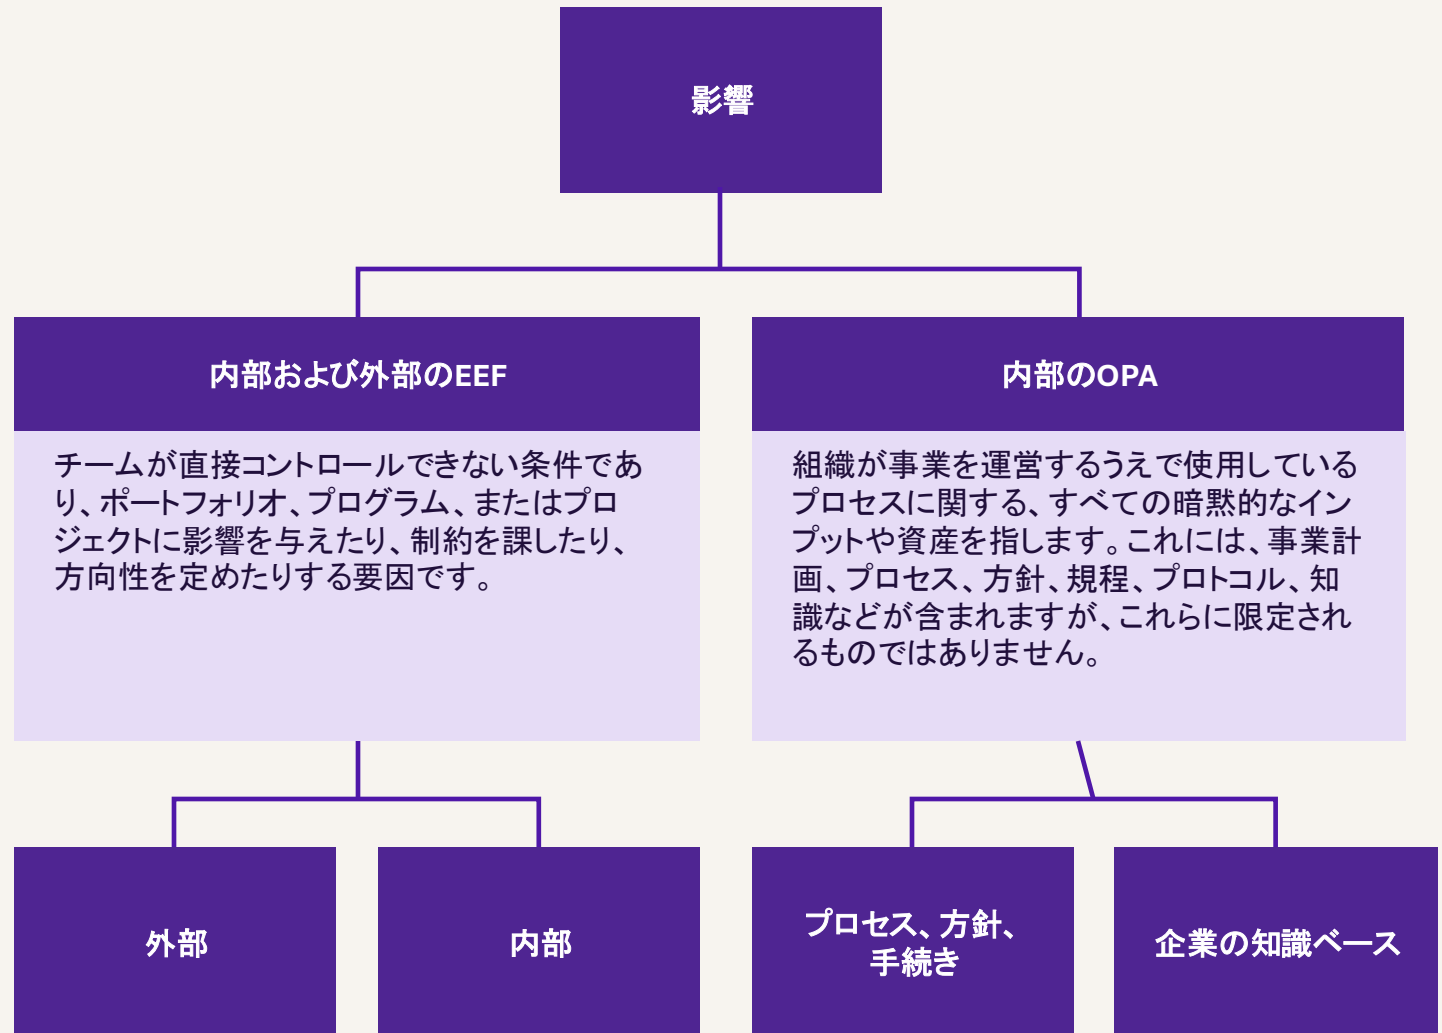

ポートフォリオ、プログラム、プロジェクト

ポートフォリオ マネジメント	戦略目標を達成するためにグループでマネジメントされるサブポートフォリオ、プログラム、プロジェクト、および定常業務の集合	ビジネス戦略と整合
プログラム マネジメント	個別にマネジメントすることでは得られないベネフィットを得るために、協調的な方法でマネジメントされる、関連するプロジェクト、サブプログラム、およびプログラム・アクティビティのグループ	コンポーネントと相互依存をコントロールし、ベネフィットを実現
プロジェクト マネジメント	独自のプロダクト、サービス、所産を生み出すために行われる有期的な活動	組織のゴールと目標の達成を実現

成功要因の定義

ECO 3.1.2

プロジェクトの成功



プロジェクト:

価値を創出するために、独自のコンテキストにおいて実施される一時的な取り組みです。



プロジェクトの成功とは:

プロジェクトの受益者、その他のステークホルダー、プロジェクト参加者が合意した見解において、プロジェクトが作業工数と経費に見合う価値を提供したと認識されたことを示します。

次元1:プロジェクト成果の達成

- 事業価値の実現における有効性を測定する
- 価値はプロジェクトの実行中、完了後、または長期にわたって実現される
- 戦略的な成果を反映する:
 - 売上高、投資収益率(ROI)、新規顧客の獲得
 - 市場での地位、イノベーション
 - コンプライアンスと持続可能性



プロジェクト成果
の達成

プロジェクト成果メトリックスの例

- 財務: 総収入増加、投資収益率 (ROI)
- 非財務:
 - 市場への先行投入
 - 顧客獲得
 - プロセスまたは技術の改善
 - 環境および社会的目標の達成



プロジェクト成果
の達成

次元2:プロジェクトマネジメント・プロセスの成功

- 制約条件への順守状況を測定する:
 - 予算
 - スコープ
 - タイムライン
 - 品質
- 実行面を評価する



プロジェクト成果
の達成

実際の例



シドニー・オペラハウス

- 計画: 700万豪ドル、4年
- 実績: 1億200万豪ドル、14年
- 結果: ユネスコ世界遺産、世界的な象徴
- 成果は実現したが、マネジメントは失敗



モントリオール高架道路

- 橋梁設計と高架道路の位置ずれが発生
- コスト: 1,100万カナダドル(完成から1年後に解体)
- プロセスの失敗が価値提供に悪影響を及ぼした

ガバナンスの エスカレーション経路と しきい値の定義

ECO 3.1.3

プロジェクト・ガバナンス

プロジェクトの目標を達成または上回るために、プロジェクトマネジメント活動を導く枠組み、機能、プロセス群。

主なベネフィット：

- 説明責任の所在を一本化できる
- プロジェクト・ライフサイクル全体を包含する



「ガバナンスの形態は、組織やプロジェクトによって異なります」。



プロジェクト・ガバナンス:どのような形で、どの程度必要か？



ガバナンスが過剰だとステークホルダーの不満を招く一方、緩すぎるとステークホルダーの関与や説明責任が不十分になるおそれがあります。

ガバナンス:

- 通常はすでに整備されている—プロジェクトマネジメント・オフィスによって確立されているか、組織の方針と整合しています
- プロジェクトの戦略的重要性、制約条件、監督要件に依存します




- 「社内外のビジネス環境の変化や、予算、スコープ、スケジュール、資源、品質の逸脱を管理する上で重要です」
- 「予算マネジメントに対する監督は、ガバナンスの重要分野です」

プロジェクト・ガバナンス：構成要素

以下に関するプロセス：

- 変更
- コミュニケーション
- 文書管理（例：プロジェクトマネジメント計画書）
- 意思決定
- プロジェクト・プロセス要求事項に対する内部ステークホルダーの整合性
- プロジェクト・マネジャーの権限レベルを超える変更のレビューと承認
- リスクと課題の特定、エスカレーション、解決
- ステージ・ゲート・レビューまたはフェーズ・ゲート・レビュー
- プロジェクト・ガバナンスと組織戦略の整合のためのガイドライン
- プロジェクト・ライフサイクルと開発アプローチ
- 役割を明確にしたプロジェクト組織図
- プロジェクトの成功基準と成果物の受入基準
- プロジェクト・チーム、組織内のグループ、外部ステークホルダー間の関係



適応型プロジェクトにおけるガバナンス

適応型プロジェクトにおけるガバナンスには、次のような特徴があります。

- 成果物や期待事項を文書化する
- 以下を通じて、プロジェクト状況を明確に把握できる：
 - 定義されたイテレーション/スプリントの期待事項および成果物
 - 特定の日付でのリリース
 - 日次の調整ミーティングを通じた、プロジェクト成果のリアルタイム監視


反復型アプローチでは、予測型アプローチよりも迅速かつ低コストで、価値に基づく成果物を特定できます。

ガバナンス委員会（プロジェクト委員会または運営委員会）



プロジェクト・ガバナンス委員会の経験がある方はいますか？
ご自身のプロジェクトでは、どのように機能していますか？

- プロジェクトに対する監督を提供する
- プロジェクト・スポンサーやシニア・マネジャー、プロジェクトマネジメント・オフィスの資源で構成される場合がある
- 担当する場合がある業務：
 - 主要要素成果物のレビュー
 - プロジェクト上の意思決定に対する指針の提示




スクラムやSAFe®を採用するプロジェクトでは、プロジェクトと組織レベルのガバナンスをつなぐために、中間的なガバナンス・ボードが用いられます。

ガバナンスはエスカレーション手続きを定義する

プロジェクトで定められたしきい値や許容範囲を超える問題が発生した場合：

- 対応権限を持つ責任あるステークホルダーにエスカレーションする。
- 一方、問題がしきい値や許容範囲内にある場合は、チームと協働して解決策を見出す。

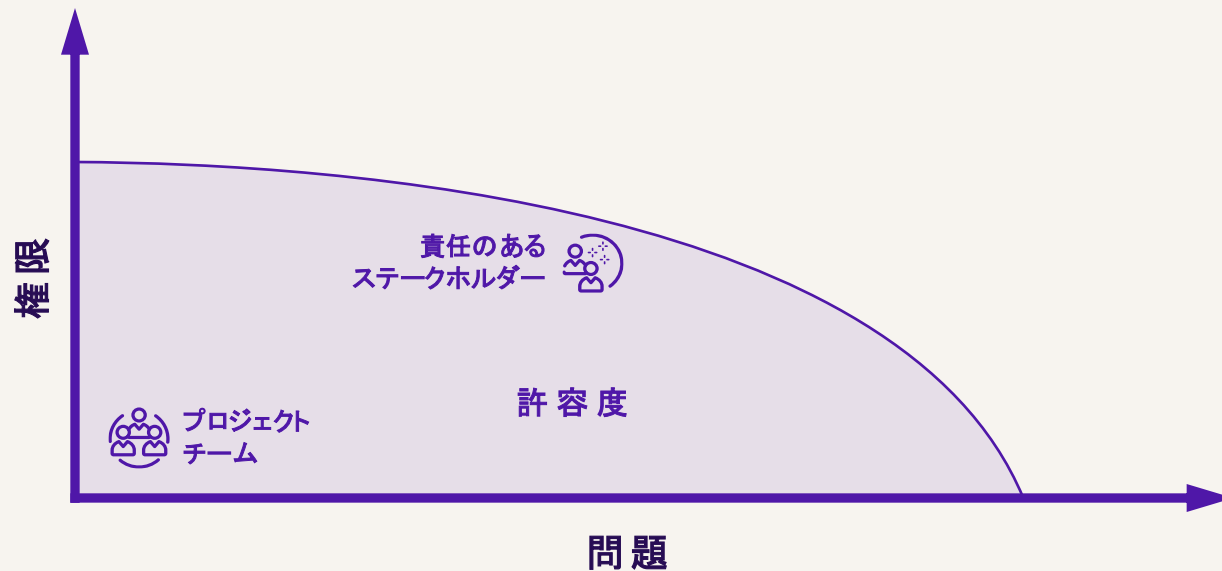

しきい値

測定可能なプロジェクト変数の事前決定値で、それに達した場合にアクションを起こす必要がある限界値を表します。




許容度

品質、リスク、予算、またはその他のプロジェクト要求事項において受容できる変動を定量的に表したものの。

ガバナンスとライフサイクル:システムとしての視点




ガバナンス・システムは、価値実現システムであるプロジェクト・ライフサイクルと並行して機能します。



理由は、業務フローを円滑にし、課題を管理し、意思決定を支援することにあります。

ライフサイクルの成果
としての価値実現



ライフサイクルに組み
込まれた価値実現



「プロジェクトマネジメントの原則は、システム間の相互作用を認識し、評価し、対応することです」



プロジェクト・ライフサイクル

プロジェクトの開始から完了までに通過する一連のフェーズです。

ガバナンス・チェックポイント:フェーズ・ゲートとイテレーション

 予測型	 適応型
作業をフェーズに分割	作業をイテレーションに分割
フェーズ・ゲート(ガバナンス・ゲート、中止点、トールゲートとも呼ばれる)で結果をレビューする	イテレーションの終了時に結果をレビューする
判断内容: - 次のフェーズに進む - 修正を加えて続行する、または - プロジェクトやプログラムを終了する	フィードバックを収集し、次のイテレーションで価値を高めるための改善策を実行する
	顧客の受入基準(例: Doneの定義)が満たされるか、プロジェクトが終了するまで続ける

プロジェクト・フェーズ：関係性



プロジェクト・フェーズは、1つ以上の成果物の完成に至る、論理的に関連するプロジェクト・アクティビティの集合です。あるフェーズのアウトプットは、一般に次のフェーズへのインプットとなります。フェーズ間の関係は、**順次的**である場合もあれば、**重複**する場合があります。



順次関係

フェーズ間の連続関係。フェーズは連続して発生し、重複しません。



重複関係

フェーズ間の重複関係。複数のフェーズが互いに同時進行します。

予測型プロジェクト・フェーズへのガバナンスの適用



フェーズ 開始時：

- プロジェクトの前提条件を検証し、妥当性を確認する。
- リスクを分析する。
- フェーズの成果物について詳細な説明を提供する。

フェーズ 終了時：


- 主要要素成果物が作成される。
- 完全性および受入可否を確認するためのレビューを実施する。




「重大なリスクが発生した場合、成果物が不要になった場合、または要求事項が変更された場合、そのフェーズやプロジェクトは終了されます」。

報告およびガバナンス・プロセスの支援

報告とガバナンスのプロセスを支援することは、プロジェクト情報が正確で、タイムリーであり、組織の意思決定および監督構造と整合している状態を維持するサポートを行うことです。

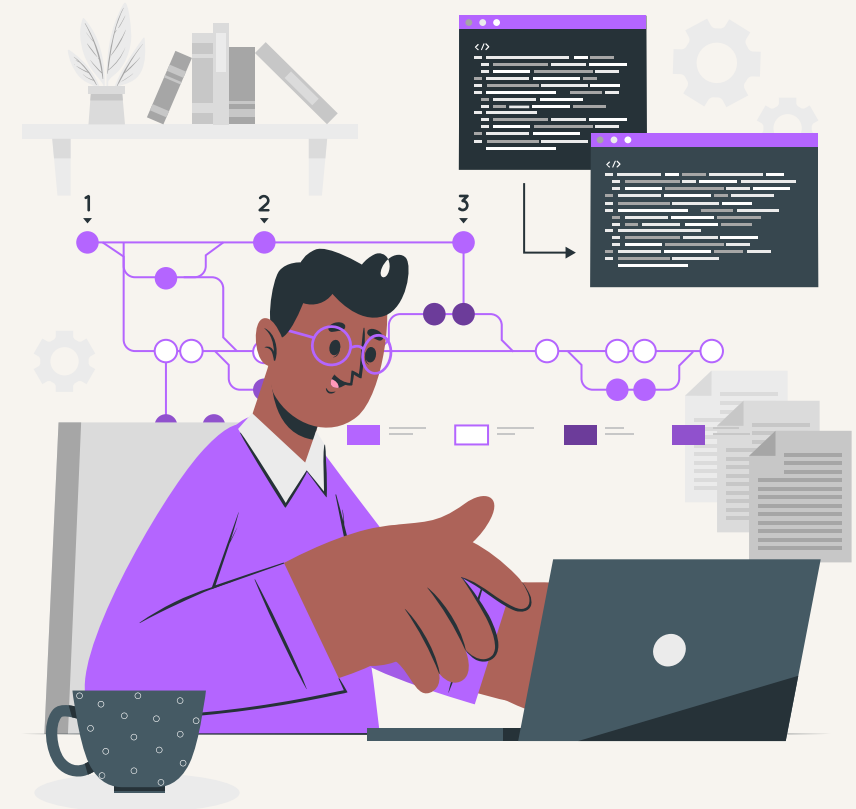

プロジェクト・ガバナンス・フレームワークとの整合性



組織のガバナンス
構造を理解します。



必要なガバナンス
機関が適切な情報
を受け取ることを
支援します。



段階ゲートまたは
フェーズ・ゲート・レ
ビューのプロセス
に従います。

意思決定とエスカレーションの促進



ステークホルダー
の意思決定を支援
するため、タイム
リーで正確なデー
タを提供します



合意されたプロトコ
ルに従って、課題、
リスク、または変更
をエスカレーション
します




決定事項を文書化
し、アクション・アイ
テムを追跡します

コンプライアンスと可監査性のサポート

プロジェクトをできるだけ簡単にレビューできるようにします。

- 内部の方針、標準、および監査要求事項に従います。
- 重要な決定事項と文書のトレーサビリティを確保するのに役立ちます。
- 監査やプロジェクト後のレビューの準備として、記録を完全かつ整理された状態で保管します。

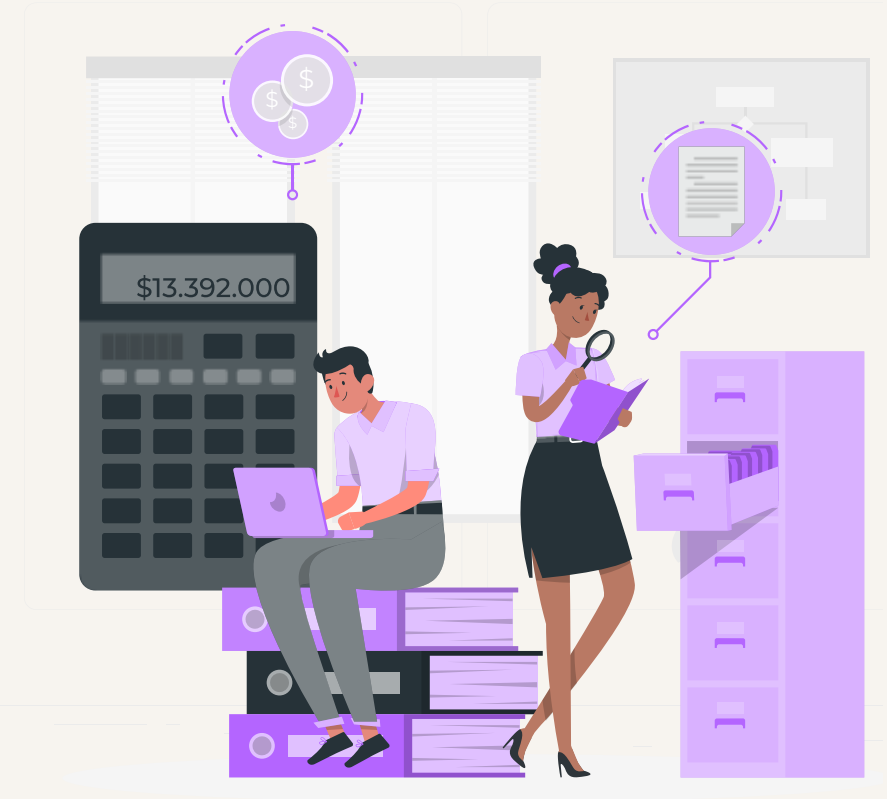

透明性のある積極的なコミュニケーション

プロジェクトをできるだけ簡単にレビューできるようにします。

- 信頼できる一貫性のある最新情報を共有します。
- 積極的にリスク、差異、リカバリー計画を伝えます。
- ダッシュボード、スコアカード、視覚化などのツールを使用して、パフォーマンスの傾向を強調します。

プロジェクトのパフォーマンスは、常に可視化する必要があります。



ステークホルダーのガバナンス活動への関与を促進する

プロジェクト文書を最新の状態で保ちアクセス可能にするなど、以下を含みます。



ガバナンス会議と段階ゲート・レビューをスケジュールし、円滑に進めます。



ステークホルダーの積極的な参加とフィードバックを奨励します。



必要に応じてガバナンス・チェックポイントを使用し、スコープ、資源、または時系列を再調整します。

レッスン2終了



Learning

