

PMP®

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・
プロフェッショナル(PMP)®試験準備コース

プロジェクト・スコープ、 価値、成功基準の定義

レッスン3

レッスンの概要

このレッスンでは、プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル(PMP)®資格認定の試験内容の概要に記載されている以下のタスクについて説明します。

- プロジェクト・スコープの作成と管理(ECO 2.2)
- 価値ベースのデリバリーの支援(ECO 2.3)
- プロジェクト・コンプライアンスの計画と管理(ECO 3.2)

プロジェクト・スコープ の作成と管理

ECO タスク2.2

プロジェクト・ スコープの定義

ECO 2.2.1

スコープ定義

スコープとは、提供されるプロダクト、サービス、または所産の総体です。しかし、プロジェクト・スコープとプロダクト・スコープには違いがあります。



プロダクト・スコープ

プロダクトやサービスを特徴付ける機能やフィーチャー



プロジェクト・スコープ

プロダクト、サービス、および/または所産の提供を特徴付けるフィーチャー、機能、および作業

プロジェクト・スコープは、立ち上げ合意書または契約作業範囲記述書(SOW)で特定されます。プロダクト・スコープが含まれることもありますが、別個に定義されます。

プロジェクト全体を通して事業価値を調べる

事業価値とは、事業活動から得られる定量化可能な正味のベネフィットのことであり、形態には以下のものがあります。

- 有形
- 無形
- またはその両方



Readyの定義とDoneの定義

アジャイル型のチームは、いつ"準備が完了"して作業にとりかかれるか、そしてその作業がいつ"完了"するのかを知る必要があります。

Readyの定義(DoR)—チームが作業を開始するために何が必要かを明確にすることです。

- 環境の複雑さと過去のイテレーションから得た教訓に依存します。
- DoR チェックリストを使用して、作業や進捗の準備状況についてステークホルダーとコミュニケーションを取り、協力します。

Doneの定義(DoD)は、目的や望ましい状態を説明するものです。DoR に基づく必要があります。

❗ 「DoD は、予測型プロジェクトにおける受入基準と同様のものです」。



Readyの定義(DoR)

ユーザー中心の要求のチェックリストであり、チームが作業を開始するために必要なすべての情報が記載されています。



Doneの定義(DoD)

成果物が顧客の使用に耐えうるものとみなされるために必要な、すべての基準を満たしたチームのチェックリストです。

プロジェクト・スコープ計画：要求事項の収集方法

	インタビュー	アンケート/調査	観察	フォーカス・グループ	ワークショップのファシリテーション
特性	- 成果物のフィーチャーと機能を特定/定義 - 構造化、非構造化、または非同期	- 書面形式 - 大規模なグループから情報を収集 - 定量的データを生成	特定の職務役割、タスク、または機能について学ぶために用いられる物理的技法	- カジュアル/インタラクティブな情報共有 - モデレーターによるガイド付き - ステークホルダーと当該分野専門家を含む - 定性的データを生成	プロジェクトマネージャーが要求事項を決定し、プロジェクトの成果についてステークホルダーの合意を得るために開催するセッション
利点	- 機密情報を扱う - ステークホルダーの要求事項、目的、または期待事項の特定を支援	- 短時間で収集 - 地理的に分散した多様な回答者に対して有効 - 統計分析のための定量化可能なデータを生成	チームは変更が有益となる可能性のある箇所を理解できる	- 多様な意見を求めて参加者を事前に選定 - 少人数グループによる集中的アプローチで特定の情報を収集	- チームが要求事項を把握できる - ステークホルダーが他者の懸念や要求事項を理解できる
考慮事項(潜在的な欠点)	単一の視点しか捉えられない	- 時間がかかる - 回答/データの品質は質問の質に依存		- ステークホルダーの事前適格審査が必要 - 当該分野専門家とファシリテーションが不可欠	ファシリテーションが不可欠

要求事項の作成にベンチマークを使用



比較分析

自組織のプロセス、製品、実務慣行を他のプロジェクトや組織と比較します。




データの収集 と測定

既存システムの重要業績評価指標、メトリックス、または特性を把握します。



目標設定の 基準点

開発プロセス中に製品が満たすか上回らなければならない、具体的な目標やメトリックスを設定します。



標準化と検証


要求事項が業界標準や組織標準に適合しているかどうかを検証します。



アイデアの創 出と改善

製品要求事項改善へのインスピレーションを得ます。

ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャーの作成

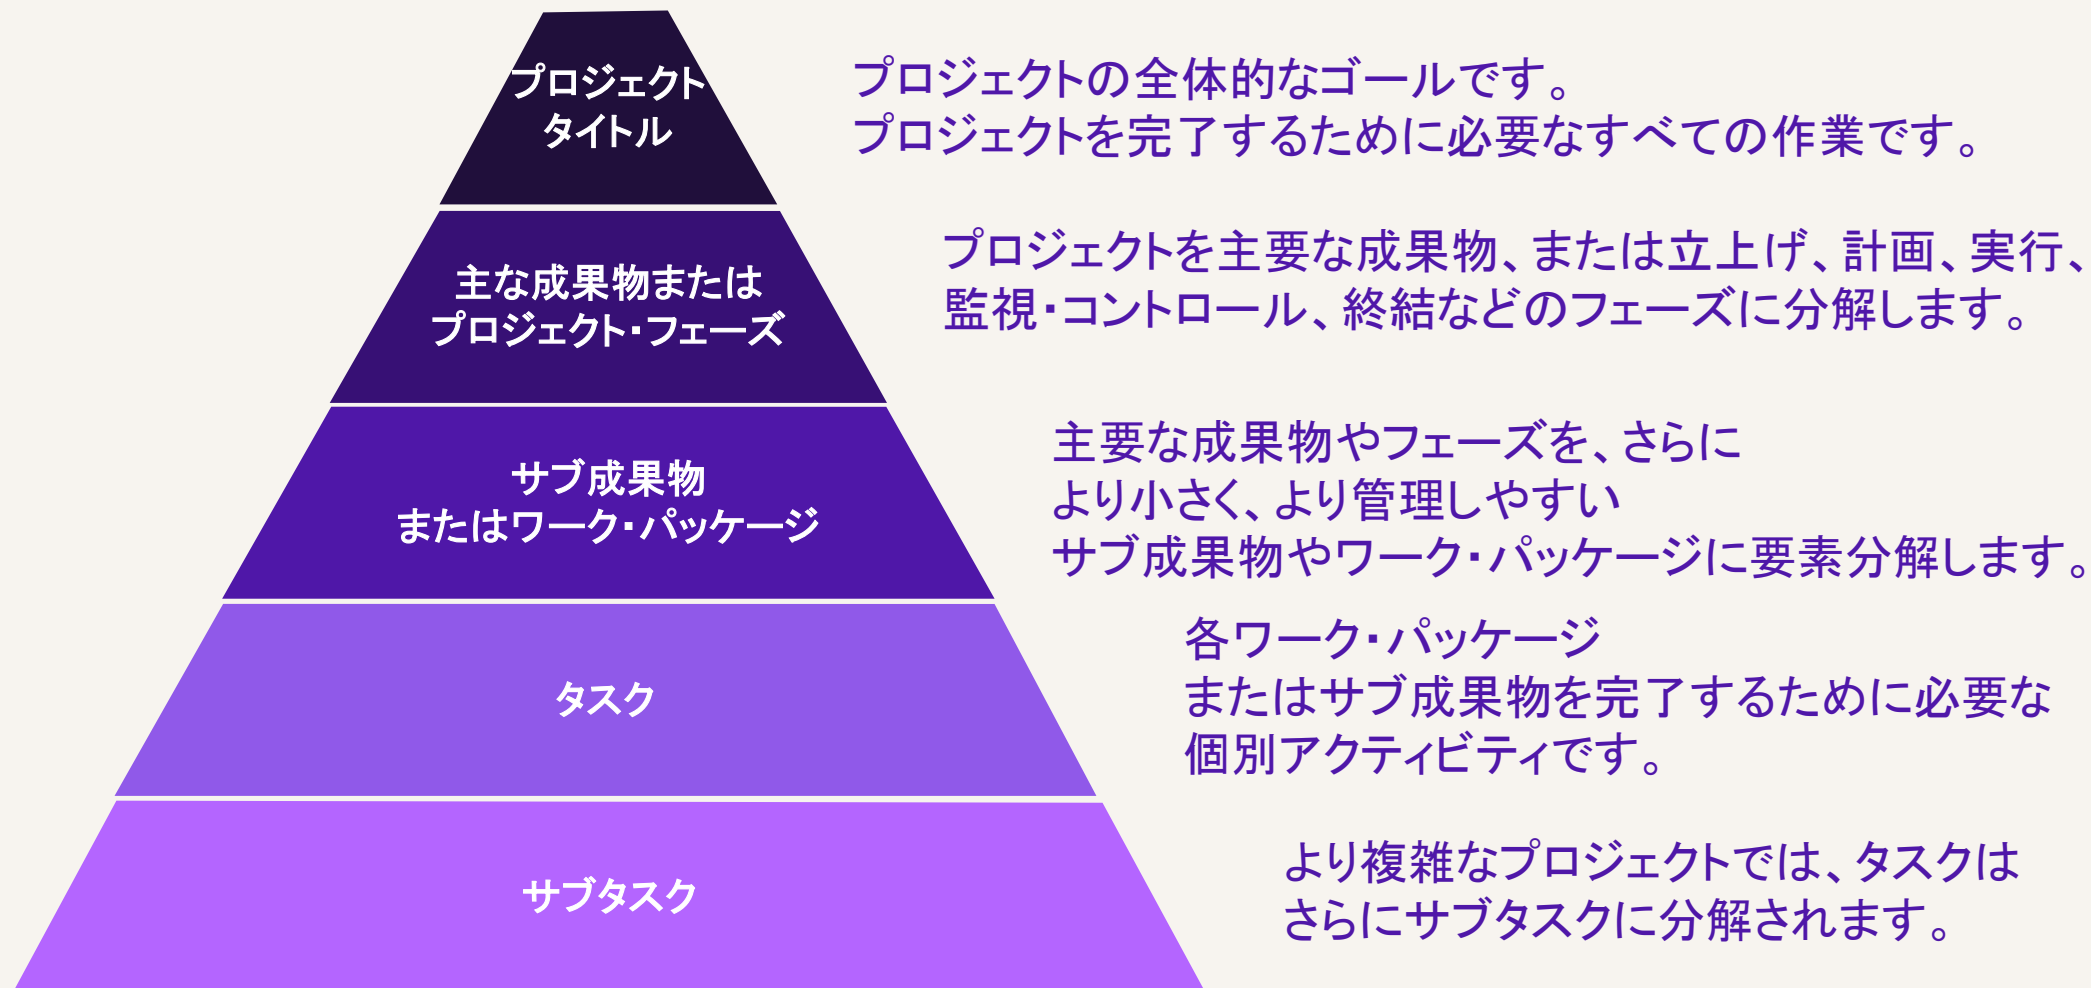

WBS辞書



ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャーの各構成要素に関する詳細な成果物、アクティビティ、およびスケジュール情報を含んでいます。

作業を要素分解し、以下を含めます。

- WBSコード識別子
 - 作業の説明
 - 前提条件と制約条件
 - 担当組織
 - スケジュール・**マイルストーン**
 - 関連スケジュール・アクティビティ
- 作業を完了するために必要なリソース
 - コスト見積り
 - 品質要求事項
 - **受入基準**
 - 技術的な参照
 - 合意情報



マイルストーン

ポートフォリオ、プログラム、またはプロジェクトにおける重要な節目やイベントです。



受入基準

成果物が受入れられる前に満たす必要がある一連の条件です。

複雑なプロジェクトのマネジメント

複雑さに対処するには、プロセスに基づく以下の戦略を検討します。

イテレーション

エンゲージメント

フェイルセーフ




プロジェクト・スコープ に関するステークホル ダーの合意を得る

ECO 2.2.2

固定スコープとフレキシブル・スコープ




固定スコープとは、プロジェクトの
スコープが事前に決められ、プロ
ジェクト・ライフサイクル全体を通じ
て一定であるプロジェクトマネジメ
ントのアプローチを指します。




フレキシブル・スコープとは、プロ
ジェクトのスコ​​ープが適応可能で、
プロジェクト・ライフサイクル全体を
通じて変更可能なプロジェクトマネ
ジメント・アプローチを指します。

ユーザー・ストーリー、ストーリー・マップ、ロードマップ



- ストーリー・マップでは、ユーザー・ストーリーを機能グループとプロダクト・ロードマップのナラティブ・フロー（「全体像」）の中に整理します。
- プロダクトと今後の方向性を特定し、イメージを描き、優先順位をつけるのに役立ちます。
- 「ストーリー・マップ技法はJeff Patton氏によって開発されました。」

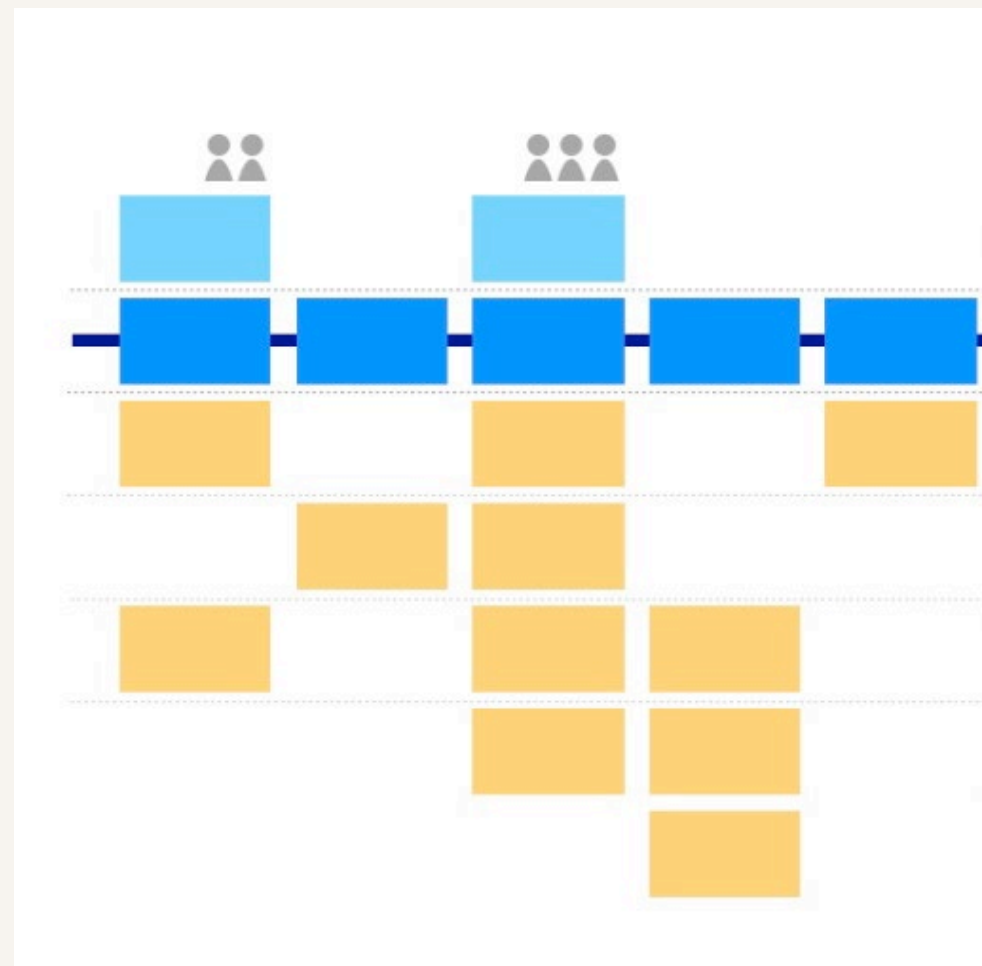

Patton, J.(2008年10月8日).The new user story backlog is a map [ブログ投稿].JPatton Associates. <https://jpattonassociates.com/the-new-backlog/>

プロジェクト・スコープの監視

	スコープの説明	方法
	スコープ・ベースラインとは: - 承認済みのプロジェクト・スコープ記述書 - ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャー(WBS) - 関連WBS辞書	スコープ・ベースラインに対するプロジェクト・スコープの完了を測定します。
	スコープの進化過程: - 最初のプロダクト・ロードマップ、次に - リリース・バックログ、次に - イテレーション・バックログ バックログ(プロダクトのフィーチャーや機能、ユーザー・ストーリーを含む)は、特定され、更新され、再優先順位付けされたプロダクトのニーズを反映します。	ユーザー・ストーリーとDoneの定義(DoD)が顧客のフィードバックとプロダクト要求事項に合致しているか確認します。
	上記の任意の組み合わせ	上記の任意の組み合わせ

プロジェクト・ スコープの分解

ECO 2.2.3



スコープ・マネジメント計画書


- プロジェクトのスコープに関するアクティビティの概要とその作業の実施方法
- プロジェクト・スコープ記述書を作成するためのプロセスを含める必要がある
- 詳細なプロジェクト・スコープ記述書からワーク・ブレイクダウン・ストラクチャーの作成が可能
- スコープ・ベースラインの承認方法と維持方法を確立
- 完成したプロジェクト成果物の公式な受入れをどのように行うかを指定
- 正式でも非公式でも、広範なものでも非常に詳細なものでも可



スコープ・マネジメント計画書

プロジェクトマネジメント計画書またはプログラムマネジメント計画書の構成要素のひとつ。スコープの定義、作成、監視・コントロール、および妥当性確認の方法を記述します。

スコープ計画: プロセスの比較



プロジェクト・マネジャー

- 要求事項の引出しと分析のプロセスを促進
- 要求事項を以下に文書化:
 - スコープ記述
 - ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャー (WBS)
- 要求事項を実現するためのスケジュール、予算、資源、品質の計画を策定



「ハイブリッド・スコープ計画プロセスはどのようなものになるのでしょうか」?



プロダクト・オーナー

- イテレーション計画会議のためにリリース・バックログを作成し改善
- 優先順位付けされた各ユーザー・ストーリーをチームに詳細に説明
- リリース・バックログのユーザー・ストーリーの順序付けと優先順位付けにストーリー・マップを使用

チーム


- 必要な作業工数を見積り、イテレーション・ベースラインを作成し、イテレーションの期待されるベロシティを満たすストーリーを選択
- 特定されたフィーチャーや機能をサポートするために、プロダクト・バックログからリリース・バックログにユーザー・ストーリーを引き出す

データの表現



- マインド・マップ—個々のブレインストーミング・セッションで生み出されたアイデアを1つのマップに統合し、理解における共通点と相違点を反映させ、新しいアイデアを生み出す
- 親和図—大量の情報、アイデア、データを、それらに本来備わる関係性や親和性に基づいて、意味のあるカテゴリやグループに整理






スコープ計画：要求事項の優先順位付け

ツールまたは技法	説明	ベネフィット
MoSCoW手法 <i>Dai Clegg氏が開発</i>	各要求事項の重要性について、ステークホルダーと共通の理解を得るために使用されます。これには以下の意味があります。 • M—Must have (必須) • S—Should have (すべき) • C—Could have (できれば) • W—Will not have (不要)	• 複数の視点を比較 • タイムボックス化と併用し、最も重要な要求事項に集中 • アジャイル・ソフトウェア開発、スクラム、迅速なアプリケーション開発 (RAD)、ダイナミック・システム開発アプローチ (DSDM) で一般的
狩野モデル (プロダクト・マネジメント技法) <i>狩野紀昭氏が開発</i>	顧客の潜在的な要求事項やフィーチャーをすべて把握し、以下の4つのニーズのカテゴリーに分類します。 • デイライター/エキサイター (魅力要因) • サティファイヤー (満足要因) • 不満足要因 • 無関心	• 顧客満足度とロイヤルティに最も影響を与えるものによって、開発作業に優先順位付けが可能
ペア比較分析 <i>LL Thurston氏が開発</i>	一つの案を他の案と比較することで、代替案の評価と順位付けを行います。	• 主観的な要求事項の範囲が小さい場合に適している
100ポイント法 (固定合計法または固定配分法とも呼ばれます) <i>Dean Leffingwell氏とDon Widrig氏が開発</i>	リスト内の要求事項の重要性に投票します。ステークホルダーは、重要だと思う項目に100ポイントを自由に配分します (「モノポリー・マネー」手法のように)。	• 大規模なグループを含む、あらゆるグループ・サイズに適している • ステークホルダーは深い思考を行使する必要があり、その意思決定が優先順位付けされる

スコープ計画: 分析のためのツールと技法



「要求事項分析のツール／技法と正しい説明を組み合わせてください」。

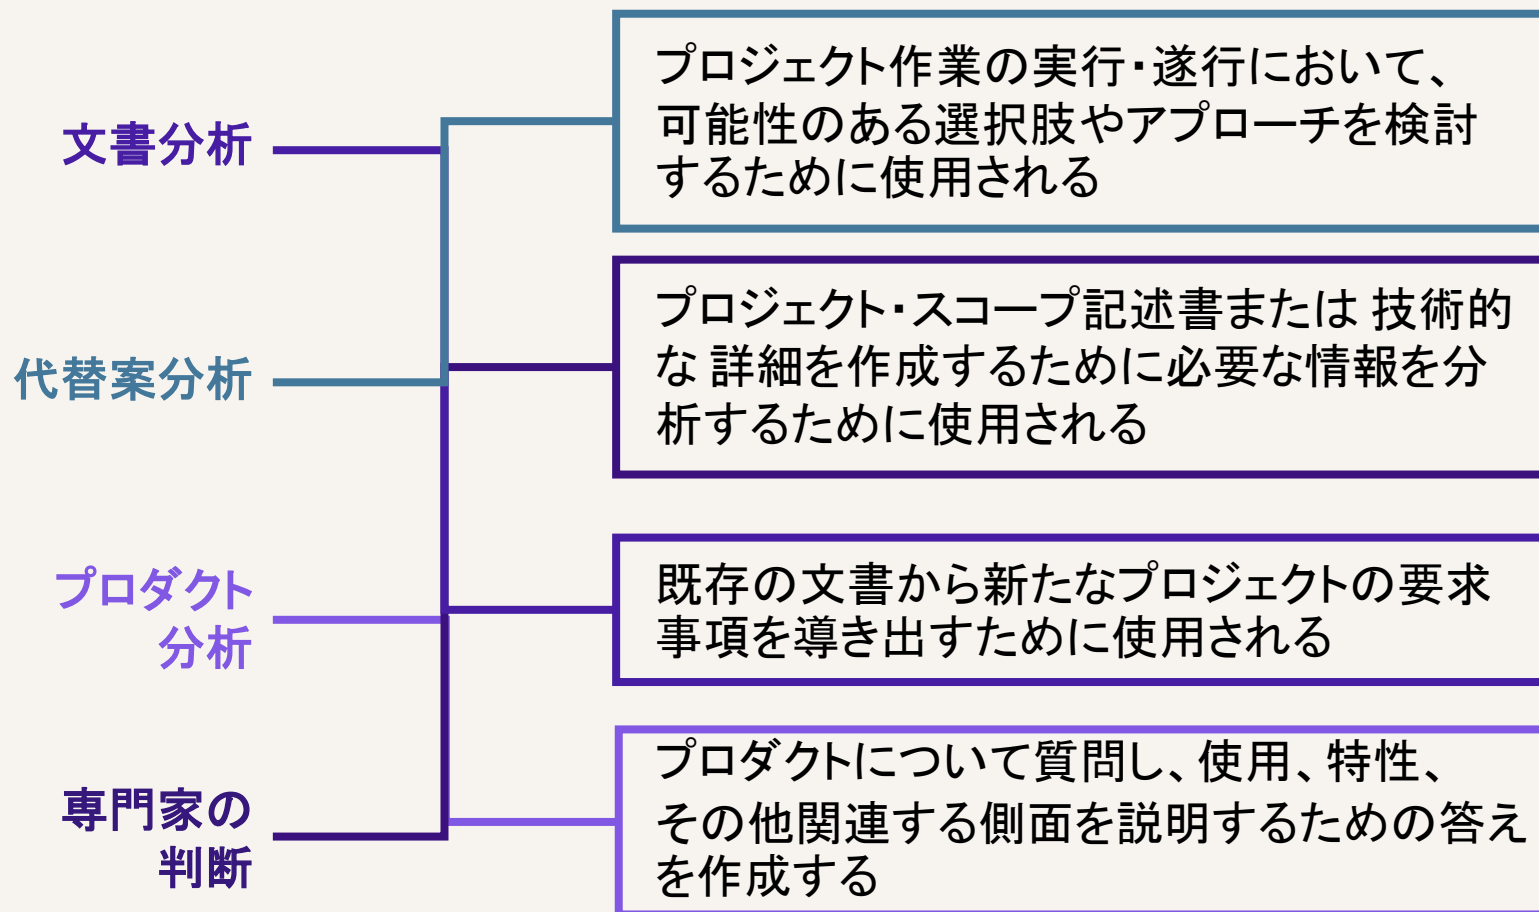

ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャーにおける作業の要素分解



プロジェクト・スコープと成果物を、より小さくマネジメントしやすいパートに分割、細分化

ステップ:

1. 成果物と、それらを達成するために必要な作業/タスクを特定します。
2. ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャーを構造化し、体系化します。
3. 上位レベルのワーク・ブレイクダウン・ストラクチャーのスコープの構成要素を下位レベルの構成要素に分解します。
4. WBSコードから各コンポーネントに固有の識別コードを作成し、割り当てます。
5. ワーク・パッケージの要素分解をレビューし、プロジェクトに対する要求事項に整合していることを検証します。



「プロジェクトのニーズとプロジェクトを効果的に管理するために必要な詳細度に応じて、要素分解のレベルを調整します」。

プロジェクト・スコープ記述書

プロジェクト・スコープ記述書には、以下のものが含まれます。

- スコープの説明—プロジェクトとプロダクト
- 受入基準
- 必要な成果物
- 明確化のために必要なスコープ外の項目
- 制約条件と前提条件




「プロジェクト・スコープ記述書が承認されベースライン化されると、変更は変更マネジメント計画書に従ってのみ許可されます」。

適応型環境におけるスコープ計画



- 漸進型またはイテレーション型の開発
- ユーザー・ストーリーは、要求事項プロセスの代替的な見方を提案

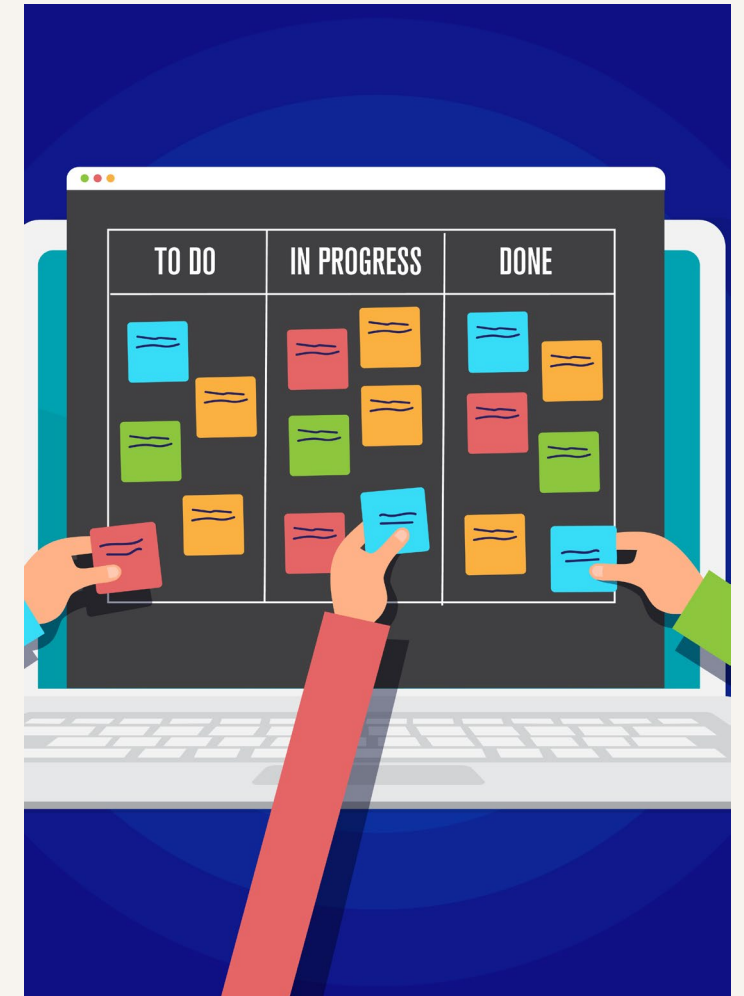

バックログ



- 優先順位付けされた既知の作業範囲のリスト
- 情報はストーリー形式で提示
- チームと協力してプロダクト・オーナーが継続的に更新

例:


プロダクト・オーナーは、プロダクト・バックログを作成し、チームやステークホルダーと協力してストーリーを特定し、追加します。作業項目は、ユーザー・ストーリーを通じて望まれるプロダクトの機能を記述します。

- プロダクト・オーナーは、価値に応じて作業を優先順位付けする責任があります。
- プロダクト・オーナーとチームは、作業項目をイテレーション/スプリント・バックログに移すために協力します。



バックログは、チームやプロジェクトによって少し違った名前と呼ばれるかもしれませんが、一般的にはプロダクト・バックログ、イテレーション・バックログ、リリース・バックログ、スプリント・バックログなど、説明的な名前が付けられます。

エピック > フィーチャー > ユーザー・ストーリー

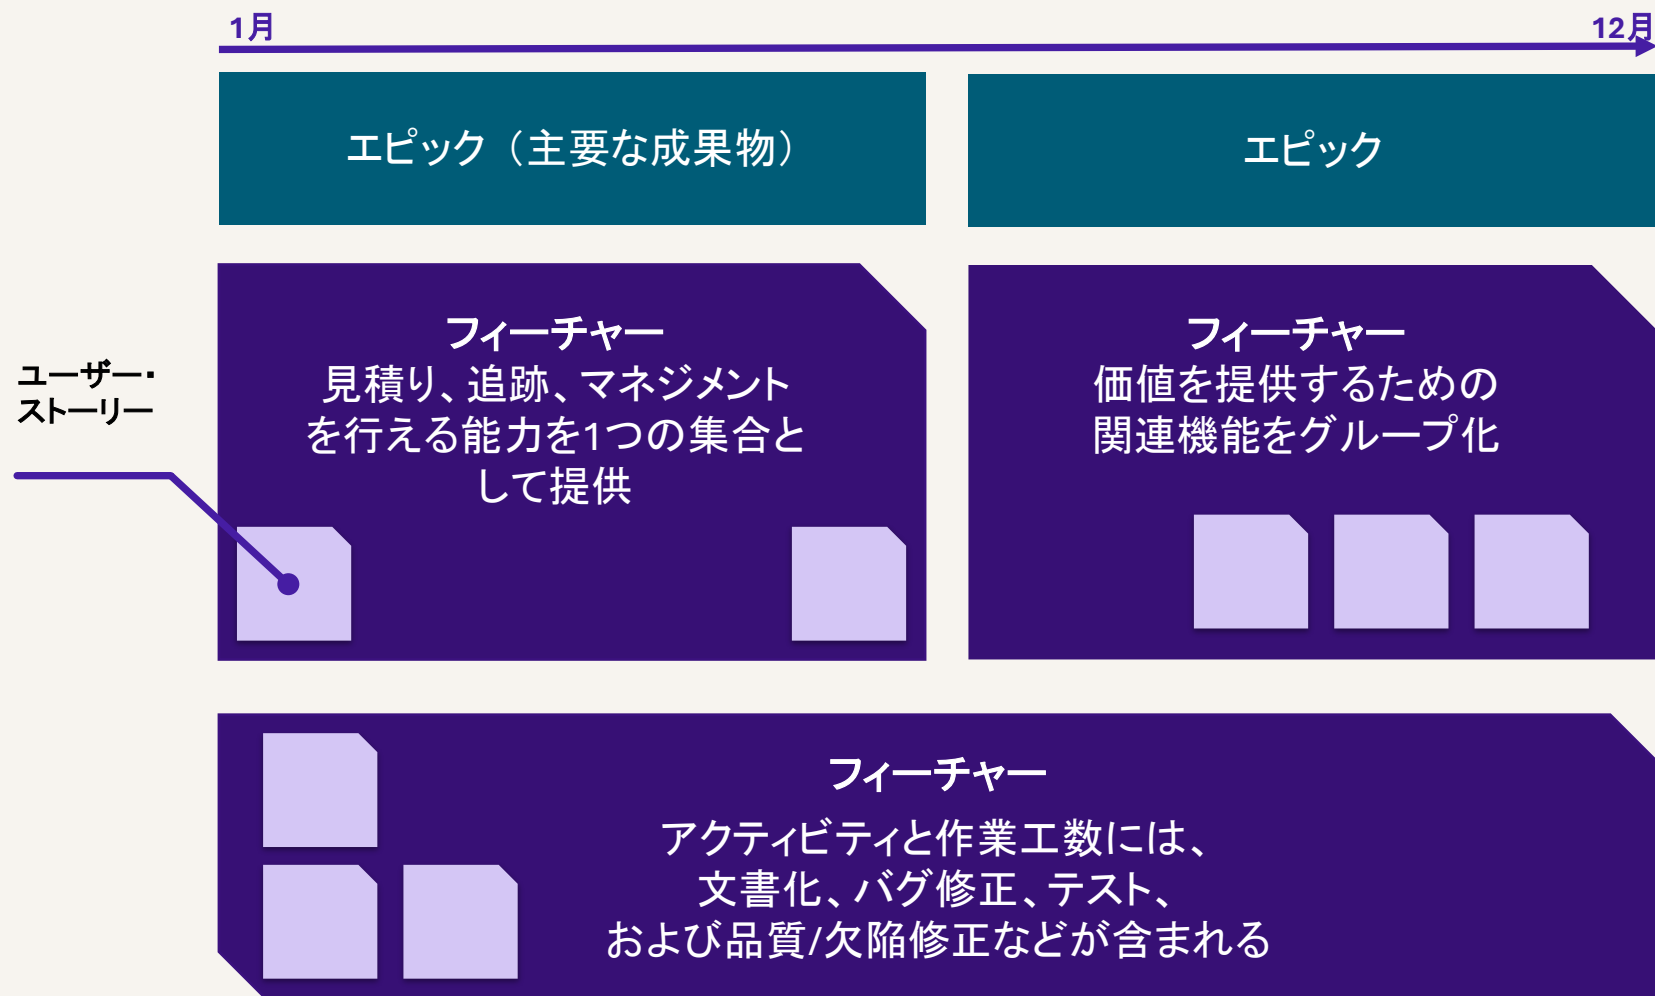

エピックとフィーチャー



エピック

一群の要求事項を階層的に組織化し、特定のビジネス成果を実現することを目的とした、大規模かつ関連性のある一連の作業。



フィーチャー

組織に価値を提供する、関連する要求事項または機能の集合です。

スコープは、顧客が成果物を受入れた時点で妥当性が確認されます

	受入基準
	• Readyの定義 (DoR) • Doneの定義 (DoD) • 受入基準 • イテレーション・レビュー
	上記の任意の組み合わせ

① 予測型開発アプローチにおいて、受入基準の決定に役立つ作成物はどれですか？

- a. 責任トレーサビリティ・マトリックス
- b. **スコープ記述**
- c. チーム憲章
- d. ステークホルダー・エンゲージメント計画書

② 適応型開発アプローチにおいて、ユーザー・ストーリーの受入基準が満たされたと判断するには何が役立ちますか？

- a. プロダクト・ロードマップ
- b. **完了の定義 (DoD)**
- c. リリース計画
- d. カンバン・ボード

価値ベースの デリバリーの確保

ECOタスク2.3

主要ステークホルダー と価値コンポーネント の特定

ECO 2.3.1

価値の概要

- 価値とは、ポートフォリオ、プログラム、またはプロジェクトの目標を達成することで得られる、投資を上回る金銭的および非金銭的ベネフィットの超過分のことです。
- ステークホルダーごとに、価値の捉え方は異なります。
- 価値は、パフォーマンス・メトリックスまたは財務指標を通じて測定できます。
- 価値には、有形のものと無形のものの両方があります。
- 価値は、成果物と混同すべきではありません。



価値の源泉

価値は、次の方法で実現または創造できます。



新しいプロダクト、
サービス、所産を
創造する




プラスの貢献を生
み出す



効率または生産
性を向上させる



必要な変更を可
能にする



ベネフィットを維
持する

価値のコンポーネント



機能



品質



コスト



時間



顧客満足

プロジェクト・マネジャーの役割

価値のコンポーネントを特定するには、次のことをする必要があります。

- ステークホルダーがプロジェクトから何を欲しいと考えているかを理解します。
- ステークホルダーのプロファイルやペルソナを使用して、影響力、コミュニケーションのニーズ、価値の視点を文書化します。
- 価値工学プロセスで価値のコンポーネントを評価します。
- エンゲージメント戦略を策定します。



変更に関する計画

プロジェクトによってもたらされる変更を実施するために必要な知識の移転、トレーニング、準備のアクティビティを定義します。

- 人々の気持ちを知るために、態度調査を含めます。
- 変更慣れを促すために情報提供キャンペーンを作成します。
- 変更の潜在的な影響について、オープンで透明性をもって伝えます。
- 展開計画の作成を検討します。



「展開計画はプロジェクトマネジメント計画書のコンポーネントではありません」。



変更を支援するアクション



DO

- 同僚をコーチングしてビジネスを支援—忍耐と思いやりのあるメンタリングが重要です。
- アジャイルな運用システムを可能にする—チームメンバーに対しアジャイルに関するコーチングを行い、変更重視のマインドセットへの適応を促進します。
- 知識を最新の状態に保つ—プロセスと知識を継続的に改善します。

DON'T

- 強制的な変更—関与を深めて意見を聞きます。変更の理由について納得してもらうことを目指します。
- 抵抗勢力を遠ざける—変更はコンフリクトを生む可能性があるため、慎重に進めます。

価値とステークホルダー のフィードバックに基づく 作業の優先順位付け

ECO 2.3.2

戦略上の整合と価値の実現

- 組織はステークホルダーに価値を創造します。
- 期待される創出価値は、しきい値を満たすか、それを上回らなければなりません。
- プロジェクトは、価値を提供したり、価値の生産を高めたりするために特別に設計されます。
- 価値重視の考え方は、投資収益率(ROI)を最大化することを目的としています。
- 組織のリーダーは、多くの要因に対応してプロジェクトを立ち上げます。



ステークホルダーの影響度の理解



スコープ/
要求事項




スケジュール



コスト



プロジェクト・
チーム



計画




成果




文化



成果価値の
実現



リスク



品質

ステークホルダーからのフィードバックの重要性

- 一貫したフィードバックにより、リスクとその影響を特定できる可能性がもたらされます。
- プロジェクトに対して強い影響力を持ち、好ましくないまたは中立的な見解を持つステークホルダーには、効果的に関与してもらうべきです。
- 価値のマインドセットを持つことで、ステークホルダーと関わり、彼らのニーズや期待を理解することができます。



価値とステークホルダーのフィードバックに基づく作業の優先順位付け

想像してみてください。プロジェクトが半分まで進んだ段階で、最も重要なステークホルダーが、プロジェクトが期待される価値を提供していないとして変更を要求したとします。

明確な優先順位や期待についての確固たる理解がなければ、何かが遅れているのか、あるいは何かを完全に見逃しているのかを認識できません。




バックログの優先順位付けと調整




- イテレーション計画の前にプロダクト・オーナー/顧客によって行われる継続的な調整
- さらなる調整は、スプリント/イテレーションの最中にチームとプロダクト・オーナーが共同で実施可能
- 価値を最初に提供する優先度の高い項目を完了するための、作業の再編成と再優先順位付けが可能
- エピックをユーザー・ストーリーに分割

プログラム、プロジェクト、業務の整合

組織によっては、ポートフォリオ内で複数のプログラム、プロジェクト、業務をマネジメントしています。ポートフォリオによりホリスティックなビューを得られるため、リーダーは次のことを行えるようになります。

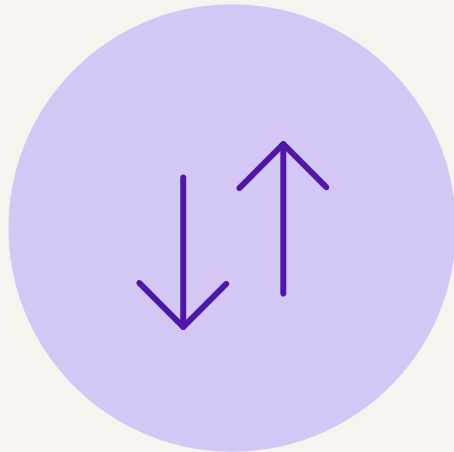

戦略、目標、義務に基づいて、イニシアチブに優先順位を付けて管理します。

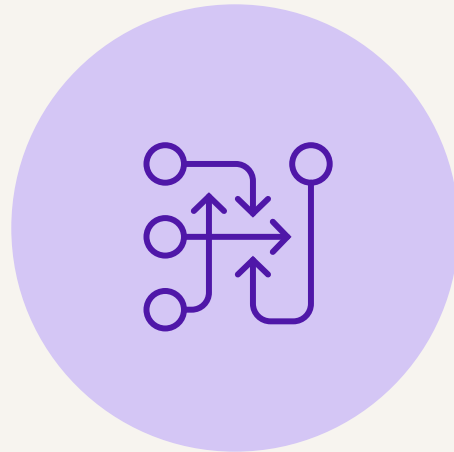

価値を最大化するために、複数の分野を調整します。



プロジェクトと業務を組織のゴールに整合させます。

インクリメンタルな形で価値
を提供する機会を評価する

プロジェクト全体を通して
事業価値を調べる

ECO 2.3.3、2.3.4

価値ベースの増分デリバリーの概要

増分デリバリーは、プロダクトやソリューションをより小さな機能パートや増分で構築しリリースするプロセスです。

考えられる増分的な価値ベースのサービスには、次のようなものがあります。

- コミュニティ食事サービス・プログラム
- 輸送サービス
- グループでの外出やイベント
- 介護者の負担軽減
- 成人向けデイ・ケア



漸進型アプローチを理解する

このアプローチは、以下の点で有益です。


- 一連のイテレーションを通じて成果物が生み出される
- 予測型の特性が適用されるが、部分的な引渡しが要求される場合
- プロジェクトが複数のフェーズや増分に分割されている場合
- ステークホルダーがプロダクトの一部を使用してベネフィットを得られるため、プロジェクトの価値提案を高めることができる場合が多い




漸進型アプローチと反復型アプローチ

Iterative
Try different
ideas to
clarify scope,
approach, and
requirements

Customer:
I need a
method to
capture ideas
that might
change.

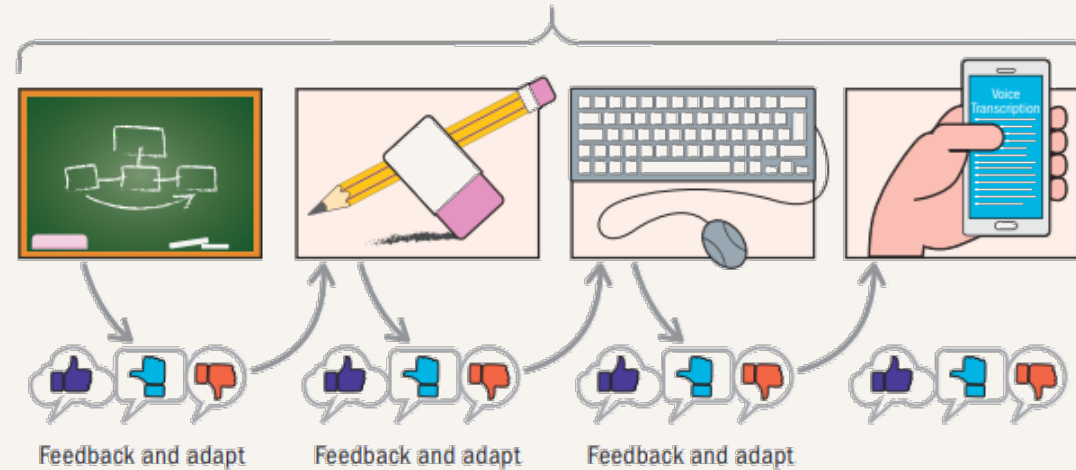

Incremental
Progressively
develop features
and functions

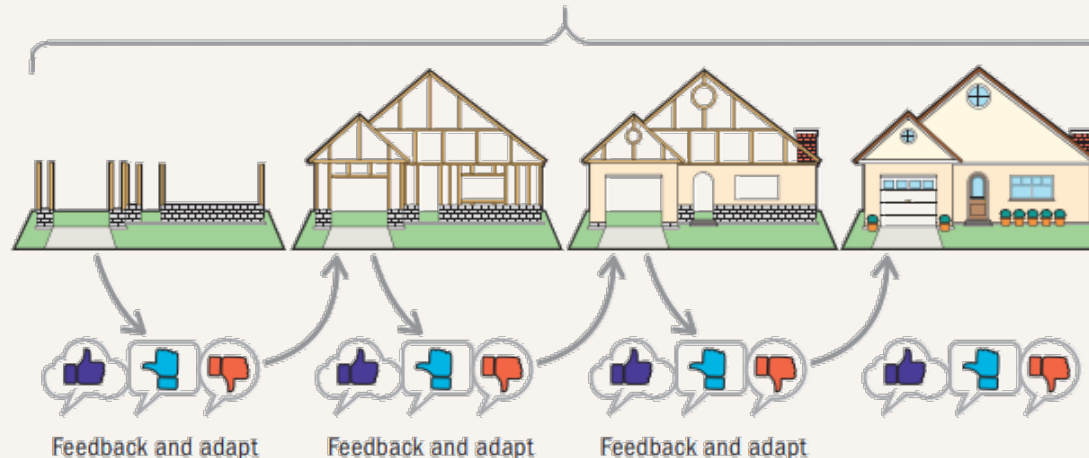

継続的引渡しを理解する

継続的引渡しとは、以下のような実務慣行です。

- 顧客へのフィーチャーの即時引渡し
- 本番環境への継続的な価値提供
- テスト済みで妥当性確認済みのプロダクト増分。
常に本番稼働の準備が整っている

継続的なフローを維持することで、チームは以下のことができます。

- リスクを最小限に抑え、頻繁かつ効率的に展開
- 顧客からのフィードバックと進化する市場傾向に対する応答性の促進



継続的フローの維持

プロジェクト・マネジャーは、望まれる成果を記述し、プロジェクト・ライフサイクル全体を通じて、次の方法を用いてそれらを反復的に評価し、更新する必要があります。

- 品質ゲート
- フィードバック・ループ
- 定期的なレビュー

プロジェクト・チームは、変化に適応し、以下に対する進捗を継続的に評価する必要があります。

- 求められるアウトプット
- ベースライン
- ビジネス・ケース



プロジェクト・マネジャーの役割

- プロジェクトで期待される価値を分析します。
- プロジェクトに適した開発アプローチを特定します。
- 次に引渡しする増分または要素の方向性を設定します。
- プロジェクトの複雑さを評価し、戦略を立てます。



ベネフィットを追跡する 測定システムが整って いることを確認する

ECO 2.3.5



ビジネスに基づくベネフィット測定方法

費用便益率

初期コストに対する投資の期待現在価値の尺度

$$\text{費用便益率} = \text{推定コスト} \div \text{推定ベネフィット}$$

比率 > 1 = 実行可能

機会費用

- 数あるプロジェクトの中から特定のプロジェクトを選ぶことで、何を諦める必要があるかを理解するのに役立つ
- 代替案が確実に検討対象に含まれる



「試験では、いずれの計算も必要ありません」。



財務に基づくベネフィット測定方法

正味現在価値 (NPV)

- プロジェクト・ライフサイクルにわたるすべての予想キャッシュ・インフローとアウトフローの現在価値を計算
- 正味現在価値が0より大きければ受容

投資収益率 (ROI)

- 投資額に対する利益または損失を測定
- 投資対効果が0より大きければ受容

内部収益率 (IRR)

- プロジェクトの正味現在価値が0になる割引率
- 期待収益率を示す
- 内部収益率が資本コストより大きければ受容



「試験ではこれらを計算する必要はありません」。

ベネフィット測定方法




費用便益分析

財務分析方法のひとつです。プロジェクトのコストに対して、プロジェクトから得られるベネフィットを測定するために用います。



ビジネス
ベース



財務
ベース

現在価値と正味現在価値の使用

現在価値は、貨幣の価値が変化する可能性があるインフレ時などに、複数の期間にわたるプロジェクトに適
用されます。

- 現在価値を決定する要因には、以下のものがあります。
- 将来価値
 - 金利
 - 期間数

正味現在価値：
 - 資本予算化のために使用
 - インフレやマクロ経済の変化を考慮(割引率)
 - 今日の通貨単位の価値を将来の同じ通貨単位の価値と比較

年	0	1	2	3	4
正味キャッシュ・フロー	-1200	+400	+800	+600	+1200
要因	1	.91	.83	.75	.68
正味現在価値	-1200	+364	+664	+450	+816

目標と主要な所産が事業価値の実現にどのように役立つか

- 組織目標から始めます。
- 望ましい主な所産を決定します。
- 目標と主要な所産でさらに調整します。
 - 目標とは目的であり意図です。
 - 主要な所産は、目的と意図に沿った、時間的制約のある測定可能なマイルストーンです。

目標と主要な所産に関するベストプラクティス：

- それぞれの目標を、3つから5つの測定可能な主要所産でサポートします。
- 競争力のある目的設定を促すために、70%の成功率を目指します。成功率が100%の場合、十分に挑戦的でないため、再評価してください。
- 行動指向でインスピレーションを与えるOKRを作成し、具体的で測定可能な成果を含めます。

価値を提示するための デリバリー・オプションの評価

ECO 2.3.6

価値の定義

価値は、財務的なものだけでなく、さまざまな方法で定義することができます。

一般的な財務メトリックス

投資収益率(ROI)と正味現在価値(NPV)

代替の価値指標

規制コンプライアンス、社会的影響、タイムリーな納入、顧客満足、イノベーション

パイロット・プロジェクト

価値は即座にではなく、後になって実現される

支出の増加


価値がタイミングや戦略的成果に結び付いている場合には受容可能

事業価値を検証することの重要性

継続的な価値の監視：

- 価値の整合性を確保するのに役立つ
- 早期の軌道修正が可能になる
- より賢明な意思決定を支援

事業価値を継続的に検証することで、プロジェクト・アクティビティと連動して、作業によって確実に影響力がもたらされるようになります。

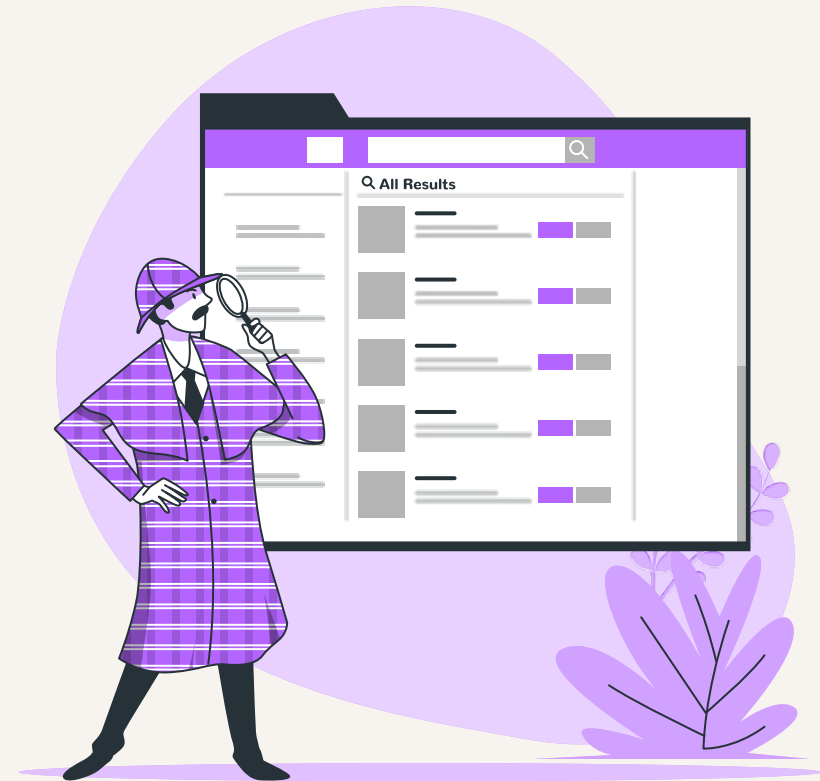

フェーズを通じた事業価値

立上げ

価値を定義します。

計画

プロジェクトの目的、スコープ、タイムラインを設定し、期待されるビジネス成果をサポートします。

実行

価値提供の測定に重点を置きます。

終結

価値提供を評価します。

事業価値の尺度

費用便益率

計画されたベネフィット提供と実際のベネフィット提供との比較

投資収益率(ROI)

正味現在価値(NPV)



価値を提示するためのデリバリー・オプションの評価

価値実現システム内:



ポートフォリオ、プログラム、プロジェクトは成果物を生み出します。



成果物は成果につながります。



成果はベネフィットを生み出します。



ベネフィットは価値を生み出します。

予測型アプローチ: 価値の実現




スコープ、要求事項、リスクが早期に明確に定義されます。



ベネフィットはプロジェクトの終了時にのみ提供されます。

適応型アプローチ: 価値の実現

適応型アプローチは、プロジェクト全体を通じて、より小さく、より速いサイクルで価値を提供します。



ベネフィットを段階的に提供します。



フィードバックを得て、より早くプロダクトをリリースできます。




継続的な学習を可能にします。



スキルを向上させ、失敗のリスクを低減します。



価値のタイムラインを短縮したり、早期に投資収益を回収したりできます。




早期のリターンやフィードバックにより、価値が最適化されます。

デリバリー・ケイデンスの選択肢を理解する

プロジェクトでは、成果物と開発アプローチに基づいて、さまざまなデリバリー・ケイデンスを使用します。ケイデンスにはそれぞれ独自の価値ベネフィットがあります。

- 成果物のタイミングと頻度を指す
- 以下を含む：
 - 単一のデリバリー
 - 複数回のデリバリー
 - 定期的または継続的なデリバリー
- 価値実現の方法とタイミングに影響を与える

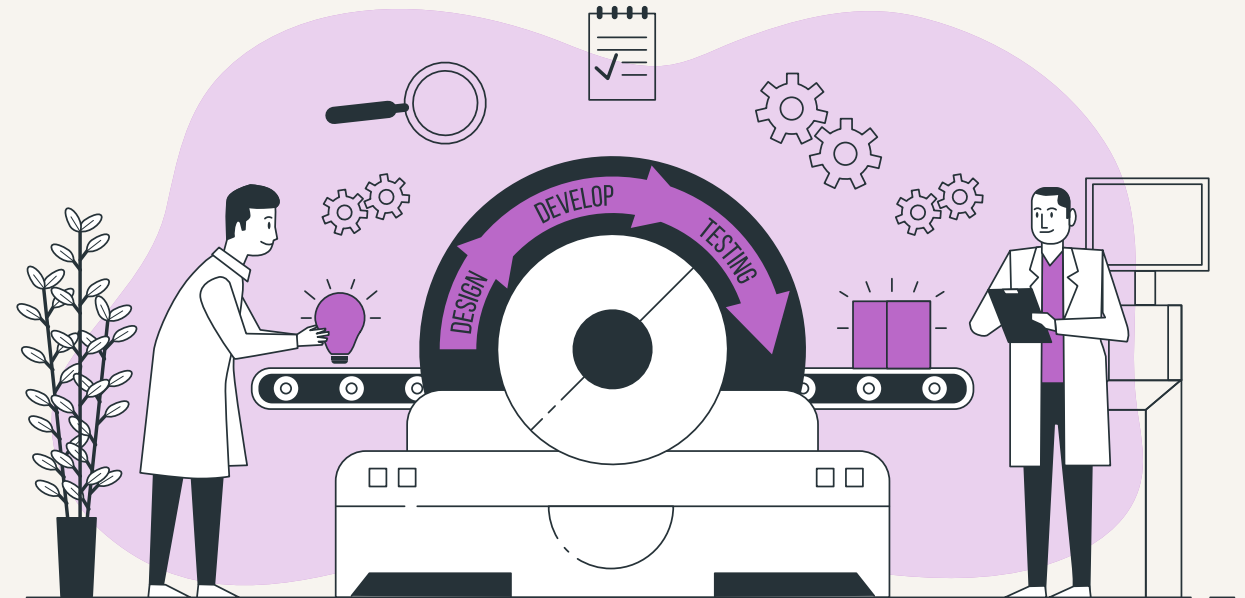

投資対効果を向上させる

プロジェクトのコストに対する財務的リターン量の尺度です。

- プロジェクトの立上げに関する意思決定を支援
- プロジェクト・ライフサイクル中の主要ポイントで更新
- 継続的な追跡を通じて進行中の投資判断を導く

予測型アプローチとアジャイル・アプローチでは、投資収益率(ROI)は、デリバリー・オプションが財務的リターンに及ぼす影響がより早いROIを通じて示されるため、価値主導の意思決定を支援します。



正味現在価値の測定

正味現在価値 (NPV) = ベネフィットの現在価値 - コストの現在価値


- 今日の条件における、将来のベネフィット価値を反映
- 現在と将来のコスト、予測されるベネフィット、インフレを考慮
- プロジェクトを開始する価値があるか、継続する価値があるかを判断するのに役立つ



正味現在価値の向上

プロジェクト・タイムラインの構成方法は、価値提供の方法とタイミングに直接影響を与えます。

- より短いタイムラインで、より早く価値を提供
- タイムラインの短縮によりインフレの影響を軽減
- デリバリーの加速化により正味現在価値 (NPV) が向上
- 投資回収期間の短縮によりスポンサーの支援を獲得
- 価値を最大化するデリバリー・オプションを選択
- 目標と主要な所産 (OKR) を使用して、価値主導の目標を設定および測定

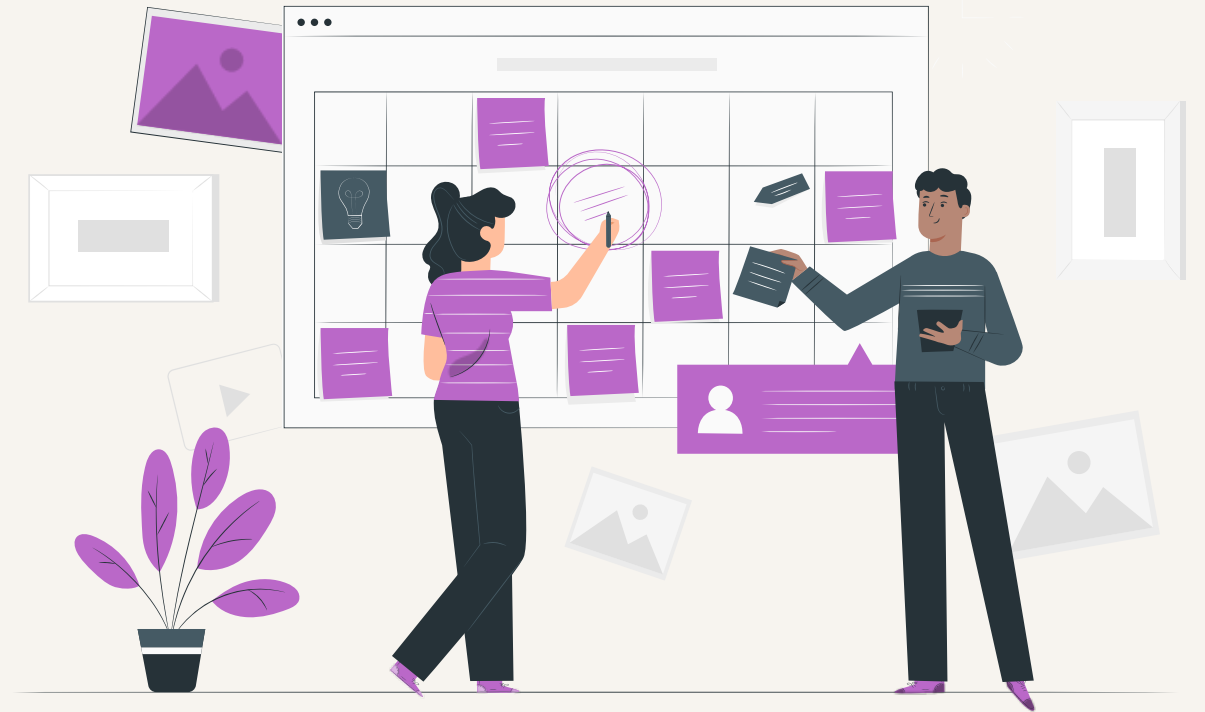

目標と主要な所産を理解する

目標と主要な所産（OKR）は、測定可能な目標を定義し、成果を追跡するための、目標設定およびパフォーマンス測定フレームワークです。

目標

- 明確で具体的かつ行動指向であり、理想的には意欲的な内容
- 明確さと方向性を提供

主要な所産

- 時間的制約がある、具体的で測定可能な成果
- 現実的でありながらも挑戦的で、目標達成に向けて進捗を明確に追跡可能

目標と主要な所産で価値提供を推進する

各OKRは、目標から始まり、その目標に向けた進捗を測定する3～5の主要な所産が続きます。

目標

顧客満足を向上させる

主要な所産1

第2四半期末までにNet Promoter Score® (NPS)を50から70に引き上げる

主要な所産2

サポートの応答時間を24時間から12時間に短縮する


主要な所産3

第2四半期末までに、サポート後の調査で90%の満足度を達成する

価値提供の最適化

ベネフィット測定方法を用いて、価値の提供を加速できるかどうかを評価することができます。

- 基本的なプロダクトを早期に提供します（最小実行可能プロダクト(MVP)）。
- より早く市場に参入し、フィードバックを収集して収益を生み出します。
- 予測型アプローチを使用します（4月と6月の成果物）。
- 反復型アプローチを使用します（早期の収益により、回収は7月中旬にシフトします）。

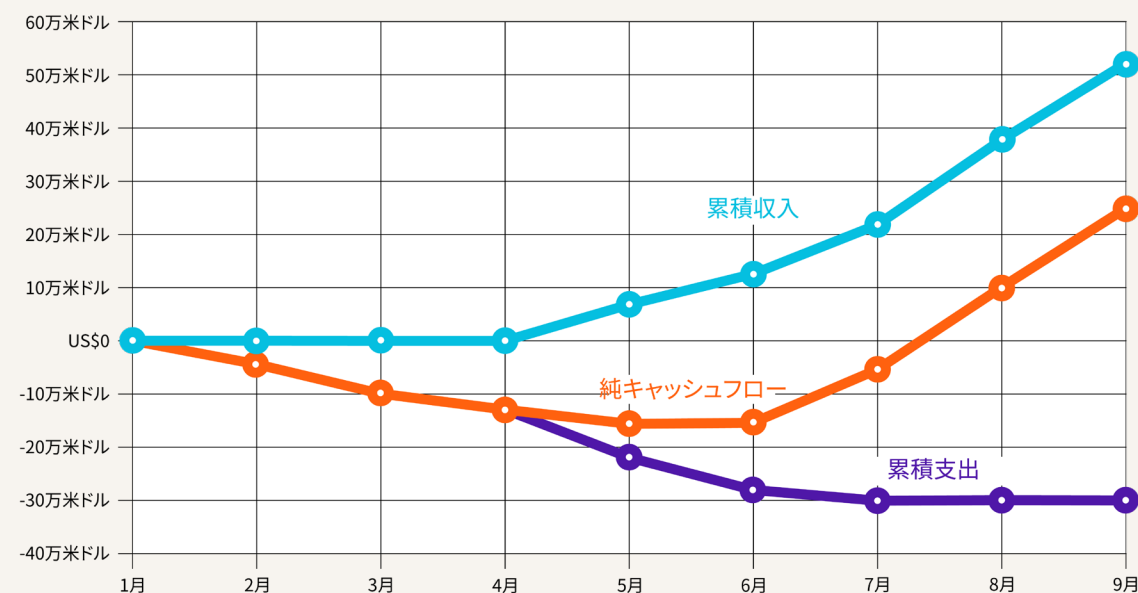

プロジェクト・ コンプライアンスの 計画と管理

ECOタスク3.2

プロジェクト・コンプライアンスの 要求事項の確認

コンプライアンスのカテゴリーの分類

コンプライアンスに対する潜在的な 脅威の特定

ECO 3.2.1、3.2.2、3.2.3

コンプライアンス

内部および外部の標準には、以下が含まれます。

- 政府規制
- 企業方針
- プロダクトとプロジェクトの品質
- プロジェクト・リスク

プロジェクトマネジメント・オフィス(PMO)は、組織レベルでのコンプライアンスを監視します。

プロジェクト・チームは、以下を含む、プロジェクト・アクティビティ関連のコンプライアンスにも責任を負います。

- プロセスと成果物/プロダクトの品質
- ベンダーによる調達と作業

コンプライアンス要求事項

法的または規制上の制約には、以下が含まれます。

- 特定の実務慣行の要求事項
- 標準
- プライバシー法
- 機密情報の取り扱い

品質: プロジェクトに合わせて調整—どの程度のプロセスの厳密さと品質コントロールが適切か？



コンプライアンスのカテゴリー分類

- 環境リスク
- 職場の健康と安全
- 倫理的/非腐敗的な実務慣行
- 社会的責任
- 品質
- プロセス・リスク

カテゴリーは以下に基づいて異なります。

- 業界とソリューションのスコープ
- 独自の法的および規制上のエクスポージャー

コンプライアンス上の脅威の調査

- 組織内でコンプライアンスを担当するのは誰ですか？
- 組織に影響を与える法的または規制上の要求事項は何ですか？例えば、職場の安全、データ保護、専門職能団体への加入などです。
- 組織の品質方針はどのようなものですか？
- チームとステークホルダーは、コンプライアンスの問題を認識していますか？

品質方針

組織が品質マネジメントに組織のシステムを組み入れる際に、組織行動のガバナンスを実行する基本原則となります。

コンプライアンスを サポートする方法の活用

ECO 3.2.4

コンプライアンスをプロジェクトの目標として扱う

- コンプライアンス要求事項に関するリスクを積極的に追跡し、管理します。
- 品質監査を実施する準備をします。
- 成果物に対する法的および規制上のコンプライアンスを継続的に検証します。
- プロジェクト終了前にコンプライアンスを確認し、課題の移行を回避します。
- リスク登録簿または専用のコンプライアンス登録簿には、以下を含めます。
 - 特定されたリスク
 - 責任を負うリスク・オーナー
 - 顕在化したリスクの影響
 - リスク対応



「大規模な組織や規制の厳しい業界では、通常、コンプライアンスの部署を設置していたり、役員を任命していたりします」。

一般に認められているコンプライアンス実務慣行

- **文書**:コンプライアンスのニーズとリスクの更新
- **リスク計画**:リスク計画においてコンプライアンスを優先
- **コンプライアンス評議会**:品質/監査の専門家や関連する法務/技術の専門家で構成
- **コンプライアンス監査**:正式なプロセス
- **コンプライアンス・スチュワードシップ**:受講者各自の責任です。

Rincon, I. D.(2010年10月12日).My project should be compliant:What do I do now? PMI®グローバル・コンGRES2010年—北米(ワシントンDC)にて発表された論文。プロジェクトマネジメント協会. <https://www.pmi.org/learning/library/achieve-compliance-accommodate-constraints-project-6537>

プロジェクトはコンプライアンス要求事項に適合していますか？



プロジェクトは組織の品質方針に沿っていますか？



コンプライアンス要求事項について、プロジェクトマネジメント・オフィスと定期的に協働していますか？



プロジェクト・チームは、プロジェクトのコンプライアンス要求事項を認識していますか？チームはどのようにマネジメントしていますか？

プロジェクトのコンプライアンス健全性の評価

プロジェクト実務者は、プロジェクトマネジメント・ツールとプロセスを使用して、次のようにコンプライアンスをサポートし、潜在的な問題を特定できます。




最初のコンプライアンス監査




リスク計画と脅威の特定



品質の計画とマネジメント




受入基準とユーザー・ストーリーの実現




ユーザー・ストーリー・マッピングからコンプライアンス目標へ

報告およびガバナンス・プロセスの支援

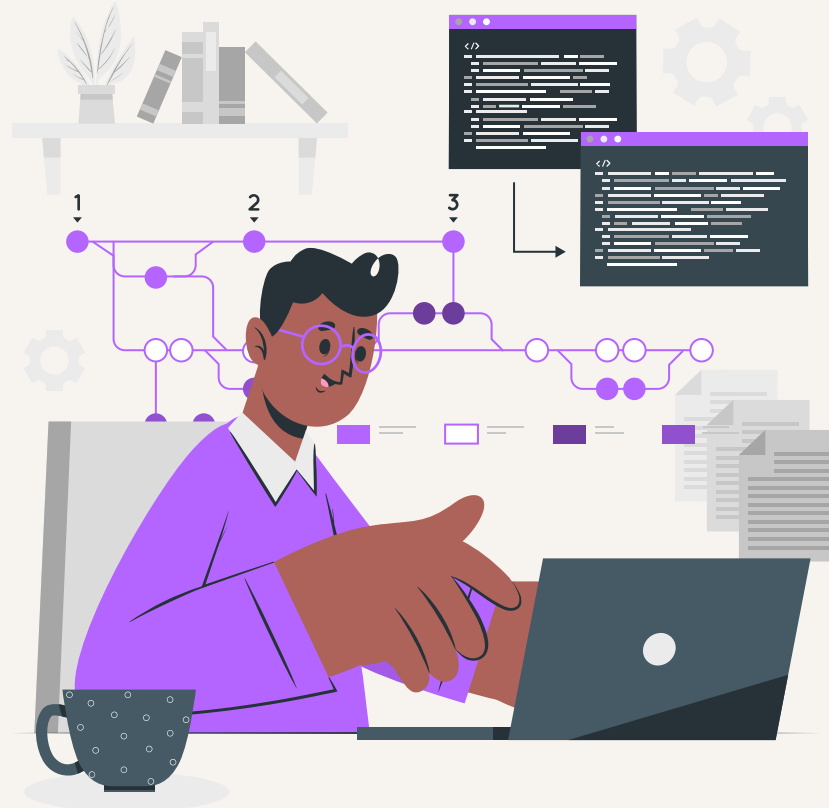

プロジェクト・ガバナンス・フレームワークとの整合性



組織のガバナンス
構造を理解します。



必要なガバナンス
機関が適切な情報
を受け取ることを
支援します。



段階ゲートまたは
フェーズ・レビュー
のプロセスに従い
ます。

意思決定とエスカレーションの促進



ステークホルダーの意思決定を支援するため、タイムリーで正確なデータを提供します。



合意されたプロトコルに従って、課題、リスク、または変更をエスカレーションします。



決定事項を文書化し、アクション・アイテムを追跡します。

コンプライアンスと可監査性のサポート

プロジェクトをできるだけ簡単にレビューできるようにします。

- 内部の方針、標準、および監査要求事項に従います。
- 重要な決定事項と文書のトレーサビリティを確保するのに役立ちます。
- 監査やプロジェクト後のレビューの準備として、記録を完全かつ整理された状態で保管します。



透明性のある積極的なコミュニケーション

プロジェクトをできるだけ簡単にレビューできるようにします。

- 信頼できる一貫性のある最新情報を共有します。
- 積極的にリスク、差異、リカバリー計画を伝えます。
- ダッシュボード、スコアカード、視覚化などのツールを使用して、パフォーマンスの傾向を強調します。

プロジェクトのパフォーマンスは、常に可視化する必要があります。



ステークホルダーのガバナンス活動への関与を促進する

プロジェクト文書を最新の状態で保ちアクセス可能にするなど、以下を含みます。



ガバナンス会議と段階ゲート・レビューをスケジュールし、円滑に進めます。



ステークホルダーの積極的な参加とフィードバックを奨励します。



必要に応じてガバナンス・チェックポイントを使用し、スコープ、資源、または時系列を再調整します。

コンプライアンス違反の因果関係の分析

コンプライアンス・ニーズに対応するために 必要なアプローチとアクションの特定

ECO 3.2.5、3.2.6

継続的なコンプライアンス・チェック

プロジェクト・マネジャーは、プロジェクトで法律上、規制上、契約上の義務を遵守できるようガイドラインに従ってください。

継続的なコンプライアンス・チェック

法律上、規制上、契約上のコンプライアンスを検証するために、プロジェクトのさまざまな段階でコンプライアンス・チェックを行ってください。

コンプライアンスのための早期計画

プロジェクト計画策定時に、プロジェクトマネジャーは次のことを行ってください。

- コンプライアンス要求事項を特定します。
- コンプライアンス違反のリスクと代償を分析します。
- それらに対処するための戦略を立てます。

実行中の監視

プロジェクトの進行に伴い、以下を行います。

- マイルストーンで品質チェックを実施します。
- 内部監査を実施します。
- コンプライアンス関連のアクティビティを追跡し、管理します。
- 成果物の妥当性確認を行い、コンプライアンスの不一致を検出します。

コンプライアンス違反のコスト

法律上、規制上、契約上の義務に違反すると、プロジェクトやビジネスにコストが生じる可能性があります。



成果物の手直し



金銭的ペナルティー
または収益の損失



プロジェクト・スケ
ジュールの乱れ



法的措置



世間からの否定的
な注目



信頼の喪失

コンプライアンスの管理が最優先

成果物のテストと妥当性確認を行います（継続的に、そしてプロジェクトまたはフェーズの終了時に）。

承認権限を持つステークホルダーを特定します。

以下を回避するために、コンプライアンスの問題を是正します。

- タイムラインへの悪影響
- コスト超過
- リスクの増大

以下はコンプライアンスの承認を得ることのメリットです。

- コンプライアンスに対する潜在的な脅威の早期警告
- 差異を把握し、アクションを起こす能力


プロジェクト・ コンプライアンスの 度合いの測定

ECO 3.2.7

プロジェクトのコンプライアンスの測定

プロジェクトのコンプライアンスを測定する方法は以下のとおりです。

- ステークホルダー（スポンサー、プロジェクトマネジメント・オフィスなど）を関与させてニーズとメトリックを定義
- コンプライアンスに関する主要な連絡先（法務チーム、コンプライアンス・チームなど）を特定
- プロジェクト・ガバナンスへの準拠を監視
- コンプライアンス要求事項をチームと目に見える形で共有
- ミーティングやレトロスペクティブ（振り返り）でコンプライアンスについて議論
- 必要に応じて監査やテストを実施

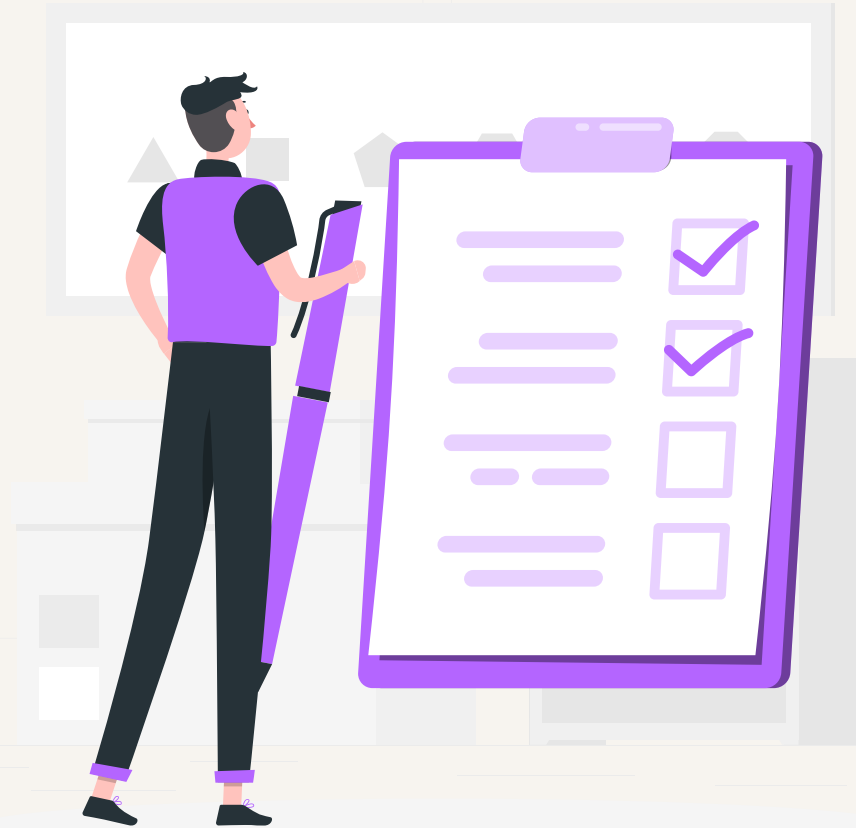


プロジェクトのコンプライアンスを測定するためのアプローチ

これらのアプローチを使用して、コンプライアンスを監視します。



予測型

- 全体的な進捗
- プロジェクト・アクティビティ
- 成果物のステータス
- リスク報告書



適応型

- リリース・ロードマップ
- カンバン・ボード
- 累積フロー図
- リスク・バーンダウン・チャート



その他

- テストと妥当性確認のアクティビティ
- 監査と検査
- 承認と妥当性確認

インタラクティブ・アクティビティ



「コンプライアンスについて話しましょう」。

- 貴社には品質方針がありますか？
- プロジェクトの品質方針や標準をどこで確認できるか知っていますか？
- どのようなコンプライアンス活動に関わっていますか？



レッスン3終了



Learning

