

PMP®

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・
プロフェッショナル(PMP)®試験準備コース

プロジェクトの円滑な終結

レッスン 10

レッスンの紹介


このレッスンでは、プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル(PMI-PMP)®資格認定の試験内容の概要に記載されている以下のタスクについて説明します。

- 終結作業の管理(ECO 2.10)



終結作業の管理

ECO タスク 2.10

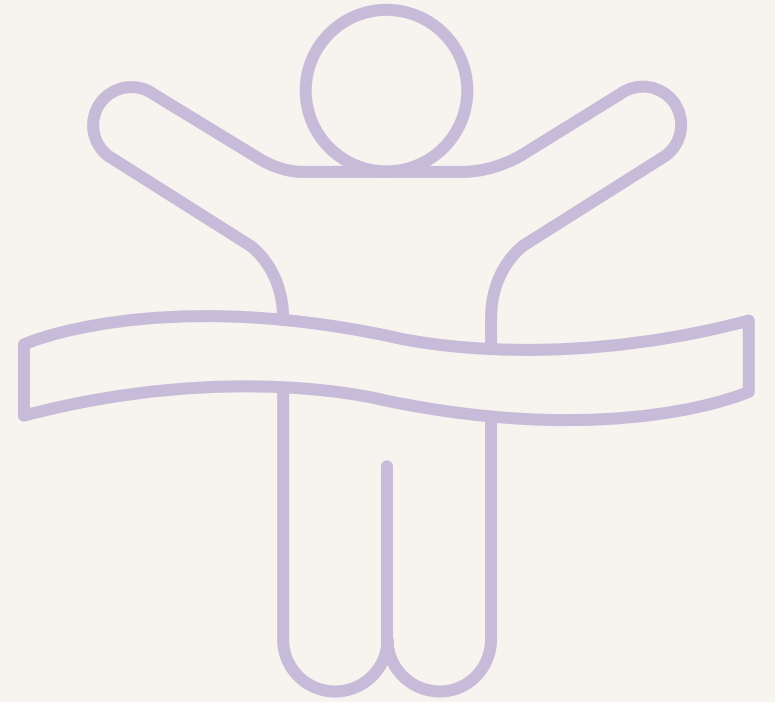

プロジェクトやフェーズを 円滑に終結させるため の判定基準の決定

ECO 2.10.2

プロジェクトやフェーズが終結する理由：成果の達成(1/2)

ステークホルダーは、プロジェクトマネジメント計画書に記載されているように、プロジェクトの開始時に定義された**受入基準**に基づいて成果物を承認します。



受入基準はプロジェクト・ライフサイクル中に変更されることがあります。

要求事項トレーサビリティ・マトリックスを使用して、すべての要求事項が確実に完了し、承認されるようにします。



受入基準

成果物が受け入れられる前に満たしておく必要がある一連の条件。

プロジェクトやフェーズが終結する理由：成果の達成(2/2)



イテレーションの終了時に、チームとステークホルダーは、相互に合意した**Doneの定義(DoD)**に基づいて、プロダクトやサービスを評価します。

最終的な受け入れは、プロダクトのリリース前に行われます。



受入基準とDoneの定義(DoD)は、プロダクトに対するステークホルダーの満足度がどの段階にあるかを示す点で、同じ状態を表しています。チームによっては、これらの用語を同義として使用する場合があります。



Doneの定義(DoD)

成果物が顧客の使用に耐えうるものとみなされるために必要な、すべての基準を満たしたチームのチェックリスト。

早期または強制的な終結

- 要求事項やニーズが変更された場合
- プロジェクトまたは成果物の実現可能性が失われた場合
 - 内部要因: 組織がビジネス・ケースを変更した場合
 - 外部要因: 法的または規制上の変更により、プロジェクトの進行が禁止された場合
- プロジェクトまたは成果物が、もはや望ましいものではなくなった場合
 - 阻害要因が発生した場合
 - 要求事項を満たすための財政的支援を確保できない場合
 - 重大な影響を伴うリスクにより、成功裏の完了が不可能となった場合



「プロジェクトやフェーズの強制的な終結の例を共有できる人はいますか？」

プロジェクトまたはフェーズの終結活動

- 顧客による成果物またはプロダクトの受け入れを含みます。
- 成果物またはプロダクトの顧客への引き渡しも含みます。
- 企業全体および社内の関連部門に通知し、組織のプロセス資産(OPA)を更新します。
- **最終報告書**を作成します。
- 法的、規制上、契約上の事項を含む外部義務を完了します(例: 責任の移転、財務システム上のすべてのアカウントの閉鎖)。
- プロジェクト情報を保管します。
- 資源(人材、財務、物的資産)を解放します。



最終報告書

プロジェクトのパフォーマンス、スコープ、スケジュール、品質、コスト、リスクに関する情報の要約。




これらの活動は、「プロジェクトまたはフェーズの終結」プロセスの一部であり、通常はプロジェクトマネジメント計画書およびワーク・ブレイクダウン・ストラクチャー(WBS)の中で、プロジェクトマネジメント機能として定義されています。


移管に向けた 準備状況の確認

ECO 2.10.3


引き渡し



成果物は顧客またはオーナーに引き渡されます。成果物の移管または引き渡しに関する仕様は、プロジェクトマネジメント計画書に記載されています。



組織に価値をもたらすように調整されたソリューションであり、多くの場合、段階的に提供されます。



各イテレーションのアウトプットはすべてプロダクト・オーナーに引き渡されます。



- 「組織によっては、展開計画や移管計画を使用します。」



- 「これはプロジェクトマネジメント計画書の構成要素ではありません。」

移管と引き渡しの準備状況

顧客が変化を受け入れ、成功に向けて前進できるよう支援します。

準備状況によっては、利用定着を促進し、抵抗を克服するための追加的な変更マネジメント活動が必要となる場合があります。

 「特に、既存のプロダクトやサービスをアップグレードする場合には、これらの対応が非常に重要です。」

関係者全体の準備状況を評価します。



エンドユーザー



組織



プロジェクト・チーム



サポート要員

移管および引き渡しの活動

成果物またはプロダクトを効果的に移管し、引き渡すことで、エンドユーザーの認知が高まり、利用定着が促進されます。その結果、ベネフィットの実現につながる可能性が高まります。

移管活動には、次のようなものが含まれます。

- 新しいプロダクトやサービスに関するトレーニング
- プロダクト/成果物の文書化
- プロジェクト・チームと組織間の効果的なコミュニケーション
- 導入後のサポート(例:「ハイパーケア」)



「予測型プロジェクトでは、移管要求はどこに記録されますか？」

早期および長期的なベネフィットの実現

ベネフィットの中には、すぐに実現するものもあれば、数か月から数年を要するものもあります。

ベネフィットが実現するタイミングは、次の要因によって異なります。

- 採用しているプロジェクト・ライフサイクル
- プロジェクト作業の性質
- 意図された成果



「価値が非常に早い段階で提供されるプロジェクトの種類を、特定できますか？」

「移管後、数か月、あるいは数年を経てから価値が提供されるプロジェクトを、特定できますか？」

ベネフィットの移管と維持：責任



ベネフィット・マネジメント計画書

プログラムやプロジェクトから得られるベネフィットを創出し、最大化し、維持するためのプロセスを定義した記述書。

- 引き渡しまたは移管
- ベネフィット・マネジメント計画書のレビュー



DEVOPS


開発スタッフと運用スタッフ間の協働を改善することによって、円滑なデリバリー・フローを作るための実務慣行の集合。



提供済みのベネフィットに対する改善や修正は、新たなプロジェクトとして扱われます。



提供済みのベネフィットに対する改善や修正は、次回以降のイテレーションに向けた作業として提案され、バックログに追加されるか、または再優先順位付けされます。



組織およびチームは、ベネフィットの実現と定着を目的として、状況に応じてソリューションを調整します（例：導入後サポート。
DevOpsとも呼ばれる）。

ベネフィットの移管と維持

プロジェクト・チーム	顧客 	プロダクト・オーナーまたはプロジェクト・マネジャー 
顧客組織にベネフィットを提供する	- 改善および提供済みベネフィットの継続的な創出を支援する - 顧客からの追加のインプットを取り込む	顧客と協力して、望ましい改善のために必要な作業を特定する
計画されたパフォーマンスデータを提供する	重要業績評価指標 (KPI) を含め、計画されたパフォーマンスと実際のパフォーマンスを比較する	チームとともに選定したメトリックスを使用してパフォーマンスを測定する
ビジネス・オーナーと協力し、ベネフィット実現のためのメトリックス (測定頻度や監視責任を含む) を提案する	ニーズに応じて調整された適切な間隔で、ベネフィット実現メトリックスを導入する	チームと協力して適切なメトリックスを決定する
ベネフィットの達成を妨げる可能性のある、残存リスクがないかを判断する	- ベネフィットの継続的な実現を確保するために必要なリスク、プロセス、ツールを特定する - 提供済みベネフィットに影響を与えるリスクを監視する	阻害要因ログ上のリスクを監視し、対応についてチームと協働する
プロダクトやサービスを使用するために必要な技術情報を提供する	技術情報 (FAQ など) を更新する	チームと協力して技術情報を更新する

ベネフィット・マネジメント計画書



プログラムやプロジェクトから得られるベネフィットを創出し、最大化し、維持するためのプロセスを定義した記述書。

- プロジェクトの承認に向けた重要なインプットとなります
- 要求されたベネフィットを検討し、有形・無形の事業価値の両方がプロジェクトから実現されるかを判断します
- 短期および長期のベネフィット実現までの期間を決定します
- ベネフィットの達成に責任を持つベネフィット・オーナーを特定します。これには、以下が含まれます。
 - 使用するメトリックスまたは尺度
 - 結果を測定する個人またはグループ



ビジネス文書

プロジェクト開始前に作成される成果物で、ビジネス・ケースの一部として使用されます。また、ベネフィットが提供されているを確認するために、プロジェクトプロフェッショナルによって定期的にレビューされます。



「ベネフィット・マネジメント計画書では、残存しているプロジェクト・リスクの中に、ベネフィットの達成を妨げる可能性があるものがないかを判断します。」



「主要ステークホルダーが望ましいプロジェクト・ベネフィットを特定する際には、そのベネフィットをどのように測定すべきかを提案してもらいます。」

ベネフィット・オーナー

- プロジェクト期間中、プロジェクト・マネジャーまたはチームリードと協働し、計画されたベネフィットが提供される過程で適切に管理されるよう支援します
- 要求されたベネフィットを、受け入れ側組織に移管することを支援します
- 測定のメトリックスと方法が確立され、継続的に監視されるよう支援します
- 提供されたベネフィットの実現結果(価値)について、マネジメントに報告します




ベネフィット・オーナーは、ビジネスアナリスト、スポンサー、または定常業務マネジャーが担う場合があります。



プロダクト・オーナーは、プロジェクト作業が組織にとってのベネフィットにつながるよう支援する責任を負います。

ベネフィット実現の検証




選択したメトリックスを使用して、プロダクト・オーナーは各有形ベネフィットの進捗状況を報告します。

無形ベネフィットについては、主観的(定性的)な判断のほうが有用な場合もあります。

報告内容には、次の事項を含める必要があります。

- 有形ベネフィットについて: 目標に向けた進捗状況
- 計画どおりに実現できない可能性があるベネフィット
- 戦略目標に対するマイナスの影響
- プロジェクト・チームによるサポート終了の可能性



「予測型プロジェクトでは、移管が完了した後、ベネフィットが実現されていることを検証する責任は誰にありますか？」

プロジェクト完了に関する プロジェクト・ステークホルダーの 承認の取得

ECO 2.10.1


ステークホルダー承認の取得



承認基準を早期に定義する



要求事項に照らして、完了状況をレビューする




受け入れレビューを実施し、促進する



未解決の課題を解消する



正式な承認を取得する



終結を関係者へ周知する

プロジェクトまたは フェーズ終結のための 最終活動


ECO 2.10.4

検証と解決

すべての成果物が完成し、最新の状態で、プロジェクトの目標を達成していることを確認します。

契約と運用に関連する未解決の課題、リスク、クレームをすべて解消します。

サインオフを通じて、成果物に対する顧客またはステークホルダーの正式な受け入れを取得します。

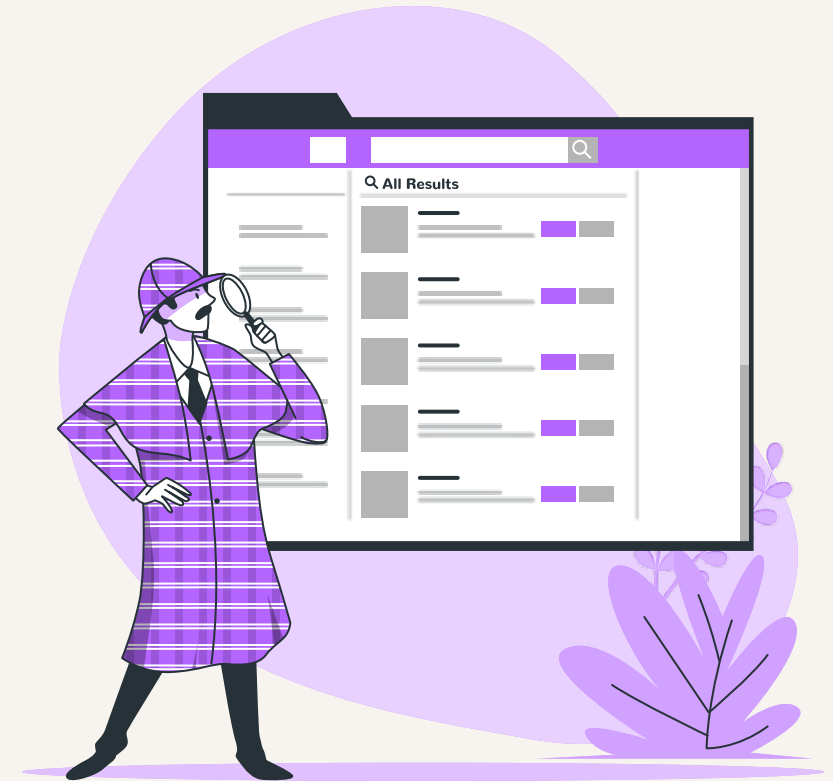

事務終了



すべてのコストがプロジェクトに計上されていることを確認し、財務上の勘定をクローズします。

最終報告書やパフォーマンス・アセスメントを含む、プロジェクト文書の更新を完了します。

組織で活用できるよう、プロジェクトの記録と教訓をアーカイブします。

資源と資産の再配置

プロジェクト要員を、新たな役割または別のプロジェクトに再配置します。

余剰となった資材、施設、設備、その他の資源を処分または再配分します。



知識の共有



教訓セッションを実施し、将来のプロジェクトに活用できるよう、得られた知見を文書化します。

プロジェクトを通じて得られた知識や洞察を、組織に円滑に引き継ぎます。

移管の準備状況

プロジェクトのアウトプットを、定常業務チームやステークホルダーに移管することを支援します。

定着、ベネフィットの実現、定常業務継続性に向けた準備が整っているかを検証します。

フィードバックと長期的なソリューション評価を、終結活動の一部として取り入れます。



レッスン10終了



Learning

